

प्रगति विवरणिका 2018-19



जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

आपकी बेहतर सेवा के लिए, आपके सहयोग की अपेक्षा में

अनुक्रमणिका

क्र.सं. विवरण	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	03
2. नवीन पहल	05
3. शहरी क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ	06
4. राज्य में भूजल दोहन का परिदृश्य	09
5. वार्षिक योजना 2018—19	10
6. जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन	12
7. पेयजल परिवहन	16
8. हैण्डपम्प मरम्मत अभियान	17
9. आर. ओ. प्लान्ट	18
10. प्रतिबद्ध राज्य निधि एवं संधारण व्यय तथा राजस्व	20
11. ड्रिलिंग रिगों का प्रबन्धन	21
12. वृहद् पेयजल परियोजनाएं	22
13. प्रयोगशालाएं	42
14. सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम एवं डी फ्लोरीडेशन संयंत्र	44
15. परिशिष्ट	45

1

प्राक्कथन

जहाँ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के गौरव से सम्मानित है, वहीं विषम भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप सीमित एवं न्यूनतम जल स्रोत विरासत में प्राप्त हैं। राज्य का क्षेत्रफल देश का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। 2013 के सर्वे के अनुसार राज्य के 248 ब्लॉक में से 164 ब्लॉक अत्यधिक दोहित, 9 विषम व 28 अर्द्ध विषम ब्लॉक हैं। देश के 227 मरुक्षेत्र ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक राज्य में है।

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	3,42,239
2011 की जनगणना के अनुसार	
कुल आबादी	6,85,48,437
शहरी आबादी	1,70,48,085
ग्रामीण आबादी	5,15,00,352
गत दशक में जनसंख्या वृद्धि दर	21.30%
पशुओं व मानव आबादी का अनुपात	1.2 : 1
जिलों की संख्या	33
पंचायत समितियों की संख्या	295
तहसीलों की संख्या	244
ग्राम पंचायतों की संख्या	9,894
ग्रामों की संख्या	43,289
ढाणियों की संख्या	78237
शहरों/कस्बों की संख्या	222

प्रदेश की विपरीत परिस्थितियाँ, लगातार वर्षों से पड़ रहे अकाल, जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विकास से बढ़ती हुई जलापूर्ति की मांग, वर्षा की मात्रा व दिनों में कमी एवं कृषि हेतु अत्यधिक भूजल दोहन जल समस्या के मुख्य कारण हैं। प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत पेयजल योजनाओं का जलस्रोत भूजल ही है। अतः

इस प्राकृतिक सम्पदा को योजनाबद्ध व मितव्ययी तरीके से उपयोग में लेते हुए, समस्या के स्थायी निराकरण का निर्णय, राज्य सरकार ने लिया है। स्थायी निराकरण और समाधान का कार्य कोई कम मुश्किल नहीं है और राज्य सरकार ने इस बारे में गहन चिन्तन किया है। समस्या के निराकरण के कई सम्बन्धित पहलू हैं जिनमें यहां यह विचारणीय है कि योजनाबद्ध व आवश्यकता तथा प्राथमिकता अनुरूप भू-गर्भीय जल का सीमित उपयोग ही हो और सतही स्रोतों पर आधारित योजनाओं के साथ-साथ वर्षा जल के उपयोग की योजनायें बनायी जायें। राज्य में सतही स्रोत भी अधिक नहीं हैं। अतः इन स्रोतों का दोहन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इन स्रोतों का भी वही हाल न हो जाए जो भू-गर्भीय जल का हुआ है।

राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि वर्षा जल से भूजल के पुनर्भरण व संग्रहण को प्राथमिकता दी जाये और सतही स्रोतों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाये ताकि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सम्भव हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वसनीय पेयजल वितरण हेतु भूजल, वर्षा जल संग्रहण एवं सतही स्रोतों को साथ-साथ उपयोग में लिया जायेगा।

प्रदेश के समस्त 222 कस्बों एवं 1,21,526 ग्रामों/ढाणियों (हेबीटेशन) में से 43,039 ग्रामों एवं 68,672 ढाणियों को दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। अनेक स्थानों पर उपलब्ध भूजल में अत्यधिक घुलनशील लवणों (क्लोराइड, फ्लोराइड व नाइट्रेट आदि) के होने से गुणवत्ता पेयजल के मानक मूल्यों से कम है। इसके अतिरिक्त भूजल की गुणवत्ता में बदलाव, भूजल की आमद में कमी, गिरते जल स्तर, शहरों का तीव्र विकास एवं बढ़ती हुई जनसंख्या से

पेयजल की मांग में वृद्धि के कारण प्रभावी योजनाओं से पेयजल सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है।

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही अत्यंत आवश्यक है कि पेयजल की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास हैं कि समय-समय पर स्रोत व उपभोक्ता के स्तर पर पेयजल की जांच की जाए व कमी पाये जाने पर उसका तुरंत निराकरण हो।


1.1 शहरी पेयजल परियोजनाएं

राज्य के सभी 222 शहरों/कस्बों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। इनमें से लगभग 28 प्रतिशत शहरों को सतही जल स्रोतों से एवं 50 प्रतिशत शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष लगभग 22 प्रतिशत शहरों की पेयजल योजनाएं सतही एवं भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सभी बड़े एवं संभाग मुख्यालय शहरों— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर को विभिन्न सतही जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

1.2 ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं

राज्य में कुल 31628 ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालित हैं इनमें से पाईप योजनाओं की संख्या 2745, पम्प एवं टैंक योजनाओं की संख्या 5924 क्षेत्रीय योजनाओं की संख्या 2828, टीएसएस योजनाओं की संख्या 1644 व डिग्गी व अन्य योजनाओं की 909 है। इसके साथ 17578 हेण्ड पम्प योजनाएं भी क्रियाशील है।

राज्य के बड़े हिस्से में भूजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। भूजल में फ्लोराइड व खारेपन की समस्या प्रमुख है। इन्हें दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे फ्लोराइड की अशुद्धि दूर करने के लिए एक्टिवेटेड एल्युमिना व खारेपन को दूर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया (आर. ओ.)। अनेक ग्रामों व ढाणियों को सतही स्रोतों पर आधारित वृहद् परियोजनाओं द्वारा भी लाभान्वित किया जा रहा है। योजनाओं का जिलावार विवरण परिशिष्ट 23 पर उपलब्ध है।

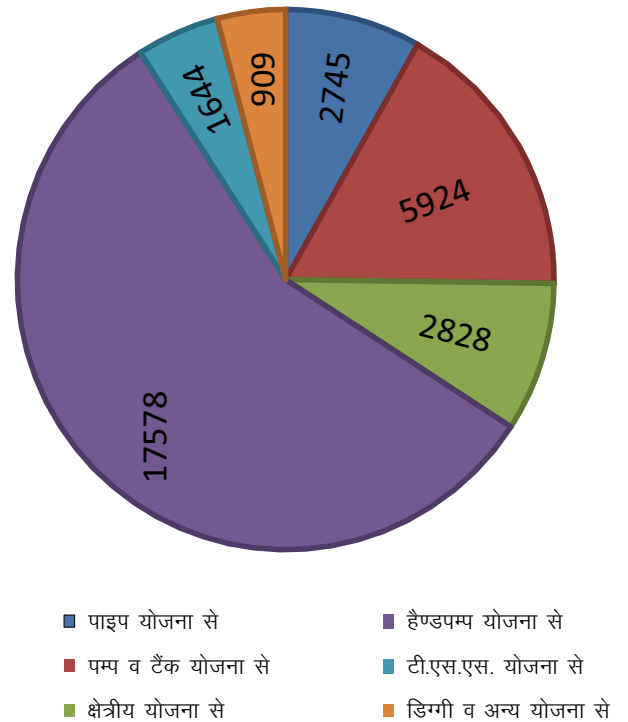

बीसलपुर दूधू बस्सी परियोजना



2

नवीन पहल जलधारा कमांड सेंटर

पेयजल वितरण तंत्र की प्रभावी देख रेख के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का एक अभिनव प्रयोग है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा बनाए जा रहे इस कमांड सेंटर की लागत 38.43 करोड़ है। “जल भवन” मुख्यालय पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित जलधारा कमांड सेंटर में, स्काडा योजना से लाभान्वित सभी पेयजल योजनाओं को एक स्थान पर जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संधारित आर ओ प्लांट्स, डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स, सोलर

आधारित पंप्स को कमांड सेंटर से जोड़ा जा चुका है। कमांड सेंटर में इन सभी की चालू या बंद होने की जानकारी मय कारण के मिल रही है। यही नहीं जलधारा कमांड सेंटर में स्काडा से जुड़ी सभी वृहद परियोजनाओं को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। माह दिसम्बर 2018 तक ऐसी 2 वृहद परियोजनाओं को कमांड सेंटर से जोड़ा जा चुका है जिनकी समस्त जानकारी एक ही जगह से मॉनिटर की जा रही है।



शहरी क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं

अमृत मिशन

भारत सरकार द्वारा शहरों में बुनियादी सेवाएं (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेंज, शहरी परिवहन इत्यादि) मुहैया कराने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की स्थापना की गई है। देश भर में 500 शहरों हेतु वित्त वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिये अमृत के लिये कुल परियोजना 50,000 करोड़ रुपये हैं और मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में संचालित किया जा रहा है। देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ हेतु चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जलापूर्ति को प्रथम प्राथमिकता पर रखा गया है।

मिशन के अन्तर्गत राज्य में 29 शहरों (स्मार्ट सिटीज़ सहित) क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर, हनुमानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर, चुरू, झुंझुनू, बांरा, चित्तोड़गढ़, नागौर, हिण्डौन, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़ एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) अपनी सम्पूर्ण हैसियत में इस मिशन के कार्यक्रम का संचालन करने हेतु अधिकृत है। राज्य के 29 शहरों हेतु विभिन्न सेवाओं के लिये धनराशि निर्धारित की गई है। कुल राशि ₹ 3223.94 करोड़ (excluding A&OE and Reform Incentive) में से ₹ 1007.36 करोड़ पेयजल हेतु निर्धारित की गई है। 29 शहरों में से 5 शहर क्रमशः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, टोंक एवं झुंझुनू हेतु पेयजल से संबंधित कार्य RUIDP Phase-III के अन्तर्गत कराए जाने प्रस्तावित है एवं एकशहर किशनगढ़ हेतु राज्य योजना मद से कार्य क्रियान्वित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अमृत योजना के

अन्तर्गत शेष 23 शहरों में पेयजल से संबंधित कार्य प्रस्तावित है।

इन सभी 23 शहरों हेतु राशि रुपये 975.42 करोड़ की डीपीआर की स्वीकृति अमृत योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) द्वारा की जा चुकी है। 23 शहरों हेतु राशि रुपये 1067.50 करोड़ (मय सात वर्ष के संचालन एवं संधारण के) के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर, 2018 तक इन योजनाओं पर रुपये 283.06 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित करना

‘सिंगापुर की राष्ट्रीय कम्पनी सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज के साथ राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2014 में पेयजल प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित कर उपयोग में लिये जाने की परियोजनाओं को प्रस्तावित एवं क्रियान्वित रखने के कार्य में राज्य के तकनीकी अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने (Capacity building) के कार्य में सहयोग दिये जाने का करार किया गया है। उक्त करार के तहत राज्य में इस प्रकार की योजनाओं को चिन्हित कर उचित स्तर से स्वीकृत करने के कार्य में सिंगापुर की कम्पनी द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जावेगा। एमओयू के अन्तर्गत कुल 100 तकनीकी अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने (Capacity building) के कार्य के प्रावधान के तहत तीन कार्यशालाओं का आयोजन सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज द्वारा जयपुर में किया जा चुका है। राज्य के 9 सदस्यीय तकनीकी अधिकारियों का दल उच्च कोटि के एकीकृत जल प्रबंधन के अनुभव एवं दक्षता संवर्धन हेतु सिंगापुर जा चुका है। सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तुत Strategic Action Plan Report को अनुमोदित कर दिया गया है। सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तुत Final Concept Design Report का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है।

‘जन स्वा. अभि. विभाग एवं ईईएसएल (Energy Efficiency Services Ltd.-EESL) के मध्य एम.ओ.यू. (MOU) किया गया है जिसके अन्तर्गत अजमेर जिले एवं शेष राजस्थान हेतु एनर्जी ऑडिट (Energy Audit) एवं पेयजल-पम्पसेटस् के लिए डीपीआर बनाने का कार्य प्रस्तावित हैं। ईईएसएल द्वारा अजमेर जिले में स्थित पम्प हाउसों के लिए एनर्जी ऑडिट का कार्य किया गया है तथा एस्को (ESCO) मॉडल पर पम्पसेटस् को बदलने के कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत पुराने पम्पों के स्थान पर उर्जा दक्ष पम्प लगाने का कार्य प्रगतिरत है।

राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड के अन्तर्गत कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्तर्गत राज्य में शामिल अलवर जिले में 5 शहर/कस्बे — अलवर, राजगढ़, बहरोड़, तिजारा एवं भिवाडी की पुनर्गठित/संवर्द्धन पेयजल योजनाएं क्रमशः रु. 174.86 करोड़, रु. 20.24 करोड़ रु. 26.02 करोड़, रु. 16.46 करोड़ एवं रु. 40.69 करोड़ की राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड (NCRPB) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु NCRPB द्वारा 75 प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध करवाई जायेगी एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध विभाग द्वारा अलवर, राजगढ़, बहरोड़, तिजारा एवं भिवाडी कस्बे के लिए क्रमशः रु. 145.15 करोड़, रु. 17.43 करोड़, रु. 24.04 करोड़, रु. 16.02 करोड़ एवं रु. 60.64 करोड़ के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं जिन पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। भिवाडी कस्बे के लिए प्रदत्त कार्यादेश में राज्यमद से जारी स्वीकृति तथा उक्त स्वीकृति (NCRPB) दोनों के कार्य सम्मिलित है। इन योजनाओं के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इन योजनाओं पर दिसम्बर, 2018 तक लगभग 82 प्रतिशत राशि का व्यय किया जा चुका है।

इस क्रम में 2 शहर/कस्बे—खैरथल एवं किशनगढ़बास हेतु राशि क्रमशः रुपये 36.26 करोड़ एवं रुपये 21.05 करोड़ की पेयजल योजनाओं हेतु राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड (NCRPB) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई है। एवं स्रोत निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कस्बे—खैरथल एवं किशनगढ़बास हेतु राशि क्रमशः रुपये 13.83 करोड़ एवं रुपये 09.34 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है उक्त स्वीकृतियों के कार्य आदेश राशि क्रमशः रुपये 41.13 करोड़ दिनांक 3.10.18 एवं

रुपये 28.52 करोड़ दिनांक 25.7.18 जारी किये जा चुके हैं कार्य प्रगति पर है।

सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन

पेयजल से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए वर्तमान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आमजन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन पर टोल फ्री टेलीफोन नं. 181 अथवा ई-मेल द्वारा पेयजल से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक कुल प्राप्त 140420 शिकायतों में 133816 शिकायतों का त्वरित निपटारा किया गया है।

एस्को मॉडल

राज्य एस्को मॉडल पायलेट प्रोजेक्ट के तहत शहरी जल प्रदाय योजना उदयपुर के मुख्य पेयजल स्रोत जयसमन्द से लिये जा रहे पानी के सम्पूर्ण तंत्र के रखरखाव को अनुबंध पर दिया जाकर अनुबंधक के निवेश से उच्च दक्षता वाली पम्पिंग मशीनरी आदि लगाकर जल प्रदाय योजना के तंत्र को उर्जादक्ष (energy efficient) करने का अभिनव प्रयोग किया गया। उक्त योजना पर अगस्त, 2010 से अभी तक विद्युत खर्च में लगभग रु. 25.62 करोड़ की कुल बचत की गई एवं जल उत्पादन में वृद्धि करते हुए पेयजल योजना में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। इस मॉडल को शहरी जल योजना जोधपुर के कायलाना हैडवर्क्स पर प्रारम्भ किया गया है जिसमें उच्च दक्षता के पम्पसेट एवं अन्य उपकरण लगाये जाकर जून, 2014 से अक्टूबर, 2018 तक विद्युत एवं संचालन एवं संधारण व्यय पर रु. 16.22 करोड़ की बचत की गई एवं जल उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। इसी प्रकार भीलवाडा शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु कांकरोलिया घाटी हैडवर्क्स पर एस्को मॉडल के तहत उच्च दक्षता के पम्पसेट बदले जाकर जुलाई 2014 से अभी तक विद्युत व्यय में लगभग रु. 3.97 करोड़ की बचत की गई है। इसी प्रकार शहरी योजना भरतपुर में मार्च 2016 से अभी तक राशि रु. 4.75 करोड़ की विद्युत बचत की गई। राज्य के अन्य बड़ी राजीव गांधी लिट कैनल जोधपुर पर इस मॉडल के तहत सितम्बर 2016 से अभी तक राशि रुपये 67.90 करोड़ की विद्युत बचत की गई हैं। इसी प्रकार एस्को मॉडल को अन्य योजनाओं पर भी लागू किया गया है तथा अभी तक कुल रु. 116.01 करोड़ की विद्युत बचत की गई है।

ब्राह्मणी-जयपुर इंटरलिंगिंग प्रोजेक्ट

बीसलपुर बांध की निर्भरता बढ़ाने के लिये ब्राह्मणी-जयपुर इंटरलिंगिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। जिसकी वित्त विभाग से राशि रु. 5808.78 करोड की स्वीकृति (सैद्धान्तिक) प्राप्त हो गयी है, जिसमें से राशि रु. 5.57 करोड प्रोजेक्ट की डी.पी. आर. बनाने का कार्य सम्मिलित है। विभाग की वित्तीय समिति की 749 वीं मिटिंग में डी.पी.आर. बनाने के कार्य हेतु राशि रु. 5.57 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। डी.पी.आर. बनाने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

गैर राजस्व जल में कमी

जयपुर शहर में गैर राजस्व जल में कमी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा JICA (जापान) के साथ एम.ओ.यू. किया गया है कि जिसके अन्तर्गत जापानी विशेषज्ञों द्वारा साढ़े तीन वर्षों में शहर के पायलट एरिया में गैर राजस्व जल में कमी करने के कार्य का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत जयपुर शहर के 4 पायलट एरिया क्रमशः बनीपार्क, चित्रकूट, आदर्श नगर एवं मानसरोवर सेक्टर-1 का चयन किया जाकर रु. 43.19 करोड की स्वीकृति जारी की गई है। इस पायलट एरिया में 12000 मीटर एवं जल संबंध तथा सभी वितरण पाईप लाईनों को बदलने का प्रावधान रखा गया था। कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात मीटर की संख्या बढ़ा कर 17824 कर दी गई। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैर राजस्व जल की औसत मात्रा 35 प्रतिशत थी, जो कार्य के दौरान मीटर बदलने से लगभग 21 प्रतिशत रह गई। इससे राजस्व में औसत 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाईप लाईन एवं जल संबंध बदलने का कार्य प्रगति पर है जिससे गैर राजस्व जल की मांग अनुमानतः 15 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इस कार्य पर दिसम्बर, 2018 तक राशि रु 29.49 करोड व्यय किये जा चुके हैं।

आदर्श नगर, जयपुर में लीकेज डिटेक्शन यार्ड की स्थापना की जा चुकी है। ट्रेनिंग मैन्यूवल एवम ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया गया है। मुख्यालय एवम क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गैर राजस्व जल में कमी हेतु इकाईयों का गठन किया जा चुका है।

आपके 2 मिनट के पानी की बर्बादी



इसके लिए 2 दिन का पीने का पानी

4

राज्य में भूजल दोहन का परिदृश्य

राज्य का अधिकांश क्षेत्र पेयजल एवं कृषि हेतु भूजल पर निर्भर है। वर्तमान में भूजल के अतिदोहन के परिणाम स्वरूप आज भूजल भण्डार में चिंताजनक स्तर तक कमी आ चुकी है। दोहन व पुनर्भरण की तुलना के आधार पर किसी भी क्षेत्र को 4 प्रमुख चरणों में विभक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रयासों से भूजल भण्डार में वृद्धि हुई है। सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या 25 से बढ़कर 44 हो गई है।

अतिदोहित	जहां दोहन पुनर्भरण से अधिक है
क्रिटिकल	जहां दोहन पुनर्भरण का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत है
सेमि क्रिटिकल	जहां दोहन पुनर्भरण का 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत है
सुरक्षित	जहां दोहन पुनर्भरण का 70 प्रतिशत से कम है



विवरण	1984 (कुल 237 में से)	2004 (कुल 237 में से)	2009 (कुल 239 में से)	2011 (कुल 243 में से)	2013 (कुल 248 में से)
अतिदोहित ब्लॉक	41	140	166	172	164
क्रिटिकल ब्लॉक	26	50	25	24	09
सेमि क्रिटिकल ब्लॉक	34	14	16	20	28
सुरक्षित ब्लॉक	135	32	31	25	44
पूर्ण खारे ब्लॉक	1	1	1	2*	3*

*चूरु जिले में तारानगर, बीकानेर जिले में खाजूवाला व हनुमानगढ़ में रावतसर


वार्षिक योजना 2018-19

5.1 भौतिक प्रगति

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) वर्ष 2018-19 में 1982 ग्राम व ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 3922 ग्राम व ढाणियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें से 319 एस.सी. बहुल 952 एस. टी. बहुल व 101 अल्प संख्यक बहुल गांव व ढाणियां हैं। वर्ष 2018-19 में 2150 ग्राम व ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया गया। जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2018 तक 3412 ग्राम व ढाणियों को लाभान्वित कर दिया गया है। जिसमें 225 एस.सी. बहुल, 229 एस. टी. बहुल व 9 अल्प संख्यक बहुल गांव व ढाणियां हैं। जिलेवार

विवरण परिशिष्ट-2 व 3 पर दर्शाया गया है।

राज्य में 2011 की आबादी के अनुसार कुल 222 कस्बे, 43,289 आबाद ग्राम व 78237 ढाणियाँ हैं। इनमें से वर्ष 2018-19 (माह दिसम्बर 2018 तक) विभिन्न योजनाओं द्वारा 43039 ग्राम व 68672 ढाणियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 31175 ग्राम व 59641 ढाणियां भूजल से व 11864 ग्राम व 8931 ढाणियां सतही स्रोतों से लाभान्वित हैं। दिसम्बर 2018 तक लाभान्वित कुल ग्राम व ढाणियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 4 व 5 पर उपलब्ध है।

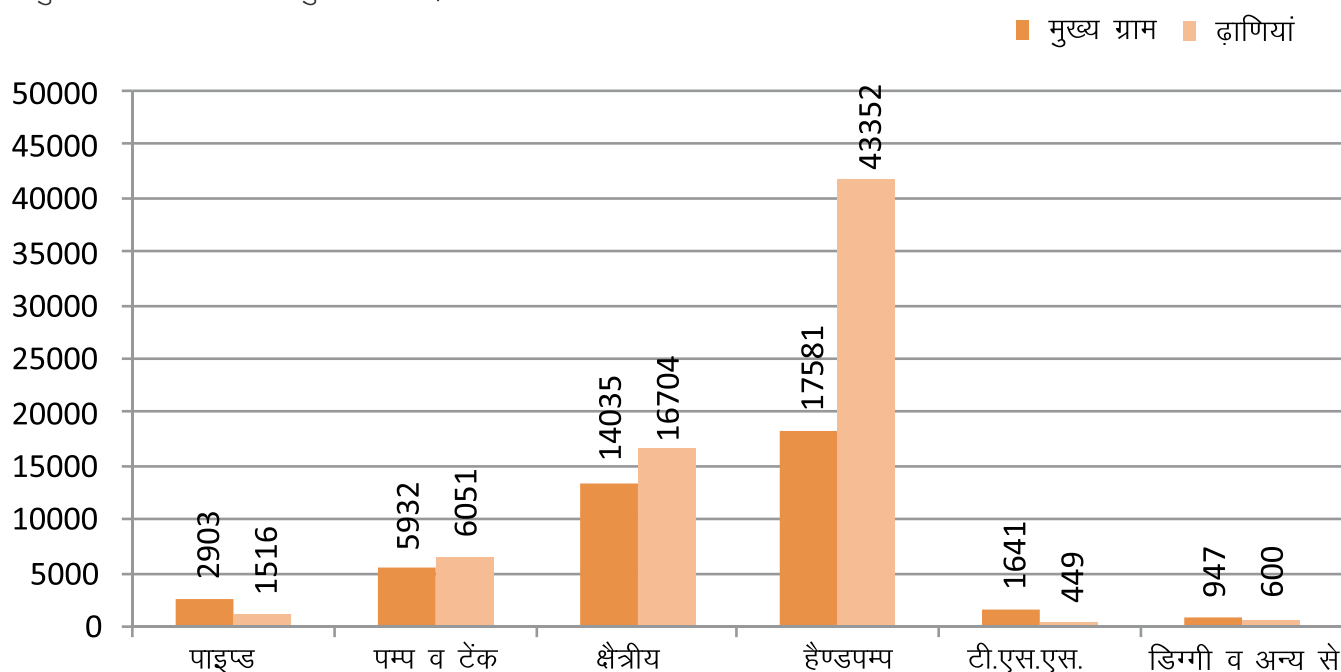

विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित ग्राम व ढाणियों की संख्या

5.2 वित्तीय प्रगति

5.2.1 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त राशि व व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना	प्रारम्भिक शेष (01.04.18)	भारत सरकार से प्राप्त राशि 12/2018 तक	कुल उपलब्ध राशि 2018-19	व्यय 2018-19 12/2018 तक अनुमानित
1	एनआरडीडब्ल्यूपी (सामान्य, गुणवत्ता एवं सस्टेनैबिलिटी)				
2	एनआरडीडब्ल्यूपी (डीडीपी)				
3	एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता 5 : ईयर मार्क)				
4	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम				
5	सहायता राशि				
6	प्रधानमंत्री घोषणा (15-8-2002)				
7	चुरू बिसाउ परियोजना	15227.35	55082.54	70309.89	55221.72
8	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ	290.37		290.37	0.00
9	ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों में जलशोधन यंत्र की स्थापना	589.63		589.63	0.00
10	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सबमिशन	37429.41	10458.00	47887.41	9891.98
11	नीति आयोग (OTMP)	7717.00		7717.00	2063.07
	योग (ग्रामीण)	61253.76	65540.54	126794.30	67176.77

5.2.2 राज्य मद का बजट अनुमान एवं व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	व्यय 2018-19 12/2018 तक अनुमानित
वार्षिक योजना 2018-19 का बजट अनुमान			
1	नगरीय (शहरी) पेयजल योजनाएँ :		
	राज्य फण्ड	122834.96	64082.91
	जे.एन.एन.यू.आर.एम. (मैचींग शेयर राज्य मद)	50.00	31.40
	कुल योग : नगरीय पेयजल योजनाएँ	122884.96	64114.31
2	ग्रामीण पेयजल योजनाएँ :		
	राज्य फण्ड	341024.99	198311.69
	भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत)	124245.06	67176.77
	कुल योग : ग्रामीण पेयजल योजनाएँ	465270.05	265488.46
	कुल योग : नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाएँ	588155.01	329602.77

6

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)

जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (WSSO) सपोर्ट प्रोग्राम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009 में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (WSSO) का गठन किया गया था। इस संगठन के माध्यम से मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, एम.आई.एस, कम्प्यूटराईजेशन एवं शोध व विकास के कार्य हाथ में लिए गये हैं। इसी के तहत ग्रामीण जनता में जल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए सामाजिक उत्प्रेरण का कार्य अनेक गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है।

सपोर्ट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं:-

1. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियाँ (आई.ई.सी.)
2. मानव संसाधन विकास (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम)
3. कम्प्यूटराईजेशन
4. प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)
5. ग्रामीण जल प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता
6. राज्य तकनीकी एजेंसीज एवं प्रमुख संसाधन केन्द्र (के. आर.सी.)
7. शोध एवं विकास
8. सेन्टर ऑफ़ एक्सीलेन्स

वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सपोर्ट गतिविधियों के अन्तर्गत किए गए मुख्य कार्यों के विवरण निम्नानुसार है:-

1. आई.ई.सी. सामग्री का निर्माण

जल जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर निम्न सामग्री तैयार की गई :-

(अ) प्रिन्ट मीडिया के लिए पोस्टर डिजाईन

- जल संरक्षण सम्बन्धी पोस्टर
- जल का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग
- वर्षा जल संग्रहण
- सामुदायिक आर.ओ. का उपयोग
- सौर ऊर्जा आधारित डीपलोरीडेशन यूनिट एवं पम्प का उपयोग
- जल संरक्षण संकल्प
- सतही एवं विशिष्ट पेयजल परियोजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया द्वारा जल प्रबन्धन के विभिन्न विषयों पर प्रचार-प्रसार

राज्य के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (दूरदर्शन एवं टी.वी. चैनलों)



के माध्यम से जल जागरूकता संदेशों का प्रसारण जन जागृति उत्पन्न करने के लिए किया गया।

संचार के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार है :-

- आर.ओ. प्लॉन्ट का उपयोग
- जल का बुद्धिमतापूर्वक उपयोग
- वर्षा जल संग्रहण
- सतही जल परियोजनाएँ
- जल संरक्षण एवं संवर्धन
- सोलर डी.एफ.यू
- विशिष्ट एवं सतही पेयजल परियोजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार

आई.ई.सी सामग्री जैसे पोस्टर्स/वीडियो/ऑडियो/होर्डिंग्स/पत्र पत्रिकाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न वर्गों में शेयर किया गया।

(स) लघु फिल्म निर्माण

- नोखा-दैया प्रोजेक्ट पर आधारित लघु फिल्म का निर्माण एवं प्रचार-प्रसार
- पोकरण फलसूण्ड परियोजना पर आधारित लघु फिल्म का निर्माण एवं प्रचार-प्रसार

2. मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) गतिविधियाँ

- बेहतर विभागीय प्रबन्धन एवं कार्यकुशलता संवर्द्धन

हेतु विभागीय अभियन्ताओं को एम.एन.आई.टी. के माध्यम से कुल आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विभाग के 180 अभियन्ताओं को लाभान्वित किया गया।

- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राजस्थान के साथ 2000 हैण्डपम्प मिस्त्रियों के प्रशिक्षण का एक एम.ओ.यू किया गया जिसके तहत वर्तमान में 615 हैण्डपम्प मिस्त्रियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है।
- दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को विभागीय अभियन्ताओं एवं रसायनज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला "Integrated Fluorosis Mitigation पर की गई कार्यशाला में यूनिसेफ के सहयोग से करीब 35 अधिकारियों ने भाग लिया।

- नीरी एवं यूनिसेफ के सहयोग से दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला "Strengthening Water Quality Monitoring and Surveillance का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के करीब 50 अभियन्ताओं एवं रसायनज्ञों ने भाग लिया।

3. Rajasthan Center of Excellence in Water Resources Management (RaCEWaRM) के तहत किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

- राजस्थान सरकार एवं दक्षिण आस्ट्रेलिया सरकार के



मध्य वर्ष 2015 में सिस्टर स्टेट एम.ओ.यू. किये जाने के पश्चात वर्ष 2016 में ट्वेंटिड की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किया गया।

- उपरोक्त एम.ओ.यू. के तहत वर्ष 2018 में पी.एच.ई.डी. विभाग के 14 अभियन्ताओं को फेलोशिप प्रोग्राम के तहत दिनांक 29 जून, 2018 से 21 जुलाई, 2018 तक आस्ट्रेलिया भेजा गया।
- साउथ आस्ट्रेलिया सरकार के तकनीकी सहयोग से निम्न चार परियोजनाओं को राजस्थान में चालू किया गया:—
- Rajasthan Groundwater Assessment, Mapping and Management (RAGrMM)
- Low Cost Management of desalination reject water.
- MARVI (Management Aquifer Recharge) and Sustaining Groundwater use through village-level intervention
- State Water Grid-Managed Aquifer Recharge

उपरोक्त चार परियोजनाओं के अतिरिक्त CSIRO-UNICEF के साथ Pesticide Monitoring and Management of Water Quality परियोजना का आरम्भ किया गया। इस परियोजना हेतु डी.पी.आर. निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

- दिनांक 21.08.2018 को आस्ट्रेलियन डिप्टी हाई कमिश्नर ने RaCEWaRM के ऑफिस का विजिट किया, तत्पश्चात् दिनांक 08.10.2018 को RaCEWaRM के तत्वाधान में चारों चिन्हित परियोजनाओं की प्रगति पर आस्ट्रेलियन अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4. समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम:—

- प्रदेश के सभी 9894 ग्रामपंचायतों में पेयजल प्रबंधन एवं जन जाग्रति हेतु सामाजिक गतिशीलता कार्यक्रम के अंतर्गत खुली निविदा के माध्यम से फर्म चयन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को जलगुणवत्ता एवं पेयजल प्रबंधन हेतु जाग्रत कर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे।
- जयपुर शहर में बीसलपुर बौध में पानी की ऑवक की कमी को देखते हुए एक विस्तृत जन चेतना कार्यक्रम का प्रारूप तैयार कर अनुमोदन करवाया गया जिसके अन्तर्गत जयपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्र के करीब एक लाख स्कूली बच्चों के साथ रैली के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा।

5. जल सुरक्षा प्लान

- WSSO एवं UNICEF के सहयोग से राजस्थान में डूंगरपुर तथा झुंझुनू जिले की एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर भारत सरकार को सूचित किया गया है, इसी क्रम में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23.04.2018 को जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पी.एच.ई.डी. अधिकारियों ने भाग लिया।

6. जल गुणवत्ता से सम्बन्धित शोध व विकास गतिविधियाँ

- MNIT के साथ ColiPat kit (a low cost field test kit for detection of coliforms in drinking water. की स्टडी हेतु लगभग 20.40 लाख रु का कार्य श्वीकृत किया गया है।

7. स्वजल कार्यक्रम

- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान राज्य के 5 आकांक्षी (Aspirational) जिलों यथा करौली, धोलपुर, जैसलमेर, सिरौही एवं बांरा का चयन किया जाकर इनके ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी आधारित लघु पाईपड जल सप्लाई योजनाओं के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।
- दिनांक 27 फरवरी, 2018 को माननीय सुश्री उमा भारती, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करौली जिले के भीकमपुरा गाँव में पेयजल परियोजना की शुरुआत की। वर्तमान में यह परियोजना पूर्ण की जाकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, भीकमपुरा को सुपुर्द की जा चुकी है तथा उक्त योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं।



पेयजल परिवहन

संवत् 2075 में आपदा प्रबन्धन एवं राहत विभाग द्वारा 9 जिलों के 5555 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित किया इन अभावग्रस्त जिलों/क्षेत्रों में जल परिवहन जिला प्रशासन द्वारा करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी अन्य समस्याग्रस्त जिलों/क्षेत्रों जल परिवहन करवाया जायेगा। वर्ष 2018 की ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग से अधिकतम 3414 गांव एवं 3024 ढाणियों (कुल 6438) में 9138 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अधिकतम 61 कस्बों/शहरों में 4645 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया गया।


ग्रीष्म, 2018 के दौरान राज्य में सड़क मार्ग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम प्रतिदिन उपलब्ध करवाये गये पेयजल का विवरण निम्नानुसार है।

ग्रीष्म संवर्धन 2018 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

ग्रीष्म संवर्धन 2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा

विवरण	शहरी	ग्रामीण
लाभान्वित शहर/गांव/ढाणियां	61	6438
सड़क द्वारा अधिकतम परिवहन टैंकर ट्रिप प्रतिदिन की संख्या	4645	9138

अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है।

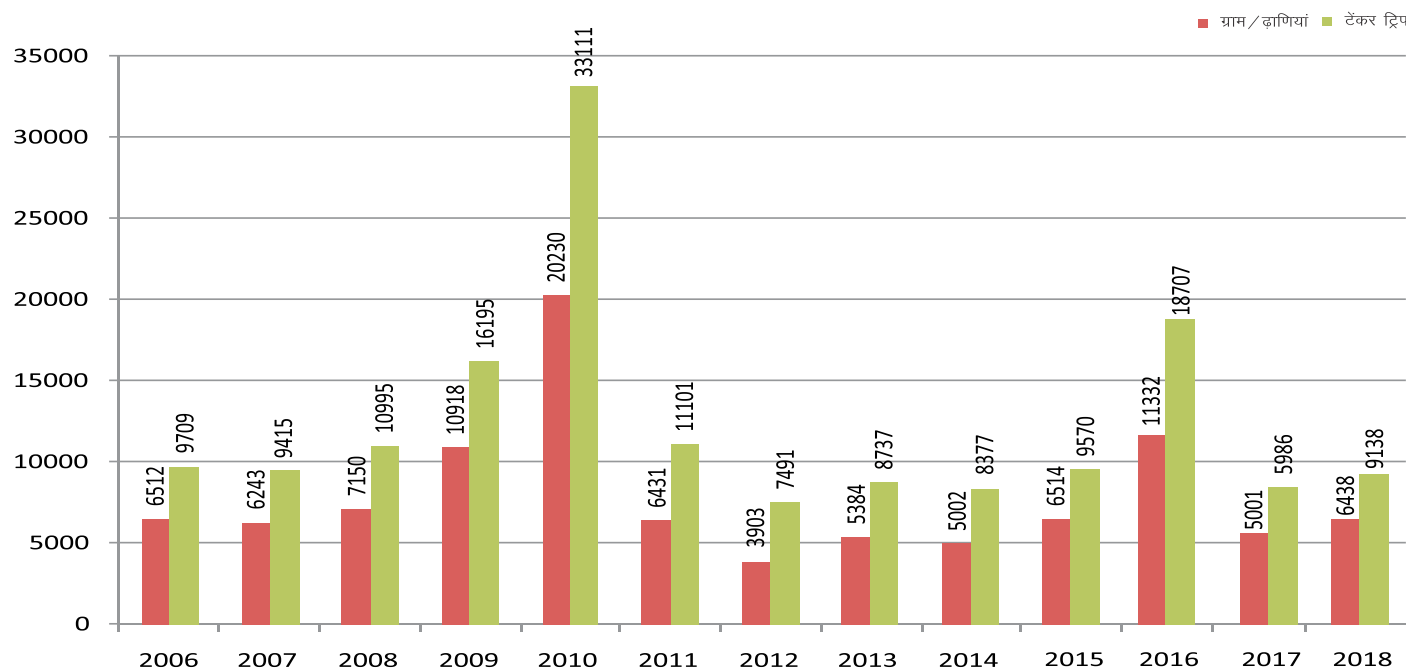

विगत वर्षों में ग्रीष्म संवर्धन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन

8

हैण्डपम्प मरम्मत अभियान


हैण्डपम्पों का रखरखाव प्रदेश के 23 जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं एवं शेष 10 मरुस्थलीय जिलों (जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं व जालौर) में जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा किया जाता रहा है। जनवरी 2008 से सभी 33 जिलों में वर्ष पर्यन्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में पेयजल वितरण एवं संधारण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु 42वाँ विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2019 तक चलाया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,66,327 एवं शहरी क्षेत्रों में 27,669 हैण्डपम्प मरम्मत किये गये। इस हेतु प्रति वर्ष की भांति ग्रीष्म काल में 531 अनुबन्ध वाहन एवं 2500 श्रमिक संविदा पर उपलब्ध कराए गये। वर्तमान में 260 अनुबन्ध वाहन उपलब्ध करवा कर हैण्डपंप मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है।

41वें अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों का जिलेवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-8 व 9 पर दर्शाया गया है। इसी तरह 42वें मरम्मत अभियान के तहत अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2019 तक मरम्मत हैण्डपंप का विवरण 10 व 11 पर दर्शाया है।



■ हैण्डपम्पों की संख्या

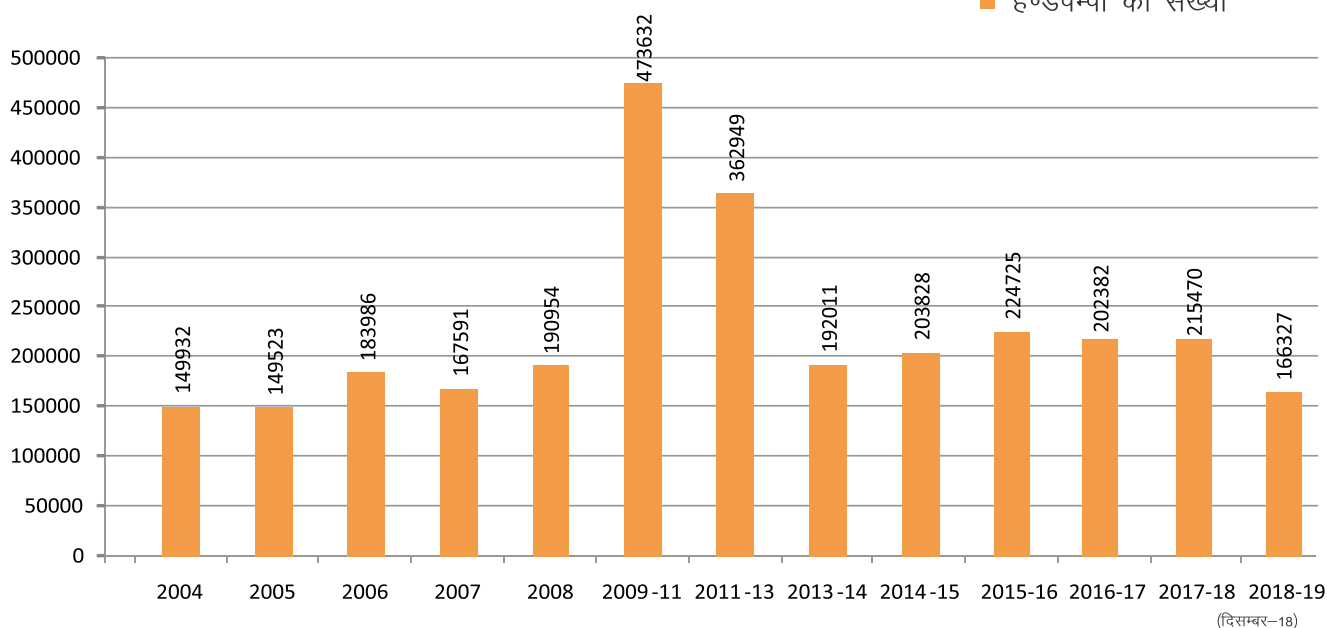

ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या

(दिसम्बर-18)

आर. ओ. प्लांट

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्यतः पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराईड की समस्याओं सहित बहु गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों/ढाणियों में आर.ओ. प्लांट्स (मय बोरवेल निर्माण, विद्युत कनेक्शन एवं सात वर्ष ओ. एंड एम. सहित) लगाने का कार्य

हाथ में लिया गया है। चार चरणों में अब तक 3903 आर.ओ. प्लांट्स स्वीकृत कर 2785 आर.ओ.प्लांट्स चालू कर दिए गए। चतुर्थ चरण में 772 आर.ओ.प्लांट्स (अनुमानित लागत रु. 222.73 करोड़) के कार्यादेश माह सितम्बर 2018 में जारी किये गये हैं। कार्य पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष है।



स्वीकृत एवं स्थापित आर. ओ. प्लान्ट का विवरण (दिसम्बर 2018 तक)

परिशिष्ट - अ

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत आर.ओ. प्लान्ट्स की संख्या	स्थापित आर.ओ. प्लान्ट्स की संख्या
1	अलवर	145	66
2	बीकानेर	31	31
3	चूरू	105	103
4	दोसा	115	24
5	सीकर	88	78
6	झुन्झुनू	77	63
7	जयपुर	89	89
8	भरतपुर	971	559
9	सवाईमाधोपुर	123	123
10	करौली	57	41
11	भीलवाड़ा	43	31
12	नागौर	521	368
13	चित्तौड़गढ़	90	80
14	राजसमन्द	31	29
15	जोधपुर	236	236
16	पाली	146	144
17	कोटा	88	65
18	बूंदी	100	86
19	बारां	15	12
20	बाड़मेर	218	157
21	जालोर	242	167
22	सिरोही	193	75
23	जैसलमेर	99	99
24	झालावाड़	16	2
25	बांसवाड़ा	12	9
26	डूंगरपुर	28	24
27	उदयपुर	24	24
कुल योग		3903	2785

प्रतिबद्ध राज्य निधि संधारण व्यय तथा राजस्व

9.1 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय


वर्ष 2017-18 में बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के संशोधित अनुमान राशि रुपये 3218.88 करोड़ के थे। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 236.65 करोड़ बजट मद 2215 में बजट मद 4215 से ओ. एण्ड एम. के लिए स्थानान्तरित किये जाने के संशोधित बजट अनुमान थे। इस प्रकार बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3455.53 करोड़ के संशोधित बजट अनुमान थे। वर्ष 2018-19 में बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के बजट अनुमान राशि रुपये 3162.24 करोड़ के थे। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 260.32 करोड़ के बजट मद 2215 में बजट मद 4215 से ओ. एण्ड एम. के लिए स्थानान्तरित किये जाने के बजट अनुमान के प्रावधान थे। इस प्रकार बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3422.56 करोड़ उपलब्ध करवाने के बजट अनुमान थे। इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि में से कार्मिकों के वेतन, भत्तों तथा योजनाओं के संचालन एवं संधारण सम्बंधी व्यय किये जाते हैं। योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए उनके विद्युत बिलों का भुगतान, पम्प मोटर की मरम्मत, पाईप लाईनों की मरम्मत के बिलों का भुगतान उक्त स्वीकृत प्रावधान में

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19
1.	09 - विद्युत प्रभार	1647.55	1146.14
2.	21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	27.84	24.62
3.	41-संविदा व्यय	78.17	48.50
4.	45-वितरण प्रणाली में सुधार	62.18	41.29
5.	70-रासायनिक प्रभार	20.19	12.31
6.	वेतन एवं अन्य	1466.12	1453.18

से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए एलम, क्लोरिन एवं ब्लीचिंग पाउडर आदि का व्यय भी इस राशि से भारित होता है। जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से लिये जा रहे रॉ-वाटर का भुगतान भी इस मद से किया जाता है। वृहद् परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण संबंधी व्यय भी इस मद के अन्तर्गत उपमद संविदा व्यय से किया जाता है। जिला ई-मित्र सोसाइटी का पानी के बिलों के संग्रहण के कमीशन का भुगतान भी इस मद से किया जाता है। 2017-18 व वर्ष 2018-19 (दिनांक 16 जनवरी 2019 तक) अन्तर्गत बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय उपरोक्तानुसार है।

9.2 संधारण व्यय एवं राजस्व

पेयजल योजनाओं का प्रतिबद्ध राज्य निधि संधारण व्यय, जल राजस्व की तुलना में कई गुना अधिक है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 (माह दिसम्बर 2018 तक) का राजस्व प्राप्तियां व प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय का विवरण परिशिष्ट-17 पर है।

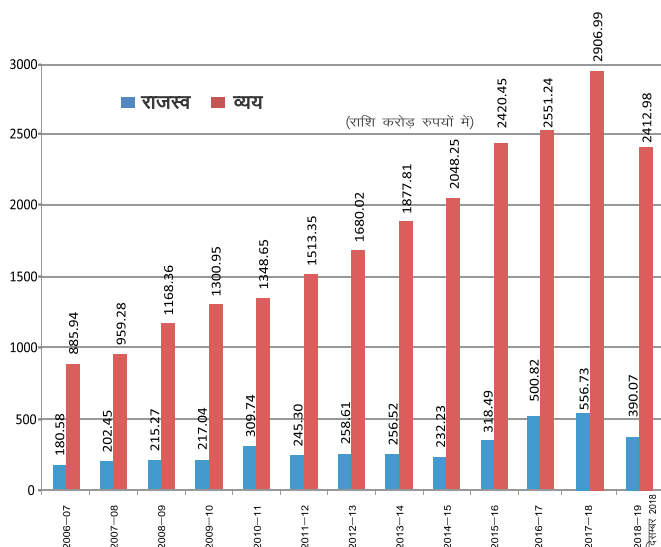

विगत वर्षों में पेयजल योजनाओं के संधारण का आर्थिक आंकलन

ड्रिलिंग रिगों का प्रबन्धन

विभाग में सामान्यतः विभागीय नलकूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण जन स्वा0 अभि0 विभाग, की ड्रिलिंग रिगो द्वारा किया जाता है, परन्तु बढ़ती मांग व निर्माण को समय पर सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय रिगों की क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करते हुए नियमित खण्डों द्वारा निजी संवेदकों से भी कार्य सम्पादित करवाये जा रहे हैं। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 34 रिगें, विभिन्न जिलों में नलकूपों व हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु कार्यरत हैं। आवश्यकतानुसार इन रिगों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य करने हेतु जाता है, जिससे कि पेयजल स्रोतों का निर्माण आवश्यकतानुसार समय पर कराया जा सके। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त है एवं वर्षा भी पूरे क्षेत्र में असमान रूप से होती है जिसकी वजह से प्रतिवर्ष राज्य में किसी न किसी क्षेत्र में ग्रीष्मऋतु में पेयजल समस्या उत्पन्न होती रहती है। विभाग में वर्तमान में जो मशीनें कार्यरत हैं उनमें से अधिकांश रिग मशीनें 28-29 वर्ष पुरानी हैं। अतः राज्य के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के निवारण हेतु शीघ्र ही हैण्डपम्पों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु नई रिग मशीनें क्रय किया जाना आवश्यक है।

हैण्डपम्प व नलकूप वेधन इकाईयां

विभाग के पास वर्तमान में 25 रिग मशीनें हैण्डपम्प हेतु एवं 9 रिग मशीनें नलकूप बनाने हेतु कार्यरत हैं। विभाग में नलकूप के लिए 300 मीटर एवं हैण्डपम्प के लिए 90 से 200 मीटर तक वेधन कार्य करने की क्षमता वाली रिग मशीनें उपलब्ध हैं। 2 नई कॉम्बीनेशन रिग मशीनें हैण्डपम्प वेधन हेतु वर्ष

2013 में क्रय कर काम में ली जा रहीं हैं ताकि कुल वेधन लक्ष्य

प्राप्त किये जा सकें। पुरानी रिग मशीनों के हाईड्रोलिक सिस्टम, कन्ट्रोल पैनल आदि की स्थिति अत्यन्त खराब हो जाने के कारण बदलने की आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 में 7 रिग मशीनों एवं वर्ष 2015-16 में 2 कॉम्बीनेशन रिग मशीनों (नलकूप हेतु) का पुनरुद्धार कार्य करवाया गया है। वर्ष 2016-17 में माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक इन विभागीय रिगों द्वारा 2180 हैण्डपम्पों एवं 115 नलकूपों का निर्माण किया गया था एवं वर्ष 2017-18 में इन विभागीय रिगों द्वारा 1743 हैण्डपम्पों

एवं 71 नलकूपों का निर्माण किया गया था। वर्ष 2018-19 (माह दिसम्बर 2018 तक) में इन विभागीय रिगों द्वारा 1413 हैण्डपम्पों एवं 59 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है।



वृहद् पेयजल परियोजनाएं

वर्तमान में रु. 37126.90 करोड़. लागत की 127 वृहद् पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनके अन्तर्गत 104 शहरों, 17566 ग्रामों व 12,609 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जाना है। अभी तक रु.9740.76 करोड़ लागत की 70 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाकर 31 कस्बों/शहरों 4769 ग्रामों तथा 5128 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 44 परियोजनाएं रु. 24399.73 करोड़. लागत की प्रगतिरत हैं, जिन पर दिसम्बर 2018 तक रु. 16192.34 करोड़ का व्यय किया जाकर 47 शहरों, 4226 ग्रामों तथा 2964 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही 4 फिजिबिलिटी स्टैडीज प्रगतिरत हैं एवं शेष रही 9 परियोजनाओं के कार्य शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं। वृहद् पेयजल परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

12.1 चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना — प्रथम चरण

जिला करौली एवं सवाई माधोपुर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु चम्बल नदी को जल स्रोत लेते हुए चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती विभागीय

नीति निर्धारण समिति (पी.पी.सी.) 157/22.09.2004 एवं संशोधित स्वीकृती पी.पी.सी. 191/19.09.2013 द्वारा रुपये 567.00 करोड़ की जारी की गयी। परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के कुल 636 ग्राम एवं सवाई माधोपुर शहर तथा द्वितीय चरण में कस्बा सवाई माधोपुर तथा करौली की 100 प्रतिशत पेयजल मांग एवं कस्बा गंगापुर सिटी तथा टोडाभीम की 50 प्रतिशत पेयजल मांग के अतिरिक्त सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के कुल 926 ग्रामों (प्रथम चरण के 636 ग्रामों सहित) की पेयजल मांग सम्मिलित है।

प्रथम चरण के प्रथम पैकेज के तहत चम्बल नदी पर मण्डरायल के पास इन्टेक वेल, मण्डरायल घाटी में जलशोधन प्लांट एवं पम्प स्टेशन तथा सवाई माधोपुर तक मुख्य ट्रान्समिशन पाईप लाईन डालने के कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 23.09.2005 को लागत रु. 269.30 करोड़ का जारी किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य पूर्ण करने की अवधि 3 वर्ष रखी गयी थी लेकिन परियोजना कार्यों में विलम्ब होने के कारण अभी प्रगतिरत है।

प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज के तहत नादौती तहसील के 63 गावों तथा गंगापुर एवं करौली के 46 मार्गस्थ गांव कुल 109 गावों के क्लस्टर पेयजल वितरण का कार्यादेश दिनांक 23.09.2013 को, रु. 234.90 करोड़ का जारी किया गया था। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल 391.84 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

इस योजना में हो रही देरी के कारण तैयार इंफ्रा के उपयोग के दृष्टिगत एक कन्टिजेन्ट योजना लागत रु 269 लाख की जारी की गयी एवं इससे आज की स्थिति में 80 प्रतिशत तैयार इंफ्रा का उपयोग करते हुए करौली शहर, गंगापुर शहर एवं नादौती ग्राम को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

इन्टेक वेल धौलपुर



12.2 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना-प्रथम चरण, भाग प्रथम

भरतपुर जिले में खारे पानी की समस्या से ग्रसित तहसील भरतपुर, कुम्हेर, रूपवास, नगर, डीग, कांमा एवं पहाडी के समस्त 945 गांवों एवं परियोजना की मुख्य पाइप लाइन के रास्ते के जिला धौलपुर में तहसील धौलपुर के 62 गांव एवं तहसील सैंपड के 44 गांव (धौलपुर जिले के कुल 106 गांव), कुल 1051 गांव व भरतपुर जिले के 5 शहरों (भरतपुर, कुम्हेर, नगर, डीग एवं कांमा) को लाभान्वित किये जाने के लिए चम्बल नदी पर इन्टेक वैल बनाकर भरतपुर तक ट्रान्समिशन मेन इत्यादि कार्य एवं धौलपुर जिले के 106 गांवों व भरतपुर जिले के 93 गांवों का जल वितरण परियोजना के इस प्रथम भाग के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की संशोधित स्वीकृती पी.पी.सी. 189/28.01.2013 द्वारा रु. 548.68 करोड की जारी की गई थी।

चम्बल धौलपुर से मलाह हैड वर्क्स भरतपुर तक मुख्य ट्रान्समिशन मेन के सभी कार्य लगभग पूर्ण कर दिये हैं एवं 11.10.2011 से जल सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई थी जिसके तहत भरतपुर शहर को आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। धौलपुर जिले के 62 गांवों की ग्रामीण जल योजना के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं प्रस्तावित सभी गांवों में पेयजल वितरण चालू कर दिया गया है।

धौलपुर जिले के सैंपड तहसील के 44 गांवों हेतु लागत 34.65 करोड रुपये की ग्रामीण जल योजना, भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के 30 गांवों हेतु लागत 47.52 करोड रुपये तथा कुम्हेर आफ टेक से भरतपुर जिले के 63 गांवों हेतु लागत 57.14 करोड रुपये की क्षेत्रिय ग्रामीण जल योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रूपवास तहसील के 30 गांव व 17 ढाणियों को पेयजल वितरण शुरू किया गया है। परियोजना के इस भाग पर दिसम्बर 2018 तक कुल 378.31 करोड रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

12.3 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना – प्रथम चरण, भाग- द्वितीय



प्रशासनिक भवन एवं नियंत्रण कक्ष मलाह

एन एच 21 पर पाईपलाईन डालने का कार्य



(भरतपुर-कुम्हेर-नगर-डीग-कांमा-पहाडी पाइप लाइन)

इस परियोजना के अन्तर्गत मलाह भरतपुर से कुम्हेर, नगर, डीग, कांमा, पहाडी तक स्वच्छ जल पाइप लाइन बिछाये जाने की स्वीकृती रु. 311.49 करोड की पी.पी.सी. की बैठक दिनांक 28.08.2012 में जारी की गई। इस योजना का कार्यादेश दिनांक 13.09.2012 को रु. 202.79 करोड का जारी किया गया था।

परियोजना के अन्तर्गत मलाह हैड वर्क्स से कुम्हेर, डीग एवं डीग से नगर एवं कामां, पहाडी तक मुख्य ट्रान्समिशन पाइप लाइन के कार्य एवं मलाह हैडवर्क्स से भरतपुर व कुम्हेर तहसील के 97 गांवों को क्षेत्रिय ग्रामीण जल योजना से लाभान्वित किये जाने के कार्य सम्मिलित हैं। कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति के कारण यह कार्य आदेश 22.09.2014 को रिसाइन्ड कर, शेष कार्यों के लिए दिनांक 29.01.2016 को आदेश जारी किया, जिसका कार्य प्रगति पर है। योजना पर दिसम्बर 2018 तक रु. 169.21 करोड का व्यय किया जा चुका है। आज की स्थिति में कुम्हेर शहर एवं 20 ग्राम को चम्बल नदी का पानी पहुँचा दिया गया है।

12.4 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना- प्रथम चरण, भाग- द्वितीय (कलस्टर)

भरतपुर जिले में खारे पानी की समस्या से ग्रसित तहसील भरतपुर, कुम्हेर, रूपवास, नगर, डीग, कांमा एवं पहाडी के समस्त 755 गांवों एवं भरतपुर जिले के 4 शहरों (कुम्हेर, नगर, डीग एवं कांमा) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की स्वीकृती पी.पी.सी. द्वारा 190 वीं मीटिंग दिनांक 30.05.2013 में रु. 720.31 करोड की जारी की गई है।

परियोजना के कार्यों को तीन क्लस्टर पैकेज के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना पर नवम्बर 2018 तक रु. 247.32 करोड व्यय किये जा चुके हैं। आज की स्थिति में 22 ग्राम एवं 17 ढाणियों को चम्बल नदी का पानी पहुँचा दिया गया है।

12.5 आपणी योजना – द्वितीय चरण

12.5.1 रतनगढ़-सुजानगढ़ सेक्शन:

आईजीएनपी पर आधारित आपणी योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत रतनगढ़ – सुजानगढ़ सेक्शन के तहत चूरु जिले के तहसील रतनगढ़ के 101 ग्राम एवं 2 शहर (रतनगढ़ एवं राजलदेसर) एवं तहसील सुजानगढ़ के 155 ग्राम एवं 3 शहर (सुजानगढ़, बीदासर व छापर) कुल 256 ग्राम एवं 5 शहरों के लिये योजना की संशोधित स्वीकृति पीपीसी की बैठक 190/30.5.13 में लागत रु. 971.21 करोड़ के लिये जारी की गयी।

इस परियोजना के प्रथम पैकेज जिसमें सरदारशहर से सुजानगढ़ की ट्रंक मेन एवं आपणी योजना के प्रथम चरण के धन्नासर से सरदारशहर सेक्शन का नवीनीकरण एवं तत्पश्चात 10 वर्ष के लिए ओएण्डएम के कार्य सम्मिलित है। इस हेतु दिनांक 6-7-2012 को कुल राशि रु. 249.75 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है। इस पैकेज का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10 वर्ष की संचालन एवं संधारण अवधि चल रही है।

योजना के द्वितीय पैकेज में ग्रामों में क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य लिया गया है। इस कार्य हेतु दिनांक 7-8-2013 को कुल राशि रु. 591.40 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है। योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 817.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.5.2 बूंगी राजगढ़ परियोजना :

आईजीएनपी पर आधारित आपणी योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत बूंगी राजगढ़ परियोजना के तहत चूरु जिले के तहसील राजगढ़ के 175 ग्राम एवं 1 शहर राजगढ़ एवं जिला झुन्झुनू की तहसील झुन्झुनू के 13 ग्राम, कुल 188 ग्राम एवं 1 शहर के लिये योजना की संशोधित स्वीकृति पीपीसी की बैठक 188/24.8.12 में लागत रु. 415.64 करोड़ के लिये जारी की गयी।

इस परियोजना के प्रथम पैकेज के कार्यों में तारानगर में फिल्टर प्लांट, रॉवाटर रिजर्वायर व ट्रंक पाईप लाइन 5 मुख्य स्वच्छ जलाशय मय पंप हाउस का कार्य सम्मिलित है। इस हेतु राशि रु. 151 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है। योजना के द्वितीय पैकेज जिसमें ग्रामों में क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य लिया गया है, के लिये राशि रु. 118 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है।

वर्तमान में 183 गांवों व राजगढ़ कस्बे को पेयजल से लाभांशित किया जा चुका है। शेष बचे 5 ग्रामों को पी.एस.पी. के माध्यम से जलापूर्ति स्वीकार नहीं हैं इसलिए जोड़ें नहीं जा सके। योजना के सभी भौतिक कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजना पर दिसम्बर, 2018 तक कुल राशि रु. 271.91 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.6 एकीकृत तारानगर –झुन्झुनू–सीकर–खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना:

जिला सीकर एवं झुन्झुनू का कुछ भाग आपणी योजना के द्वितीय चरण एवं फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ परियोजना के तहत नहरी जल से लाभांशित है। इन जिलों के शेष रहे क्षेत्रों को नहरी जल से लाभांशित किये जाने हेतु तारानगर स्थित साहवा लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन क्रमांक 5 से पानी लेकर लाभांशित करने की वृहद परियोजना अनु0 लागत रु. 3559



करोड़ की तैयार की गयी। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला झुन्झुनू के खेतड़ी, झुन्झुनू व मण्डावा क्षेत्र के कुल 5 शहरों एवं 258 ग्रामों को परियोजना के प्रथम चरण में लाभांशित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके प्रथम चरण की स्वीकृति 954.74 करोड़ रु. की पीपीसी 190/30.5.13 को जारी की गयी।

इस के पैकेज प्रथम जिसमें तारानगर से मलसीसर मुख्य हेडवर्क्स तक ट्रांसमिशन लाईन, फिल्टर प्लांट इत्यादि का कार्य सम्मिलित है, हेतु राशि रु. 588.33 करोड़ का कार्यादेश दि0 5.7.2013 को दिया गया है। योजना के द्वितीय पैकेज में तहसील खेतड़ी तथा तहसील झुन्झुनू के गांवों व शहरों को लाभांशित करने हेतु क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य लिया गया है। इस कार्य हेतु दिनांक 22.8.2013 को कुल राशि रु. 475.90 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है।

योजना पर जलापूर्ति सम्बन्धित सभी मुख्य कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना से लाभान्वित होने वाले सभी 5 कस्बों एवं 258 ग्रामों की कमिशनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 966.75 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.7 फतेहपुर—लक्ष्मणगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना :-

आईजीएनपी पर आधारित जिला सीकर के तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र के पेयजल समस्या के सतही स्रोत से स्थायी समाधान का विचार आपणी योजना द्वितीय चरण के साथ ही किया गया एवं फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ परियोजना तैयार की गयी। इस योजना हेतु स्रोत आपणी योजना के हैडवर्क्स धन्नासर को ही लिया गया है। इस परियोजना की राशि रु. 832 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी है। इस परियोजना से जिला सीकर के तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के 283 गांव एवं 3 शहरों को लाभान्वित किया जायेगा। इस परियोजना के कार्य 6 पैकेज में प्रगति पर है।

इस परियोजना के मुख्य कार्यों में स्वच्छ जल ट्रंक मेन धन्नासर से फतेहपुर वाया सरदारशहर एवं रतनगढ़ एवं फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, ग्रामों का क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य इत्यादि सम्मिलित है।

योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। योजना के माध्यम से लाभान्वित किये जाने वाले कस्बों एवं ग्रामों की कमिशनिंग का कार्य भी आरम्भ हो गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 673.34 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.8 बीसलपुर—दूदू—फुलेरा पेयजल परियोजना

इस पेयजल परियोजना की स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 145वीं बैठक दिनांक 04.06.2002 को जारी हुई थी। परियोजना की संशोधित स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की बैठक 178वीं दिनांक 11.10.2007 में राशि रु. 678.87 करोड़

की जारी हुई। इस योजना में आरक्षण के अनुरूप स्रोत बीसलपुर बांध लिया हुआ है। इस योजना में कुल 718 ग्राम एवं 2017 ढाणियां लाभान्वित करना प्रस्तावित है। इस योजना में कुल 9 शहर—टोडारायसिंह, मालपुरा, चाकसू, निवाई, नरैना, सांभर, फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ़ रेनवाल शामिल है। इस वृहद् परियोजना में 683 ग्राम तथा 1602 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा सभी 9 शहर यथा टोडारायसिंह, मालपुरा, चाकसू, निवाई, नरैणा, सांभर, फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ़ रेनवाल कस्बों को भी पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 तक योजना पर कुल रु. 593.90 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

12.8.1 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नाँवा तहसील (बीसलपुर—दूदू परियोजना से):

इस पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को राशि रु. 128.72 करोड़ जारी की गई थी। योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक राशि रु. 94.19 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं तथा लक्षित सभी 97 ग्रामों एवं 161 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

12.8.2 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना निवाई तथा टोंक तहसील (बीसलपुर—टोंक—उनियारा परियोजना से):

इस पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को राशि रु. 112.88 करोड़ जारी की गई थी। इस परियोजना में निवाई तहसील के 204 ग्रामों, टोंक तहसील के 8 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर माह



सार्वजनिक नल



मलिकपुरा उच्च जलाशय



निवाई पम्प हाउस

दिसम्बर 2018 तक राशि रु. 111.40 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं, तथा सभी 212 ग्रामों व 558 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

12.8.3 बीसलपुर-दूदू-फागी परियोजना (फागी कलस्टर):

इस पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 217.24 करोड़ की जारी की गई थी। इस परियोजना में फागी तहसील के 161 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक राशि रु. 164.26 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं तथा 118 ग्रामों व 85 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

12.8.4 बीसलपुर-दूदू-चाकसू परियोजना (चाकसू कलस्टर):

इस पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 254.45 करोड़ जारी की गई थी। इस परियोजना में चाकसू तहसील के 267 ग्रामों व फागी तहसील के 8 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक राशि रु. 216.14 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं तथा सभी 275 ग्रामों व 508 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा नियमित जलापूर्ति की जा रही है।



स्वच्छ जलाशय चाकसू

12.8.5 बीसलपुर-दूदू-बस्सी परियोजना (बस्सी कलस्टर):

पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 299.55 करोड़ जारी की गई थी। इस परियोजना में बस्सी तहसील के 210 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक राशि रु. 228.96 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं तथा सभी 210 ग्रामों व 1473 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

12.8.6 बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली पेयजल परियोजना

इस पेयजल परियोजना का स्रोत बीसलपुर बाँध है। इस योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 188 वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 में राशि रु. 542.11 करोड़ की जारी की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत टोंक जिले की टोंक तहसील के 106 ग्राम, उनियारा तहसील के 196 ग्राम एवं देवली तहसील के 134 ग्राम अर्थात् कुल 436 ग्राम एवं टोंक जिले के तीन शहरी क्षेत्र टोंक, देवली एवं उनियारा को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था। इनमें से माह दिसम्बर 2018 तक टोंक, देवली, व उनियारा कस्बे सहित 125 ग्राम व 144 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है।

परियोजना को कार्य की दृष्टि से तीन पैकेजों में विभक्त किया गया है जिन पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 423.33 करोड़ के व्यय किये जा चुके हैं। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

12.9 रेवा पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़

इस पेयजल परियोजना का स्रोत रेवा बाँध है। जिसमें पेयजल परियोजना हेतु 1.5 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है। योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 194वीं बैठक दिनांक 9.12.2014 द्वारा राशि

रुपये 66.29 करोड़ की जारी की गई हैं। योजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। योजना का कार्यादेश दिनांक 27.07.2008 को जारी किया गया था। योजना पर दिनांक दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 63.19 करोड़ व्यय हो चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ की तहसील झालरापाटन के 15 ग्राम एवं 2 ढाणी तहसील पचपहाड़ के 29 ग्राम एवं 10 ढाणी तथा तहसील पिडावा के 5 ग्रामों (कुल 49 ग्राम एवं 12 ढाणियों) को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। योजना 01.01.2015 से 5 वर्ष की संचालन एवं संधारण अवधि में चल रही है।

12.10 पिपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़

इस पेयजल योजना का स्रोत पिपलाद बाँध है। जिसमें पेयजल परियोजना हेतु 5.0 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 32.84 करोड़ जारी की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ की तहसील झालरापाटन के 14 ग्राम एवं शहरी योजना भवानीमण्डी एवं सुनेल कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था। योजना का कार्यादेश दिनांक 22.08.2013 को जारी किया गया था। योजना का कार्य 30.04.2017 को पूर्ण कर योजना को चालू किया जा चुका है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक रु. 27.74 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

12.11 बोरबास—मण्डाना पेयजल परियोजना, जिला कोटा

इस पेयजल परियोजना का स्रोत चम्बल नदी पर अकेलगढ़ है, जो कोटा नगर में स्थित है। इस पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 को राशि रु. 118.04 करोड़ की जारी हुई है। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला कोटा के 60 ग्राम एवं 21 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 14.09.2012 को जारी किये गये। योजना का कार्य वन्य जीव व वन विभाग की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 12 के चार लेन में परिवर्तित होने के कारण विलम्ब हुआ। योजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 68.97 करोड़ व्यय हो चुकी हैं। पेयजल योजना के अन्तर्गत 60 ग्राम एवं 21 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा चुका है।

12.12 भीमनी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़

इस पेयजल परियोजना का स्रोत भीमनी बाँध है। जिसमें पेयजल परियोजना हेतु 1.4 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है। इस पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 को राशि रु. 30.80 करोड़ की जारी हुई है। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 03.07.2012 को जारी किया गया था।

परियोजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं जिला झालावाड़ की तहसील पचपहाड़ के 30 ग्राम एवं 14 ढाणीयों में 1.12.2015 से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 25.12 करोड़ व्यय हो चुकी है। योजना 1.12.2015 से दस वर्ष की संचालन एवं संधारण अवधि में चल रही है।

12.13 माधवी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़

इस पेयजल परियोजना का स्रोत माधवी बाँध है। जिसमें पेयजल परियोजना हेतु 1.08 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है। इस पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 को राशि रु. 30.87 करोड़ की जारी हुई है। योजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 09.07.2012 को जारी किया गया था।

परियोजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं इस परियोजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ की तहसील गंगधार के 32 ग्राम एवं 3 ढाणियों में 1.01.2016 से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 22.29 करोड़ व्यय हो चुकी है। योजना 1.01.2016 से दस वर्ष संचालन एवं संधारण अवधि में चल रही है।

12.14 चम्बल—बून्दी पेयजल परियोजना, जिला बून्दी

इस पेयजल परियोजना का स्रोत चम्बल नदी पर कोटा बैराज है। बून्दी शहर एवं मार्गस्थ 19 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु “चम्बल—बून्दी पेयजल परियोजना” की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को राशि रु. 74.37 करोड़ जारी की गई। परियोजना के कार्यआदेश दिनांक 13.02.13 को जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर 2018 तक योजना पर राशि रुपये 50.21 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना से बून्दी शहर को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

12.14.1 क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन चम्बल—बून्दी पेयजल परियोजना, जिला बून्दी

इस पेयजल परियोजना का स्रोत चम्बल नदी पर कोटा बैराज है। बून्दी एवं तालेड़ा तहसील के 19 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु “क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन चम्बल—बून्दी पेयजल परियोजना” की तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की 624वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 राशि रुपये 15.84 करोड़ जारी की गई। परियोजना के कार्यआदेश दिनांक 18.04.16 को जारी किये जा चुके हैं। माह अप्रैल, 2018 तक योजना पर राशि रुपये 434.44 लाख व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना का लगभग 38 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य की अत्यधिक धीमी प्रगति के कारण वित्त समिति की 729वीं बैठक दिनांक 13.09.2017 में लिये गये निर्णय की



अनुपालना में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, क्षेत्र कोटा के आदेश क्रमांक 8612-22 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा कार्य रिसाईन्ड किया गया एवं बकाया कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु पूर्व संवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से स्टे ले लिया था जिससे निविदा का कार्य रुक गया। कोर्ट केस में दिनांक 30.07.2018 को पैरवी के बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया था। दिनांक 31.08.2018 को हुए निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा मेसर्स डीम कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

12.14.2 चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना जिला बून्दी

इस पेयजल परियोजना का स्रोत चाकन नदी पर चाकन बांध है। इन्द्रगढ़ एवं सुमेरगंजमडी शहर एवं 45 ग्रामों व 6 मजरो को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी. पी.सी. की बैठक 199वीं दिनांक 28.06.2017 को राशि रु. 73.39 करोड़ जारी की गई। परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 22.11.17 को जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर 2018 तक योजना पर राशि रुपये 42.12 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत हो चुकी है। योजना के पूर्ण होने निर्धारित तिथि 01.06.2019 है।

12.14.3 बून्दी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) जिला बून्दी

इस पेयजल परियोजना का स्रोत चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना है। तालेडा तहसील के 34 ग्रामों व 25 मजरो को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु बून्दी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक 199वीं दिनांक 28.06.2017 को राशि रु. 182.86 करोड़ जारी



की गई। परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 22.11.17 को जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर 2018 तक योजना पर राशि रुपये 35.61 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना की भौतिक प्रगति 52 प्रतिशत हो चुकी है। योजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 01.12.2019 है।

12.15 गागरीन पेयजल परियोजना जिला झालावाड़

इस पेयजल परियोजना का स्रोत गागरीन बांध है जिसमें पेयजल हेतु 10.0 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है। परियोजना की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 256.56 करोड़ जारी की गई एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 192 वीं बैठक दिनांक 28.07.14 द्वारा राशि रुपये 351.48 करोड़ की जारी की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ की तहसील गंगधार के 140 ग्राम एवं 28 ढाणी, पचपहाड़ तहसील के 5 ग्राम, पिडावा तहसील के 170 ग्राम एवं 8 ढाणियां (कुल 315 ग्राम एवं 36 ढाणियां) को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 22.08.2013 को जारी किया गया था। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु. 256.12 करोड़ व्यय हो चुकी है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं लगभग 82 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 तक 298 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

12.16 सायगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बारां

इस पेयजल योजना का स्रोत पार्वती नदी में सायगढ़ देह पर

एनीकट है। इस योजना की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 69.76 करोड़ जारी की गई थी। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 25.04.2016 द्वारा राशि रु. 76.76 करोड़ की प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अन्ता के 35 गांव एवं 15 ढाणी एवं विधानसभा क्षेत्र बारां के 15 गांव एवं 1 ढाणी (कुल 50 ग्राम एवं 16 ढाणियां) को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना द्वारा वर्ष 2001 की गणनानुसार 51925 तथा वर्ष 2045 की अभिकल्पित 112872 ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 14.08.2013 को जारी किये गये थे। परियोजना के कार्य की प्रगति धीमी होने के फलस्वरूप वित्तीय समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08.10.2014 में परियोजना के शेष कार्यों को संवेदक मैसर्स श्रीराम ई.पी.सी. लिमिटेड चैन्नई की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कराने का निर्णय लिया गया है। कार्यादेश को रिसाईन्ड किया जाकर नई निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई।

परियोजना के शेष कार्यों के क्रियान्वन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2017 को फर्म मैसर्स डारा कंस्ट्रक्शन कम्पनी जोधपुर को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। दिसम्बर तक योजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कुल राशि रु. 50.70 करोड़ व्यय हो चुकी है। परियोजना का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 19.11.2019 है।

12.17 नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा पेयजल परियोजना, जिला बारां

इस पेयजल योजना का स्रोत कालीसिन्ध नदी में बादल देह पर एनीकट है। परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 188 वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को राशि रु. 79.98 करोड़ जारी की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला बारां के 42 ग्राम, 8 ढाणी एवं अन्ता शहर को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिए एनीकट निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को 15.19 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। एनीकट का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग पूर्ण कर दिया गया है।

परियोजना के कार्य आदेश दिनांक 14.09.2012 को जारी किये जा चुके हैं। मैसर्स श्री राम ई.पी.सी. लि. चैन्नई द्वारा कार्य को मैसर्स बिहानी कन्स्ट्रक्शन जयपुर को दिनांक 25.05.2016 को सबलेट किया गया एवं लगभग 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। परियोजना से प्रस्तावित सभी 42 गांव

एवं 8 ढाणियों व अन्ता शहर को पेयजल से लाभान्वित कर दिया है। योजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल राशि 72.81 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

12.18 पेयजल परियोजना अटरू-शेरगढ़, जिला बारां

बारां जिले (तहसील अटरू) के 26 गांव, 7 मजरे एवं 3 कस्बों अटरू, खेडलीगंज, कवाई को सम्मिलित करते हुए परवन नदी पर स्थित शेरगढ़ देह से परियोजना प्रस्तावित की गयी है। इस योजना से वर्ष 2011 की गणनानुसार 54204 तथा अभिकल्पित आबादी वर्ष 2049 के अनुसार 1,07,278 आबादी लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. 197 दिनांक 25.04.2016 में राशि रु. 89.69 करोड़ की प्राप्त हो चुकी है।

योजना का कार्यादेश दिनांक 24.03.2017 को जारी किया जा चुका है। फर्म द्वारा परियोजना का कार्य शुरू किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 तक योजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें इन्टेक वैल, फिल्टर प्लान्ट, पम्प हाउस, 09 उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय राईजिंग मैन, डिस्ट्रिब्यूशन मैन का कार्य प्रगति पर है, एवं कुल राशि 53.70 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

परियोजना का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 01.04.2019 है। परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से लगभग 1 वर्ष पूर्व ही, माह अप्रैल 2018 में शेरगढ़ देह से पानी लेकर अटरू स्थित प्रेशर फिल्टर से जल शोधन कर अटरू, खेडलीगंज व रतनपुरा को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

12.19 सोनवा पेयजल परियोजना

बारां जिले के विधानसभा क्षेत्र अन्ता के 47 ग्राम एवं 07 मजरे (तहसील अन्ता के 17 ग्राम एवं 04 मजरे तथा तहसील मांगरोल के 30 ग्राम एवं 03 मजरे) को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किये जाने हेतु ग्राम सोनवा के निकट कालीसिन्ध नदी में स्थित सोनवा देह पर प्रस्तावित एनीकट को स्रोत लेकर सोनवा पेयजल परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 68255 व अभिकल्पित 2048 की 132679 ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.05.2017 को राशि रु. 105.15 करोड़ जारी की गई है। योजना के अंतर्गत एनीकट निर्माण की राशि 12 करोड़ रुपये ली गई हैं। एनीकट निर्माण कार्य जलसंसाधन विभाग द्वारा पूर्ण कर दिया गया है।

दिनांक 09.12.2017 को फर्म को कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की अवधि 30 माह निर्धारित की गई है। दिसम्बर 2018 तक योजना का लगभग 20.00 प्रतिशत

कार्य पूर्ण हो चुका है, कुल राशि 26.82 करोड़ खर्च हो चुके हैं। परियोजना का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी 18.06.2020 है।

12.20 कछावन पेयजल परियोजना, जिला बारां

तहसील छबड़ा के ग्राम कछावन के निकट पार्वती नदी पर स्थित प्राकृतिक देह से छबड़ा तहसील के 16 गांव एवं 3 ढाणीयों की पेयजल परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10080 व अभिकल्पित 2051 की 20680 ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत एनीकट की राशि 24.79 करोड़ रुपये ली गई हैं।

योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 747 वी बैठक दिनांक 03.08.2018 द्वारा राशि रु. 50.76 करोड़ की जारी की गई है। निविदा आमन्त्रित कर तकनीकी बिड 04.10.2018 को खोल दी गई है स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

12.21 परवन पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़, बारां, कोटा

परवन बांध आधारित परवन पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक स्वीकृति पीपीसी की 201 वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय समिति की 740 वी बैठक दिनांक 14.03.2018 को राशि रु. 220.05 करोड़ जारी की गई। परियोजना से कोटा जिले के 369 ग्राम बारां जिले के 934 ग्राम एवं 01 शहर (बारां) एवं झालावाड़ जिले के 309 ग्राम (कुल 1621 ग्राम एवं 01 शहर) को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था।

परियोजनान्तर्गत प्रथम फेज में जल संसाधन विभाग को जन स्वा. अभि. विभाग के लिए पेयजल हेतु जल आरक्षण की हिस्सा राशि का भुगतान, इन्टैक वैल निर्माण एवं डिटेल सर्वे कर, सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है।

परियोजना के सर्वे कार्य एवं विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट बनाने के कार्य हेतु मैसर्स वैपकास लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 18.09.2018 को दिया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी 27.07.2019 है।

12.22 पेयजल परियोजना राजगढ़ :-

यह योजना झालावाड़ जिले की पचपहाड़ तहसील के कुल 54 ग्रामों एवं 15 ढाणियों में जलापूर्ति हेतु तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में रामगंजमण्डी-पचपहाड़ योजना से लाभान्वित 38 ग्रामों एवं 07 ढाणियों तथा 16 नये ग्रामों एवं 08 ढाणियों को राजगढ़ बांध से पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के माध्यम से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 55885 एवं अभिकल्पित वर्ष 2048 के अनुसार 108272 ग्रामीण आबादी को लाभान्वित

किया जावेगा। योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 196 वी बैठक दिनांक 20.10.2015 में राशि रु 67.17 करोड़ की जारी की गई एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 746 वीं बैठक दिनांक 13.07.18 में राशि रु 149.31 करोड़ की जारी की गई। योजना की क्रियान्विति 3 पैकेज में करना प्रस्तावित है।

इनमें से पैकेज 1 के तहत जलसंसाधन विभाग को बांध की संपूर्ण हिस्सा राशि रु 97.18 करोड़ जमा कराया जा चुके है। पैकेज 2 के तहत इंटैक निर्माण का प्रावधान लिया गया था, जिसके अन्तर्गत 30.11.2018 तक राशि रु. 2.15 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज 3 के तहत पेयजल पेयजल परियोजना की ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। इस हेतु कार्यादेश दिनांक 03.07.2012 को जारी किया गया था एवं 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा परियोजना से विधानसभा क्षेत्र डग के 49 ग्राम एवं 15 ढाणियों को लाभान्वित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

परियोजना पर दिसम्बर .2018 तक कुल राशि रु 126.33 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

12.23.1 नर्मदा नहर ट्रांसमिशन मेन-1 (एफ.आर) आर.डी. 44.22 बागोडा-जालोर-आहोर

नर्मदा नहर से जालोर जिले के 281 गांव एवं जालोर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 168 वीं बैठक दिनांक 20.03.06 को रु. 243.88 करोड़ की जारी की गई तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 09.12.2014 को राशि 380.17 करोड़ की जारी की गई।

परियोजना की तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की 431 वीं बैठक दिनांक 20.12.2006 को रु0 233.30 करोड़ की जारी की गई। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य एकल बिन्दु दायित्व के तहत करवाये जाने हेतु मैसर्स आई.वी.आर. सी.एल. हैदराबाद को रु. 310.12 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 02.08.2007 को जारी किया गया तथा कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित दिनांक 12.02.2009 थी। तैतरोल हेड-वर्क्स हेतु भूमि आवंटन में देरी होने के कारण एवं साइट पर भूजल की समस्या उत्पन्न होने के कारण कार्य वित्त समिति की बैठक संख्या 648वी दिनांक 14.06.2013 द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिनांक 31.08.2013 तक आगे बढ़ाई गई। परन्तु वर्तमान में भी योजना पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 348.74 करोड़ किया जा चुके है।

12.23.2 नर्मदा (एफ. आर.) क्लस्टर परियोजना :-

नर्मदा एफ.आर. परियोजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त 281 गाँवों में से 267 गाँवों को क्लस्टर परियोजना (द्वितीय चरण) से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी.ति नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.9.13 में रु. 509.20 करोड़ की जारी की गई जिसके अन्तर्गत रु. 525.40 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 01.10.2013 को जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 249.04 करोड़ किया जा चुके है।

12.23.3 नर्मदा नहर से जालौर शहर की पेयजल योजना :-

नर्मदा एफ.आर. परियोजना के कार्य पूर्ण होने के साथ-साथ जालौर शहर को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को रु 62.20 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के कार्य को 3 पैकेजों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत एफ.आर. परियोजना के उम्मेदाबाद हैडवर्क्स से (1)जालौर तक पाइप लाइन का कार्य, (2) जालौर शहर की पेयजल वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण तथा (3) उम्मेदाबाद हैडवर्क्स से ही 14 गाँवों की क्लस्टर योजना। उक्त तीनों पैकेजों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं माह दिसम्बर 2018 तक 58.14 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

12.23.4 नर्मदा (डी.आर.) परियोजना-सांचौर-रानीवाड़ा कलां-जसवंतपुरा (ट्रांसमिशन)

जालौर जिले के 138 गाँवों की मांग एवं सांचौर शहर को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की आधारभूत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 218.34 करोड़ की पी.पीसी. 188/24.8.12 में जारी की गई। कार्यादेश दिनांक 08.02.2013 को रु. 135.85 करोड़ के जारी किये गये। वर्तमान में योजना पर कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 127.23 करोड़ किया जा चुके हैं।

12.23.5 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना :-

जालौर जिले के समस्याग्रस्त 138 गाँवों को नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना (द्वितीय चरण) से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को रु. 263.50 करोड़ की जारी की गई। परियोजना का कार्य एकल दायित्व के आधार पर कार्यादेश दिनांक 1.10.2013 को रु. 255.00 करोड़ के जारी किया गये है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 123.49 करोड़ किया जा चुके है।

12.23.6 नर्मदा (ई.आर.) ट्रांसमिशन मेन परियोजना

जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की नर्मदा ई.आर. आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को रु. 455.16 करोड़ की जारी की गई। परियोजना का कार्य एकल



फिल्टर प्लांट पालारी सौलकिंया

दायित्व के आधार पर कार्यादेश दिनांक 24.09.2013 को रु. 372.70 करोड़ जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 213.75 करोड़ किया जा चुके है।

उक्त परियोजना को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 30.06.2019 है।

12.23.7 नर्मदा गुडामलानी पेयजल परियोजना (एच.आर.)

बाडमेर जिले के 177 गाँवों (जनगणना 2001) के लिये पेयजल हेतु आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को रु. 160 करोड़ की जारी की गई। एकल दायित्व के तहत योजना की क्रियान्विति हेतु निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश मैसर्स गैमन इण्डिया को रु.121.48 करोड़ का दिनांक 25.3.2013 को जारी किया गया।

परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 101.05 करोड़ किया जा चुके है।

12.23.8 बाडमेर जिले की शिव एवं रामसर तहसील की नर्मदा आधारित पेयजल परियोजना

बाडमेर जिले के कुल 205 गाँवों को नर्मदा नहर से पेयजल



राजीव नगर स्वच्छ जलाशय

उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत परियोजना में शिव तहसील के 110 गांव एवं रामसर तहसील के 95 गांव सम्मिलित हैं। उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 में रु. 610.79 करोड़ की जारी कर रु. 639.50 करोड़ का कार्यादेश मैसर्स एन.सी.सी.एल को दिनांक 1.10.13 को जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 249.86 करोड़ किया जा चुके हैं।

12.24 इन्दिरा गांधी मुख्य नहर पर आधारित विभिन्न पेयजल परियोजनाएं

12.24.1 बाडमेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण

बाडमेर जिले के 529 गांवों एवं जैसलमेर जिले के 162 गांवों कुल 691 गांवों एवं बाडमेर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत परियोजना की स्वीकृति दिनांक 01.02.2007 को राशि 688.66 करोड़ की जारी की गई। परियोजना का कार्य 2 पैकेजों में एकल दायित्व के आधार पर कार्यादेश मैसर्स एल एण्ड टी को दिनांक 31.03.2008 को क्रमशः रु. 265 करोड़ एवं रु. 370 करोड़ का जारी किया गया। परियोजना का कार्य दिनांक 31.03.2013 को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में संचालन एवं संधारण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु 726.16 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.24.2 बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-अ (भाडका-चोखला-बांदरा-ईस्ट परियोजना)

बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट अ (भाडका, चोखला, बांदरा, ईस्ट परियोजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 187 दिनांक 27.09.11 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 202.36 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत बाडमेर तहसील के 40 गांव, बायतु तहसील के 128 गांव एवं पचपदरा तहसील के 3 गांव, कुल 171 गांव शामिल हैं। इस कार्य हेतु कार्यादेश रु. 168.00 करोड़ का दिनांक 23.8.2012 को जारी किये गये थे। परियोजना पर अब तक कुल रूपये 66.87 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। परियोजना के 86 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने के कारण वित्तीय समिति की 737वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 की अनुपालना में मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा दिनांक 24.01.2018 को निरस्त कर दिया गया। शेष रहे कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

12.24.3 बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-ब (बाडमेर-रावतसर-खरन्टिया परियोजना)

बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट ब (बाडमेर-रावतसर-खरन्टिया परियोजना) की प्रशासनिक

एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 188 दिनांक 24.08.12 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 125 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत बाडमेर तहसील के 50 गांव एवं बायतु तहसील के 17 गांव, कुल 67 गांव शामिल हैं। कार्य का कार्यादेश रु. 128.07 करोड़ का दिनांक 16.05.2013 को जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल रूपये 79.19 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इस परियोजना के 55 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

12.24.4 बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-स (केकेडी-शिव-भाडका-बाडमेर)

बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट-स (केकेडी-शिव-भाडका-बाडमेर) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 191 दिनांक 19.09.13 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 700 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत शिव तहसील के 132, रामसर तहसील के 30 रामसर, बाडमेर तहसील के 121 बाडमेर एवं बायतु तहसील के 3 गांव, कुल 286 गांव शामिल हैं। कार्य का कार्यादेश रु. 595.34 करोड़ का दिनांक 24.01.17 को जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल रूपये 134.49 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.24.5 बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-द (बीकेजी-देवीकोट-सांगड-फतेहगढ परियोजना)

बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट द (बीकेजी-देवीकोट-सांगड-फतेहगढ परियोजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 191 दिनांक 23.09.13 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 451.27 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत जैसलमेर तहसील के 61 गांव फतेहगढ तहसील के 104 गांव एवं पोरण तहसील के 6 गांव, कुल 171 गांव शामिल हैं। कार्य का कार्यादेश रु. 430.55 करोड़ का दिनांक 02.05.2016 को जारी किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल रूपये 255.05 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.25 पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना

बाडमेर जिले के 386 गांवों एवं जैसलमेर जिले के 177 गांवों (कुल 563 गांवों) एवं 3 शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना पी.पी.सी बैठक दिनांक 29.03.2005 को राशि 1084.83 करोड़ की स्वीकृति की गई। जिसे कालान्तर में पी.पी.सी बैठक दिनांक 27.09.2011 में 1454.20 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के कार्यों को 7 पैकेजों में विभक्त किया गया था जिसमें से प्रथम पैकेज के अन्तर्गत नाचना से बीलिया तक के आधारभूत कार्य पूर्ण किये जा चुके

हैं। शेष 6 पैकेजों के कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 1513.43 करोड व्यय किये जा चुके हैं।

वर्तमान में परियोजना द्वारा कुल स्वीकृत 3 कस्बे एवं 586 गांवों में से 2 कस्बे क्रमशः पोंकरण एवं बालोतरा एवं 168 गांवों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिन्हें माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

12.26 राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जोधपुर पर आधारित वृहद् परियोजना

12.26.1 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना कानसिंह की सीड-खिदरत-मण्डोर

जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के 16 ग्राम को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 35.00) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एस.एल.एस.एस.सी. की 8वीं बैठक दिनांक 05.09.2012 को रु. 36.02 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर रु. 27.82 करोड का कार्यदेश मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया जोधपुर को दिनांक 25.03.2013 को जारी किया गया, जिसमें कार्य आरंभ एवं पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 04.04.13 एवं 03.04.15 थी। परियोजना के सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। योजना के सभी 16 ग्रामों की वर्तमान में लगभग 25,522 आबादी को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।



हैड वर्क्स लुम्बानिया

परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 28.08 करोड व्यय किया जा चुका है।

12.26.2 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना घटोर-कानासर-बाप

जोधपुर जिले की बाप तहसील के 25 ग्राम को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 42.00) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को रु. 88.95 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। रु. 76.64 करोड का कार्यदेश मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया को दिनांक 18.09.2013 को जारी

किया गया जिसमें कार्य आरंभ एवं पूर्ण किये जाने की तिथियां क्रमशः 28.09.13 एवं 27.09.16 थी। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 68.90 करोड व्यय किया जा चुका है। परियोजना के सभी 25 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके द्वारा 25 ग्रामों की 48168 आबादी लाभान्वित हो रही है।

12.26.3 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बावडीकला-खारा-जालोडा

जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के 43 ग्राम को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 67.90) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को रु. 120.81 करोड की प्रशासनिक



हैड वर्क्स बावडी कलां खेडा जालौरा

एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर रु. 124.51 करोड का कार्यदेश मैसर्स जी.के.सी को दिनांक 18.09.2013 को जारी किया गया जिसमें कार्य आरंभ एवं पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 28.09.13 एवं 27.09.16 थी। योजना के अंतर्गत फलौदी के समीप शिवसर में भूमि आवंटन में विलम्ब के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। परियोजना का कार्य माह अक्टूबर 2017 को पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 115.80 करोड व्यय किया जा चुका है। परियोजना के सभी 43 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके द्वारा 43 ग्रामों की 97268 आबादी लाभान्वित हो रही है।

12.26.4 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मलार-जोड-हिन्डालगोल

जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के 10 ग्राम को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 67.90) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एस.एल.एस.एस.सी. की 8वीं बैठक दिनांक 05.09.2012 को रु. 35.97 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर रु. 25.79 करोड का कार्यदेश मैसर्स डारा कन्सल्टेशन को दिनांक 20.05.2013 को जारी किया गया जिसमें कार्य आरंभ एवं पूर्ण किये

जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 30.05.2013 एवं 24.01.16 थी। वर्तमान में फिल्टर बेड कमिशन कर योजना के समस्त 10 ग्रामों की 12,797 आबादी को लाभान्वित कर दिया गया है। परियोजना का कार्य माह अप्रैल 2016 को पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 24.23 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना के सभी 10 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके द्वारा 10 ग्रामों की 12797 आबादी लाभान्वित हो रही है।

12.26.5 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना पीलवा-सदरी-जम्मेश्वरनगर

जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के 15 ग्रामों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 111.0) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18.06.2013 को रु. 63.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर उक्त कार्य को एकल दायित्व आधार पर निष्पादन करने हेतु कार्यदेश मैसर्स देवेन्द्र कन्सल्ट्रक्शन को दिनांक 24.09.2013 को रु. 48.60 करोड़ का जारी किया गया जिसमें कार्य आरंभ एवं पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 03.10.2013 एवं 02.10.16 थी। परियोजना का कार्य माह दिसम्बर 2017 को पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 43.76 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना के सभी 15 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके द्वारा 15 ग्रामों की 55229 आबादी लाभान्वित हो रही है।

12.26.6 देवानिया-नाथराउ-शेरगढ-चाबा परियोजना

जोधपुर जिले की शेरगढ तहसील के 264 गांवों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी.134.00) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत पी.पी.सी की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 को रु. 234.46 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। परियोजना के पैकेज प्रथम के अन्तर्गत अब तक कुल 35 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। पैकेज प्रथम के शेष बचे गांवों को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 24.04.2013 को रु. 47.47 करोड़ का कार्यदेश मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया को दिया जा चुका है। कार्यदेश के अनुसार कार्य दिनांक 03.05.2014 को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। यह कार्य मार्च 2016 में पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना के पैकेज द्वितीय के अन्तर्गत 195 गांवों को लाभान्वित किये जाने हेतु दिनांक 10.08.2011 को रु.137.73 करोड़ का कार्यदेश मैसर्स आईओटी को दिया जा चुका है। योजना के सभी 284 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 203.41 करोड़ का किया जा चुका है। परियोजना के सभी 284 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके द्वारा 284 ग्रामों की

77492 आबादी लाभान्वित हो रही है।

12.26.7 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना खुडियाली-जियाबेरी-आगोलाई पार्ट-2

जोधपुर जिले की शेरगढ तहसील के 77 गांवों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 159.50) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी की बैठक दिनांक 01.02.2007 को रुपये 74.38 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जिसकी तकनीकी स्वीकृति 09.07.2007 को 57.41 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को विभिन्न पैकेजों में विभाजित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। परियोजना से 77 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 76.98 करोड़ रु. किया जा चुका है।

12.26.8 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना पांचला-धेवडा-चिराई

जोधपुर जिले की औंसिया तहसील के 59 ग्राम एवं उनकी 892 ढाणियों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 159.150) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी की 190 वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को रु. 396.63 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। रु. 379.97 करोड़ का कार्यदेश मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल हैदराबाद को दिनांक 04.10.2013 को जारी किया गया। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 293.31 करोड़ किया जा चुका है। योजना के 13 ग्रामों एवं 129 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। परियोजना को मार्च, 2019 तक पूर्ण करना लक्षित है। योजना पूर्ण होने पर 59 ग्रामों एवं उनकी 892 ढाणियों की 197571 आबादी लाभान्वित होगी।

12.26.9 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना तिंवरी-मथानिया-औंसिया-बावडी-भोपालगढ

जोधपुर जिले की औंसिया तहसील के 47 एवं भोपालगढ तहसील के 66 अर्थात् कुल 113 गांवों एवं उनकी 950 ढाणियां



जल शोधन संयंत्र तिंवरी मथानियां



ियों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 177.50) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी की 182वीं बैठक दिनांक 20.02.2010 को रु. 430.06 करोड की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। परियोजना पर दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय 356.10 करोड रु. किया जा चुका है। योजना के सभी 113 ग्रामों एवं 950 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है।

12.26.10 इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा

जोधपुर जिले के 2 शहरों (पीपाड एवं बिलाडा) एवं 119 गांवों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर (आर.डी. 191.800) से सतही जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.सी



की बैठक 172 वीं बैठक दिनांक 17.08.2006 को रुपये 308.00 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 323.56 करोड किया जा चुका है। परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

12.26.11 उम्मेदसागर -धवा-समदडी खण्डप पार्ट-III परियोजना

क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना उम्मेदसागर-धवा-समदडी-खण्डप पार्ट-III की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.9.2011 के द्वारा अनुमानित लागत रु.



575.46 करोड की स्वी.ति की गई। योजना के तहत बाड़मेर के 180 गांवों एवं समदडी शहर को राजीव गांधी नहरी पेयजल (जोधपुर शहर) से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना हेतु वर्ष 2044 की जल मांग 46.7 एम.एल.डी. हैं। कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 405.95 करोड का किया जा चुका है।

12.26.12 ए.एफ.डी द्वारा वित्त पोषित पुनःगठित जल प्रदाय योजना

जोधपुर शहर एवं इसके आस - पास के नवविकसित क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए पुनःगठित शहरी जल प्रदाय योजना जोधपुर की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति विभाग की 190 वी नीति निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 30.05.2013 को राशि

रूपये 740.50 करोड की गई। योजना फ्रांसिसी वित्त सहायता से वित्त पोषित है। फ्रांसिसी प्रथम ऋण करार दिनांक 02.02.2012 को हुआ। शेष कार्य हेतु फेस-II का ऋण करार 19.07.2013 को हुआ। योजना के विभिन्न पैकेजों का कार्य प्रगति पर है एवं आकलित पूर्णता 2020-21 है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 463.87 करोड का किया जा चुका है।

12.27 जवाई पाइप लाइन परियोजना पाली

इस परियोजना का स्रोत जवाई बांध एवं हेमावास बांध है। परियोजना द्वारा पाली जिले के पूर्व में नहरी पानी से लाभान्वित 7 नगर एवं 235 गाँव तथा परियोजना के फलस्वरूप जल बचत से अतिरिक्त 3 नगर एवं 326 गाँव लाभान्वित होंगे। फेज प्रथम में आधारभूत संरचना के कार्य पूर्ण करना एवं फेज द्वितीय में अतिरिक्त जोड़े जाने वाले ग्रामों/नगरों को क्लस्टर योजना से लाभान्वित करने का कार्य प्रस्तावित है।

12.27.1 फेज-प्रथम (आधारभूत परियोजना)

परियोजना की स्वीकृति पी.पी.सी. की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 में राशि रु. 634.79 करोड की जारी हुई थी। योजना के कार्यों को 5 पैकेज में विभक्त किया गया था। पैकेज-1 बाँध के डेड स्टोरेज से पम्पिंग करने से संबंधित है। पैकेज संख्या 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत जवाई बांध से पाली-रोहट-सोजत तक पाइपलाइन बिछाकर उपयोग में ली जा रही है। योजना के पैकेज 5 के अन्तर्गत सोजत से चंडावल, रायपुर, बर, जैतारण, आनन्दपुरकालू पाइप लाइन का कार्य क्लस्टर योजना तृतीय के साथ प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 427.95 करोड का किया जा चुका है।

12.27.2 फेज-द्वितीय (क्लस्टर परियोजना)

शेष चिन्हित अतिरिक्त 326 गांवों एवं 3 नगर क्रमशः तख्तगढ़, मारवाड़ जंक्शन व जैतारण को परियोजना के फेज-द्वितीय में क्लस्टर योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जाना है। जवाई क्लस्टर के भाग प्रथम की स्वीकृति पी.पी.सी. 187/27.9.11 में राशि रु. 199.40 करोड की जारी हुई थी।



आरोली जल शोधन संयंत्र

योजना के भाग द्वारा 111 गांव एवं तख्तगढ़ शहर को नवम्बर 2015 में लाभान्वित कर दिया गया है। योजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 13 दिसम्बर 2015 को कर दिया गया है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 146.99 करोड का किया जा चुका है। जवाई क्लस्टर परियोजना फेज द्वितीय (भाग द्वितीय पैकेज II) की स्वीकृति पी.पी.सी. 190/30.5.13 में क्रमशः राशि रु. 152.46 करोड व 214.50 करोड कुल रु. 366.96 करोड की जारी हुई। एकल दायित्व पर दोनों योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 290.08 करोड का किया जा चुका है।

12.28 चम्बल भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना—प्रथम चरण

चम्बल भीलवाड़ा परियोजना प्रथम चरण—चम्बल—भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की दिनांक 24.08.2009 को आयोजित 181वीं बैठक में राशि रु. 1,020.00 करोड की जारी की गई। वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 से राशि रु. 727.99 करोड की जारी की गई एवं संशोधित स्वीकृति 199 वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 से राशि रु 913.80 करोड की जारी की गई।

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के 9 कस्बे एवं 1,688 ग्रामों तथा बूंदी जिले के 23 ग्रामों की पेयजल मांग के लिए इन्टेक पम्पिंग स्टेशन, ट्रान्समिशन मेन पाइप लाइन एवं 245 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र (फिल्टर प्लांट) से संबंधित कार्य का प्रावधान है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सभी कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। सभी पैकेज के अधिकांश कार्य पूर्ण कर, भीलवाड़ा शहर में दिनांक 07.11.2016 से चम्बल का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 776.88 करोड का किया जा चुका है।

12.28.1 चम्बल भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना—द्वितीय चरण

चम्बल—भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 में राशि रु. 1,495.68



इनटेक वेल भैसरोडगढ़



करोड़ की जारी की गई। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के 8 कस्बे एवं 1,688 ग्रामों हेतु क्लस्टर प्रणाली तथा बूंदी जिले के 23 ग्रामों की पेयजल मांग का प्रावधान है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत सभी 8 क्लस्टर कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, वर्तमान में सभी क्लस्टर पैकेजों का कार्य प्रगतिरत है। पैकेज प्रथम आसीन्द कस्बा एवं 158 ग्राम, पैकेज द्वितीय माण्डल कस्बा एवं सभी 188 ग्राम, पैकेज पंचम् शाहपुरा कस्बा एवं सभी 150 ग्राम तथा पैकेज षष्ठम् के सभी 150 ग्रामों को चम्बल नदी के स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय रु. 1242.77 करोड़ का किया जा चुका है।

12.29 पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना किशनगढ़ जिला अजमेर भाग प्रथम

किशनगढ़ शहर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु किशनगढ़ शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना (लागत रुपये 185.20 करोड़) को स्वीकृत की गई। पुनर्गठित शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ़ के प्रथम भाग ट्रांसमिशन मेन पाइप लाइन व संबंधित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. 196 दिनांक 20.10.2015 राशि रु. 77.29 करोड़ जारी की गई। कार्य की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी



समिति की 621वी बैठक दिनांक 23.07.2015 में राशि रु. 74.94 करोड़ की जारी की गई।

योजना के प्रथम भाग के सभी कार्य पूर्ण कर किशनगढ़ शहर को पेयजल निरन्तर उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिसम्बर 2018 तक योजना के विरुद्ध राशि रु. 55.31 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.30 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ब्यावर, जवाजा –पंचायत समिति जवाजा

पंचायत समिति जवाजा, तहसील ब्यावर के 199 ग्रामों एवं 390 ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण समिति की बैठक 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 से राशि रु. 231.46 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। परियोजनांतर्गत कार्यों का कार्यादेश जारी कर वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। माह नवम्बर, 2018 तक 78 ग्राम 66 ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। दिसम्बर 2018 तक योजना के विरुद्ध राशि रु. 176.63 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.30.1 नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना –प्रथम चरण

नागौर जिले को इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने





फिल्टर प्लांट एवं इनटैकवेल सुखानियां बांध

हेतु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल के अन्तिम छोर की पम्पिंग स्टेशन संख्या-5 पर 200 क्यूसेक पानी का आरक्षण किया गया है। नागौर लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की दिनांक 07.08.06 को आयोजित 171वीं बैठक में राशि रु. 761.01 करोड़ की जारी की गई जिसके अन्तर्गत नागौर जिले के 494 गांवों एवं 5 कस्बों (नागौर, बासनी, मेड़ता, मूण्डवा एवं कुचेरा) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के कार्यों को 4 पैकेजों में विभक्त किया गया है। मुख्य आधारभूत ढांचे के निर्माण से सम्बन्धित प्रथम पैकेज एवं क्लस्टर वितरण प्रणाली से सम्बन्धित पैकेज द्वितीय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा नागौर, बासनी, मूण्डवा, कुचेरा एवं मेड़ता शहर एवं पैकेज द्वितीय के तहत 270 लाभान्वित गांवों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पैकेज संख्या -3 का कार्य 94 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है व शेष कार्य प्रगतिरत हैं। पैकेज संख्या 4 का कार्यदेश निरस्त कर शेष बचे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु माह मई 2018 में कार्यदेश जारी किया जा चुका है। कार्य मई 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। माह दिसम्बर 2018 तक परियोजना पर

कुल रु. 942.55 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

12.30.2-नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना- द्वितीय चरण)

राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोराईड निराकरण परियोजना नागौर

राज्य सरकार द्वारा फेज द्वितीय के कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से जापान सरकार की ऋण प्रदाय एजेन्सी “जायका” से राशि रु. 2,212 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। तत्पश्चात् प्रस्तावित योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी.ति विभाग की नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 188 दिनांक 24.08.2012 से राशि रु. 2,938.00 करोड़ (“जायका” से राशि रु. 2,212 करोड़, भारत सरकार से राशि रु.339 करोड़ एवं राज्य सरकार से राशि रु. 387 करोड़) की जारी की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत नागौर जिले के 914 ग्रामों (मातासुख से जायल तहसील के 120 गांवों सहित) एवं 7 शहरों यथा लाडनूं, परबतसर, मकराना, डीडवाना, डेगाना, नावां एवं कुचामन को इंदिरा गांधी नहर से हिमालय का मीठा एवं साफ पानी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नाँवां तहसील के 72 गांवों की पेयजल मांग भी इस परियोजना में शामिल है।



फिल्टर प्लांट एवं रॉ वाटर जलाशय माही बांध

परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कार्यों को 10 पैकेजों में विभक्त किया गया है। इनमें से दो पैकेजों (क्लस्टर वितरण पैकेज लाडनूँ (97 ग्राम) लागत रु. 147.90 करोड़ तथा क्लस्टर वितरण पैकेज कुचामन (96 ग्राम) लागत रु. 135.56 करोड़ के कार्य मार्च 2019 में पूर्ण होने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही मुख्य ट्रांसमिशन मैन (3 पैकेजों) के कार्यादेश सितम्बर 2015 में रु. 1489.72 करोड़ के जारी किए जा चुके हैं जिनका कार्य पूर्ण कर नहरी पानी चालु किया जा चुका है। इसके अलावा पैकेज सख्या 10, फ्लोराइड निराकरण सम्बंधित पैकेज का कार्यादेश भी माह नवम्बर 2016 में जारी कर दिया गया है, जिसका कार्य प्रगति संतोषजनक न होने के कारण दिनांक 8.12.2017 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में आंशिक कार्य विभागीय स्तर पर किया जा रहा है व शेष कार्य हेतु संशोधित प्लान जायका को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। शेष चार क्लस्टर पैकेजों के कार्यादेश सितम्बर, अक्टूबर 2018 में दिये जा चुके हैं व कार्य जुलाई-अगस्त 2020 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। परियोजना द्वारा वर्तमान में डीडवाना, लॉडनूँ, मकराना, कुचामन, नांवा, परबतसर व डेगाना शहरो (7शहरों) व 327 गांवों को नहरी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल 1927.17 करोड़ रु. व्यय हो चुके हैं।

12.31 बांसवाड़ा जिले की वृहद परियोजनाएं

12.31.1 सुरवानिया बांध आधारित बांसवाड़ा पेयजल परियोजना

तहसील बागीदौरा एवं बांसवाड़ा के समस्याग्रस्त एवं फ्लोराइड प्रभावित 82 गांवों की पेयजल समस्या समाधान हेतु बांसवाड़ा से 11 कि.मी. दूरी पर स्थित सिंचाई विभाग के सुरवानिया बांध को मुख्य स्रोत प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 को रु. 141.00 करोड़ की जारी की गई थी। परियोजना का कार्य दिनांक 31.03.2018 को पूर्ण हो चुका है एवं परियोजना के सभी 82 गांवों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रु 136.17 करोड़ का व्यय हो चुका है।

12.31.2 माही बांध आधारित

बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना :

माही बांध आधारित इस परियोजना से बांसवाड़ा जिले के 232 गांव तथा जिला प्रतापगढ़ के 102 गांव कुल 334



फिल्टर प्लांट

समस्याग्रस्त एवं फ्लोराइड प्रभावित गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी. पी. सी. की 191 वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रु. 560.00 करोड़ की जारी की गई थी। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 23.09.13 को राशि रु. 566.98 करोड़ का जारी किया गया था। परियोजना का 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कार्य 31.03.2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2018 तक कुल राशि लगभग रु. 444.49 करोड़ का व्यय हो चुका है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत जोन प्रथम का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इससे 140 गांवों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है शेष दो जोन का कार्य प्रगति पर है।

12.31.3 माही बांध आधारित

बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ के 399 गांवों की पेयजल परियोजना :

माही बांध आधारित बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गांवों एवं उनकी ढाणियों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु 18 किमी. की दूरी पर स्थित माही बांध को मुख्य स्रोत प्रस्तावित किया गया है

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.01.2018 को आयोजित विभाग की वित्त समिति की 737 वीं बैठक में राशि 798.35 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यो 03 पैकेज में बांटा गया है। पैकेज प्रथम के कार्यादेश दिनांक 20.09.2018 को राशि रु. 223.18 करोड़, पैकेज द्वितीय के कार्यादेश दिनांक 26.09.2018 को राशि रु. 166.66 करोड़, एवं पैकेज तृतीय के कार्यादेश दिनांक 26.09.2018 को राशि रु. 161.89 करोड़ के जारी कर दिये गये हैं सभी पैकेज के कार्य प्रगति पर है।

12.32 प्रतापगढ़ जिले की वृहद परियोजनाएं

12.32.1 पुनर्गठित शहरी जलप्रदाय परियोजना प्रतापगढ़

शहरी पेयजल योजना प्रतापगढ़ की स्थायी समस्या समाधान हेतु शहर प्रतापगढ़ से 32.50 किमी दूरी पर स्थित जाखम बांध को मुख्य स्रोत प्रस्तावित किये गये हैं। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.07.2015 को आयोजित पी.पी.सी. की 195 बैठक में राशि रु. 94.07 करोड़ की जारी की गई। परियोजना हेतु कार्यादेश दिनांक 29.01.2016 को राशि रु. 70.33 करोड़ का जारी किया गया था। परियोजना के 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा परियोजना के कार्य दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।



12.32.2 जाखम बांध आधारित जिला प्रतापगढ़ के 554 गांवों की पेयजल परियोजना

जाखम बांध आधारित इस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के प.स. प्रतापगढ़, अरनोद एवं पिपलखुंट के कुल 554 समस्याग्रस्त गांवों एवं उनकी 302 ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 03.01.2018 को आयोजित विभाग की वित्त समिति की 736 वीं बैठक में राशि 918.32 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यों 03 पैकेज में बांटा गया है तथा सभी तीनों पैकेज की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.05.2018 को आयोजित तकनीकी समिति की 664वीं बैठक में जारी की गई है। पैकेज प्रथम की निविदाएं दिनांक 17.07.2018 को खोली जा चुकी है एवं अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधिन है। शेष दोनों पैकेज के कार्य के निविदा प्रपत्र बनाने का कार्य प्रक्रियाधिन है।

12.33 चित्तौड़गढ़ जिले की वृहद परियोजनाएं

12.33.1 चम्बल नदी आधारित प.स. भेसरोडगढ़ के 38 ग्राम एवं उनकी 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भेसरोडगढ़ के 38 समस्याग्रस्त ग्राम एवं उनकी 27 ढाणियों के पेयजल के स्थायी समाधान हेतु चम्बल नदी को मुख्य स्रोत के रूप में चुना गया है। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09.12.2014 को पी.पी.सी. 194 वीं बैठक से

राशि रु 50.73 करोड़ की जारी की गई परियोजना की तकनीकी समिति की 629 वीं बैठक में राशि रु 47.66 करोड़ की जारी की गई। फोरेस्ट क्लीयरेंस की प्राप्ति आदि स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।

12.34 डुंगरपुर जिले की वृहद परियोजनाएं

12.34.1 सोम कमला बांध आधारित डुंगरपुर जिले की 151 गांवों की पेयजल परियोजना

जिला डुंगरपुर की प.स. आंसपुर दोवडा एवं डुंगरपुर के 151 समस्याग्रस्त गांवों, उनकी 244 ढाणियों एवं शहर डुंगरपुर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु सोम कमला आम्बा बांध को मुख्य स्रोत के रूप में चयन किया गया। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2018 को आयोजित विभाग की वित्त समिति की 745 वीं बैठक में राशि 365.00 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यों को 02 पैकेज में बांटा गया है। दिनांक 16.07.2018 को विभाग की तकनीकी समिति की 666वीं बैठक में प्रथम पैकेज की राशि रु 343.28 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के प्रथम पैकेज का कार्यादेश दिनांक 20.09.2018 को राशि रु 253.15 करोड़ का जारी किया गया। पैकेज प्रथम का कार्य प्रगति पर है।

प्रयोगशालाएं

विभागीय जल प्रदाय योजनाओं कि पेयजल गुणवत्ता जांच, सर्वेक्षण, नियंत्रण तथा निगरानी हेतु राज्य के सभी 33 जिलों में यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में जल एवं सीवेज के भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण के अतिरिक्त जल शोधन एवं स्वच्छीकरण, नलकूप वेधन एवं निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों ब्लीचिंग पाउडर, एलुमिना फ़ैरिक, बैन्टोनाइट, फिल्टर सैन्ड तथा ग्रेवल का गुणवत्ता परीक्षण भी किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला जयपुर में हेवी मेटल्स की जांच सुविधा भी उपलब्ध है।

जयपुर मुख्यालय पर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है इसके अतिरिक्त संभाग स्तर पर 6 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ व 26 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएँ अन्य जिलों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय सचल प्रयोगशाला भी कार्यरत है। जिसमें जल विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध है यह सचल प्रयोगशाला राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में आकस्मिक आवश्यकतानुसार जल गुणवत्ता, नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करती है।

राज्य के सभी गांव/ढाणियों में पेयजल की सतत निगरानी एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु राज्य के 20 जिला में मोबाईल प्रयोगशालाओं की स्थापना आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय प्रयोगशाला जयपुर, क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर, बीकानेर तथा जिला स्तरीय प्रयोगशाला भीलवाड़ा NABL से मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय प्रयोगशाला अजमेर, उदयपुर, भरतपुर तथा कोटा को NABL से मान्यता प्राप्ति हेतु कार्य प्रगति पर है।

जिला प्रयोगशालाएं विभागीय जलप्रदाय योजनाओं की जल गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रभावी मोनिटरिंग के अतिरिक्त दूषित पेयजल, मौसमी बीमारियों एवं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जल शुद्धीकरण एवं पेयजल गुणवत्ता की प्रभावी मोनेटरिंग का कार्य सुचारु रूप से कर रही है।

विभागीय पेयजल योजनाओं से की जा रही जलापूर्ति में जल गुणवत्ता परीक्षण एवं समुचित क्लोरीनीकरण की जांच के सामयिक प्रबन्ध कर जलगुणवत्ता सुनिश्चित की जाती हैं। जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी परिणामों की साप्ताहिक समीक्षा कर जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किये गये।

वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक विभागीय प्रयोगशालाओं में कुल 275024 जल नमूनों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	रासायनिक परीक्षण	36750 जल नमूने	44614 जल नमूने
2	जीवाणु परीक्षण	76750 जल नमूने	85349 जल नमूने
3	अवशेष क्लोरीन	123250 जल नमूने	145061 जल नमूने

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा विभागीय पेयजल योजनाओं तथा विभिन्न पेयजल स्रोतों के कुल 197724 जल नमूनों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	रासायनिक परीक्षण	36750 जल नमूने	32144 जल नमूने
2	जीवाणु परीक्षण	76750 जल नमूने	66265 जल नमूने
3	अवशेष क्लोरीन	123250 जल नमूने	99315 जल नमूने

सचल प्रयोगशाला (Mobile Lab) : – मुख्य रसायनज्ञ के अधीन मुख्यालय जयपुर पर एक सचल प्रयोगशाला कार्यरत है जिसमें सभी प्रकार के जल विश्लेषणों की सुविधा उपलब्ध है यह सचल प्रयोगशाला राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में आकस्मिक आवश्यकतानुसार जल गुणवत्ता, नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करती है। वर्ष 2017–18 में सचल प्रयोगशाला के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	रासायनिक परीक्षण	1000 जल नमूने	1034 जल नमूने
2	जीवाणु परीक्षण	1500 जल नमूने	1506 जल नमूने
3	अवशेष क्लोरीन	4000 जल नमूने	4295 जल नमूने

वर्ष 2018–19 में 31.12.2018 तक सचल प्रयोगशाला के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	रासायनिक परीक्षण	1000 जल नमूने	794 जल नमूने
2	जीवाणु परीक्षण	1500 जल नमूने	768 जल नमूने
3	अवशेष क्लोरीन	4000 जल नमूने	1616 जल नमूने

सतही जल स्रोत (Surface Water Source) : – सभी विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा जिले में स्थित सतही जल स्रोतों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण वर्ष में दो बार पूर्व एवं मानसून

पश्चात् कर सतही जल स्रोतों की जल गुणवत्ता का मुल्यांकन किया जाता है।

विश्लेषण गुणवत्ता नियन्त्रण (AQC) : – विभागीय प्रयोगशालाओं विश्लेषण गुणवत्ता निर्धारण हेतु जल नमूनों का सम्बन्धित प्रयोगशाला एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कर जांच परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर विश्लेषण गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखा जाता है। इसी प्रकार संभागीय स्तर पर भी जल नमूनों का क्रास चैक किया जाता है।

मैटीरियल जांच (Material Analysis) :– विभागीय संविदा दर के अन्तर्गत जल शोधन में प्रयुक्त ब्लीचिंग पाउडर, एलुमिना फैरिक, बैन्टोनाइट, फिल्टर सैन्ड, ग्रेवल तथा फिल्टर टैस्टिंग किट्स का विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विश्लेषण किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता कार्यक्रम (NRDWP) :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा आवंटित लक्ष्य 96000 जल नमूनों के विरुद्ध कुल 87983 जल नमूनों का परीक्षण किया गया था तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31.12.2018 तक जिला प्रयोगशालाओं द्वारा आवंटित लक्ष्य 96000 जल नमूनों के विरुद्ध कुल 59026 जल नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है,



सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम एवं डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र

राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने की पहल की गई है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध करवाना सम्भव हो पाएगा, जहाँ विद्युत की उपलब्धता नहीं है अथवा अनियमित है और भूजल स्तर नीचे जाने के कारण दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोराइड युक्त पानी की समस्या उत्पन्न होती है। वर्ष 2015-16 में कुल 1044 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमानित लागत ₹0 94.26 करोड़ की जारी कर माह फरवरी, 2016 में कार्यादेश जारी किए। माह दिसम्बर, 2018 तक इसके विरुद्ध 937 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।


वर्ष 2015-16 में गुणवत्ता प्रभावित ग्राम ढाणियों में जहाँ केवल लोराइड की समस्या है, में प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 345 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत ₹0 37.00 करोड़ की स्वीकृति जारी कर माह फरवरी, 2016 में कार्यादेश जारी किए गए। अब तक 337 संयंत्र (डी.एफ.यू.निट) चालू कर दिये गये हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण में कुल 1175 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत ₹0 137.00 करोड़ के


स्वीकृत कर माह जनवरी/मार्च, 2017 में कार्यादेश जारी किये गए जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 1077 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण में जिला जैसलमेर में कुल 84 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत ₹0 11.00 करोड़ के स्वीकृत कर माह जनवरी, 2018 में कार्यादेश जारी किये गए जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 32 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में कुल 627 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत ₹0 80.00 करोड़ के स्वीकृत कर माह सितम्बर 2018 में कार्यादेश जारी किये गए जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 18 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। इस तरह अब तक 1044 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र एवं 2231 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 937 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र एवं 1464 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। जिलावार विवरण परिशिष्ट 24 एवं 25 पर उपलब्ध है।



परिशिष्ट

विभागीय संगठनात्मक ढांचा

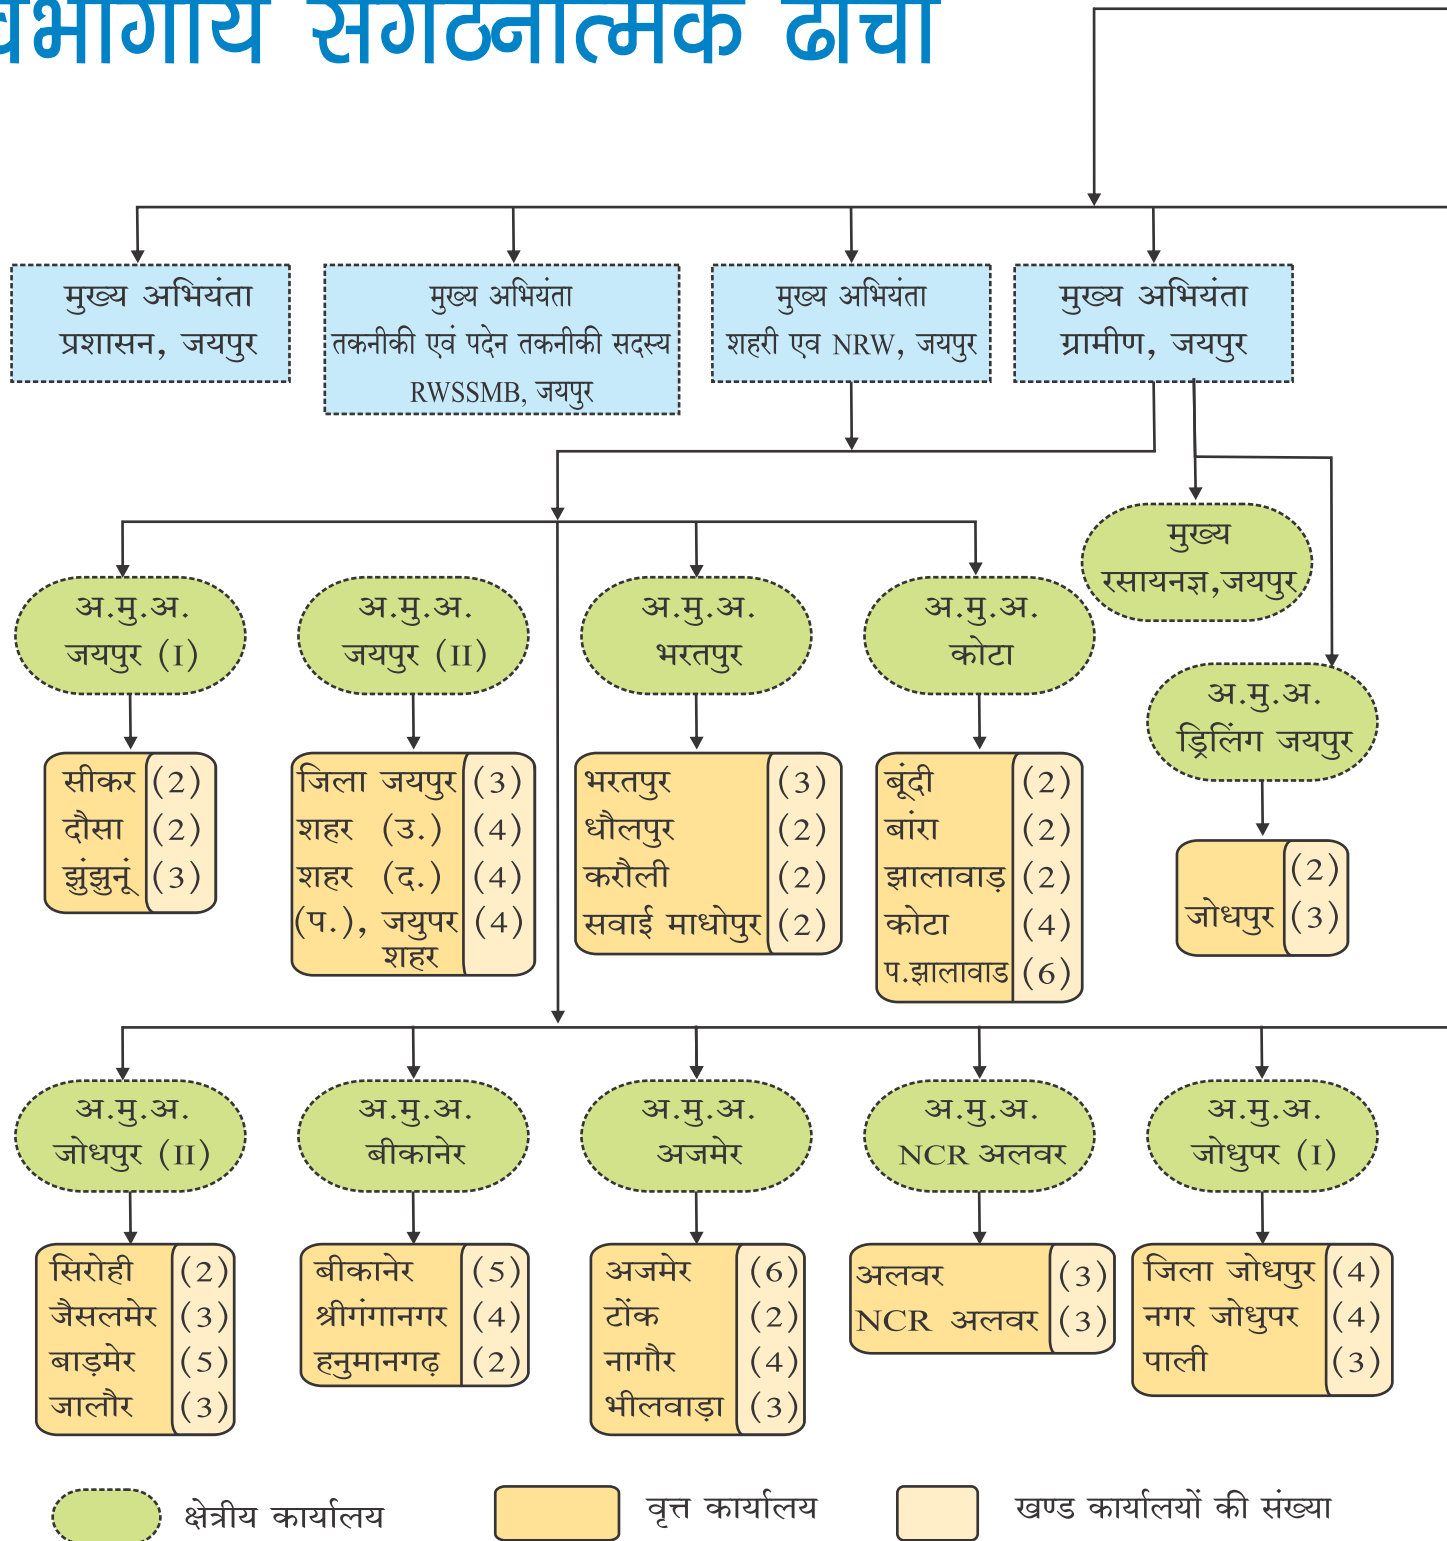

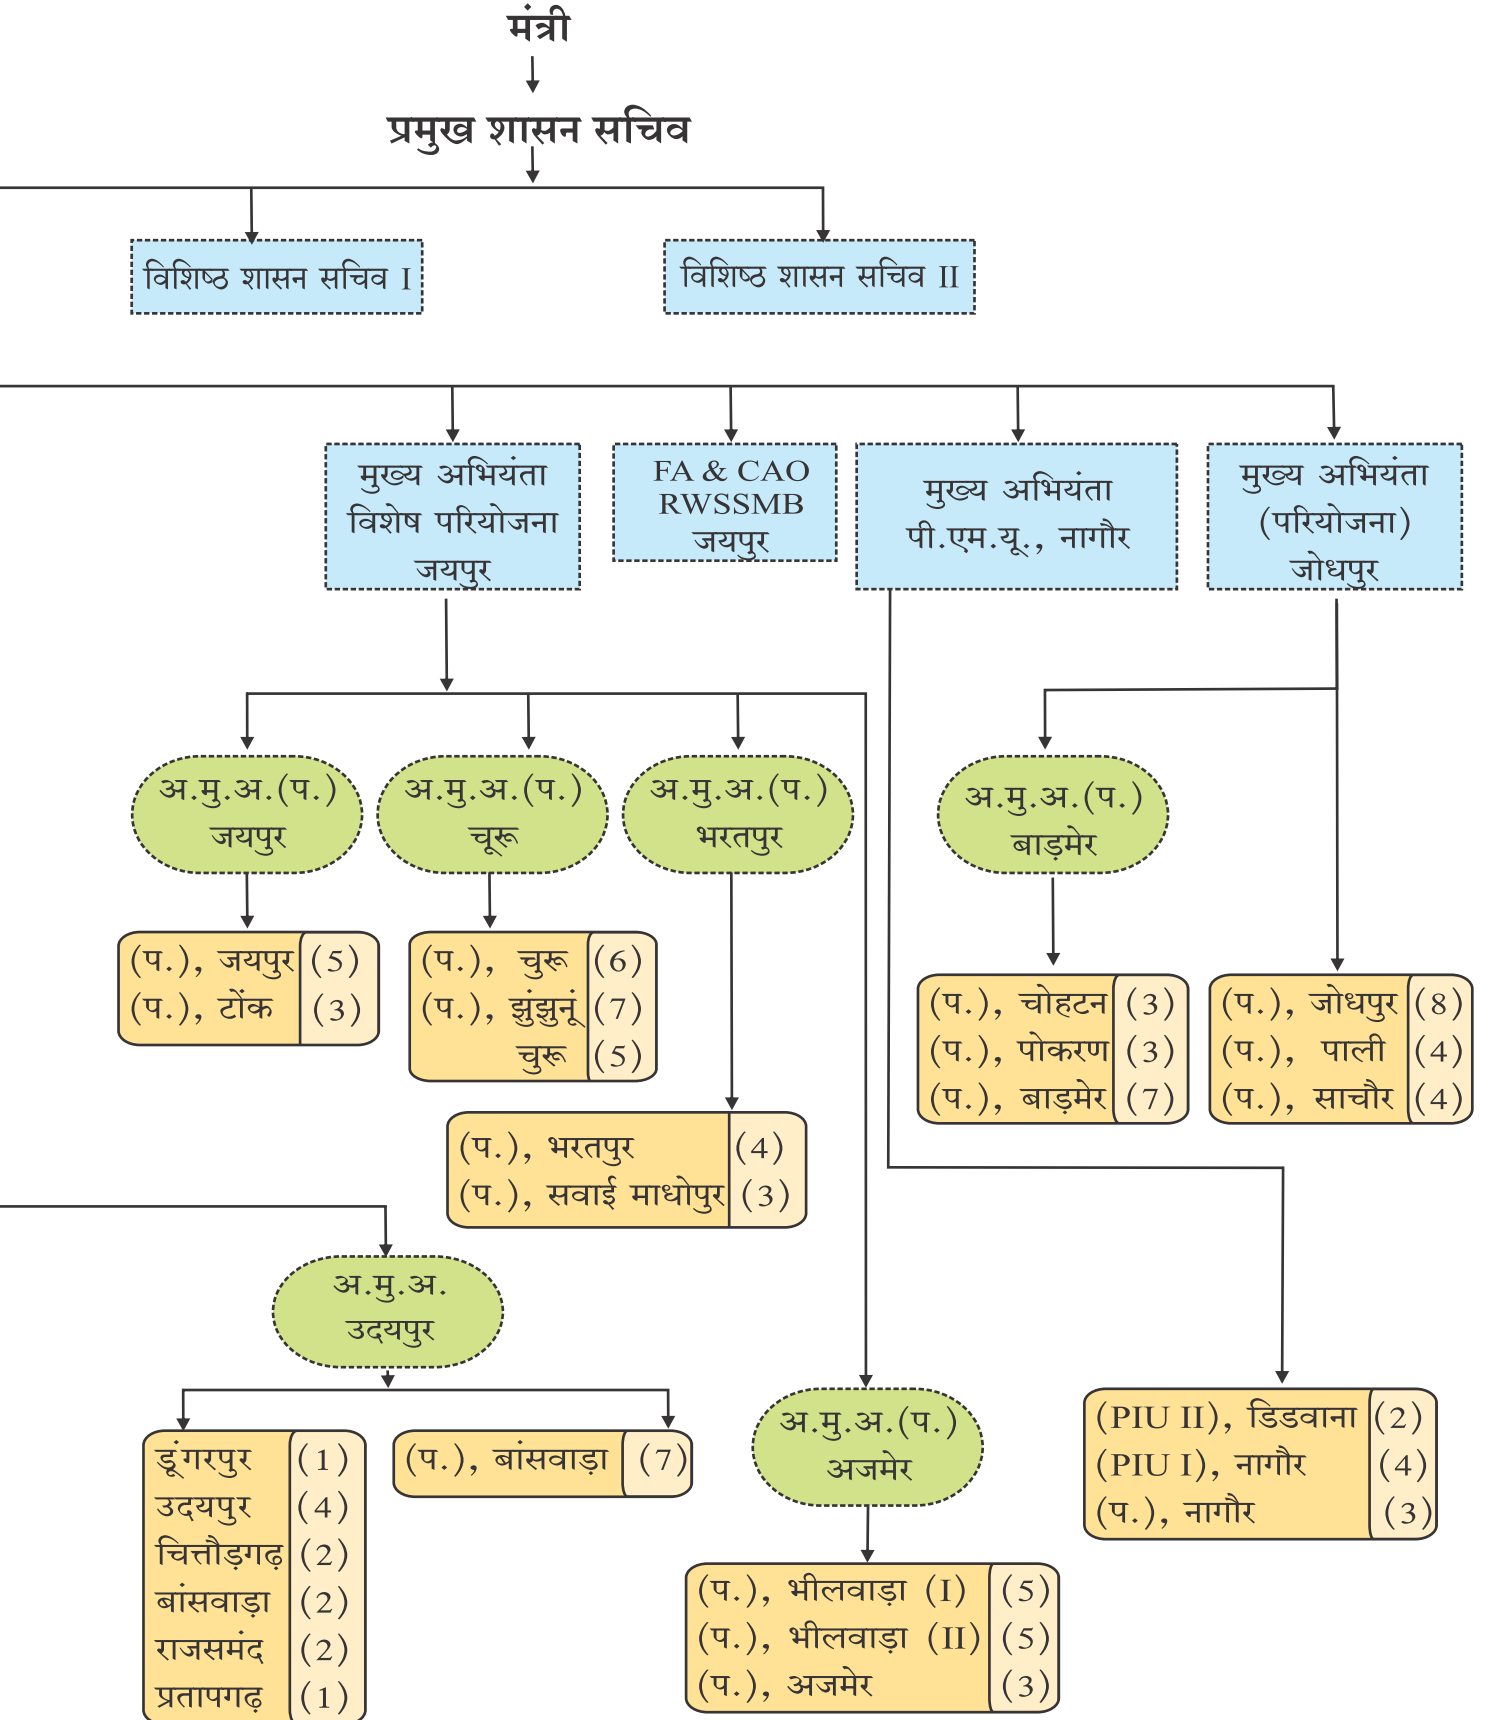

दिनांक 1.4.2018 तक हेबीटेशन में पेयजल की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	जिला	कुल हेबीटेशन की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित	हेबीटेशन की स्थिति जनसंख्या कवरेज के अनुसार					
				शून्य से 25%	25% से 50%	50% से 75%	75% से 100%	कुल	100%
1	अजमेर	2570	64	50	139	329	436	954	1552
2	भीलवाड़ा	3197	151	90	480	644	577	1791	1255
3	नागौर	5219	1190	1077	632	619	609	2937	1092
4	टोंक	2919	216	30	86	152	256	524	2179
5	भरतपुर	2150	461	125	192	273	268	858	831
6	धौलपुर	1806	1	30	67	120	246	463	1342
7	सवाईमाधोपुर	2179	63	37	107	159	218	521	1595
8	करौली	2596	206	127	406	556	632	1721	669
9	बीकानेर	1889	140	46	261	371	261	939	810
10	श्रीगंगानगर	3728	3	252	424	415	449	1540	2185
11	हनुमानगढ़	2040	5	115	175	172	176	638	1397
12	चूरू	1585	174	142	195	194	207	738	673
13	अलवर	6562	234	449	1246	1196	1156	4047	2281
14	सीकर	4282	116	46	292	594	608	1540	2626
15	दौसा	4816	183	457	1099	835	793	3184	1449
16	झुंझुनू	2451	85	110	161	160	154	585	1781
17	जयपुर	12960	244	93	485	779	1352	2709	10007
18	जोधपुर	10905	3265	884	1196	734	1076	3890	3750
19	पाली	2509	217	239	361	431	342	1373	919
20	बाड़मेर	11434	9295	473	310	339	240	1362	777
21	जैसलमेर	3840	367	410	818	1044	382	2654	819
22	जालौर	3431	651	655	635	535	477	2302	478
23	सिरोही	991	131	268	117	174	159	718	142
24	कोटा	942	93	54	145	149	188	536	313
25	बून्दी	1419	175	157	214	141	172	684	560
26	बारँ	1364	13	125	134	152	183	594	757
27	झालावाड़	1629	30	137	239	202	124	702	897
28	बांसवाड़ा	2606	157	1	22	24	107	154	2295
29	चित्तौड़गढ़	2423	236	149	125	121	201	596	1591
30	झुंजरपुर	2695	167	76	185	201	140	602	1926
31	प्रतापगढ़	2039	207	56	27	31	51	165	1667
32	राजसमन्द	3405	302	85	182	228	526	1021	2082
33	उदयपुर	6945	55	185	605	604	751	2145	4745
योग		121526	18897	7230	11762	12678	13517	45187	57442

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2017-18 में पेयजल से लाभान्वित गांव/ढाणियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	गुणवत्ता प्रभावित		स्लिपड बैंक		पूर्ण लाभान्वित गांव व ढाणियां	कुल गांव ढाणियां		एस.सी. बहुल		एस.टी. बहुल		अल्पसंख्यक बहुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	भीलवाडा	7	13	1	2	1	8	16	9	0	5	3	0	0
3	नागौर	5	5	7	14	1	12	20	9	2	0	0	0	0
4	टोंक	108	123	51	100	167	159	390	10	45	8	125	0	0
5	भरतपुर	55	83	4	12	28	59	123	14	21	0	1	10	14
6	धौलपुर	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
7	सवाईमाधोपुर	1	1	2	4	13	3	18	5	2	7	2	0	0
8	करोली	1	5	1	1	0	2	6	8	3	8	0	0	0
9	बीकानेर	10	11	1	1	1	11	13	7	2	0	0	0	0
10	श्रीगंगानगर	0	0	6	24	6	6	30	5	12	0	0	0	27
11	हनुमानगढ़	0	0	2	3	0	2	3	3	1	0	0	3	2
12	चूरू	17	20	11	22	24	28	66	104	10	0	0	0	0
13	अलवर	31	31	21	43	10	52	84	24	11	7	6	20	36
14	सीकर	4	5	12	24	0	16	29	4	0	5	0	0	0
15	दौसा	0	0	2	3	0	2	3	3	0	17	1	0	0
16	झुझुनू	3	13	0	4	17	3	34	21	1	2	0	0	0
17	जयपुर	228	298	859	1185	460	1087	1943	28	160	95	642	0	0
18	जोधपुर	259	328	78	161	102	337	591	74	15	31	1	0	0
19	पाली	3	7	4	21	20	7	48	5	3	32	3	0	0
20	बाड़मेर	35	46	4	8	48	39	102	54	9	7	5	10	5
21	जैसलमेर	13	13	1	1	4	14	18	17	3	2	4	22	17
22	जालौर	2	2	1	1	0	3	3	15	0	1	0	0	0
23	सिरोही	33	31	0	40	7	33	78	1	1	5	37	0	0
24	कोटा	0	3	4	18	8	4	29	5	4	4	10	0	0
25	बून्दी	6	9	6	16	9	12	34	5	5	21	9	0	0
26	बारंग	6	7	18	35	20	24	62	2	6	5	15	0	0
27	झालावाड़	0	0	2	2	4	2	6	6	0	3	3	0	0
28	बांसवाडा	9	17	0	0	0	9	17	0	0	60	16	0	0
29	चित्तौड़गढ़	3	3	3	11	4	6	18	2	2	10	3	0	0
30	डूंगरपुर	0	0	0	0	3	0	3	0	0	25	3	0	0
31	प्रतापगढ़	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0
32	राजसमन्द	2	2	24	57	47	26	106	20	1	5	47	0	0
33	उदयपुर	2	0	14	28	0	16	28	5	0	41	16	0	0
योग		843	1076	1139	1841	1005	1982	3922	470	319	410	952	65	101

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2018-19 में पेयजल से लाभान्वित गांव/ढाणियों का जिलेवार विवरण (दिसम्बर 2018 तक)

क्र. सं.	जिला	गुणवत्ता प्रभावित		स्लिपड बैंक		पूर्ण लाभान्वित गांव व ढाणियां	कुल गांव ढाणियां		एस.सी. बहुल		एस.टी. बहुल		अल्पसंख्यक बहुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अजमेर	7	10	29	22	36	36	68	0	2	0	0	0	0
2	भीलवाडा	18	41	61	394	193	79	628	4	25	2	20	0	0
3	नागौर	175	141	30	62	70	205	273	12	16	0	0	0	0
4	टोंक	153	3	40	95	79	193	177	7	38	45	38	0	0
5	भरतपुर	21	7	10	6	3	31	16	1	2	0	0	0	0
6	धौलपुर	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7	सवाईमाधोपुर	12	2	5	0	4	17	6	2	2	7	1	0	0
8	करोली	0	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
9	बीकानेर	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
10	श्रीगंगानगर	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
11	हनुमानगढ़	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	चूरू	24	34	41	26	41	65	101	9	20	0	0	0	0
13	अलवर	45	0	10	21	6	55	27	15	0	20	0	6	7
14	सीकर	75	4	53	0	10	128	14	4	1	1	0	0	0
15	दौसा	25	1	0	2	0	25	3	5	2	8	0	0	0
16	झुंझनू	0	39	102	344	550	102	933	2	28	0	1	0	0
17	जयपुर	44	43	92	149	127	136	319	7	21	5	3	0	0
18	जोधपुर	201	63	275	58	31	476	152	0	12	0	0	0	0
19	पाली	27	0	17	0	1	44	1	2	0	0	0	0	0
20	बाड़मेर	11	18	14	0	1	25	19	3	0	2	0	7	0
21	जैसलमेर	220	1	89	1	0	309	2	97	0	37	0	6	2
22	जालौर	4	27	0	30	29	4	86	0	3	0	1	0	0
23	सिरोही	25	1	0	0	0	25	1	0	0	0	1	0	0
24	कोटा	10	8	15	67	0	25	75	3	3	4	25	0	0
25	बून्दी	5	7	5	8	8	10	23	2	2	3	5	0	0
26	बारों	0	0	2	4	4	2	8	0	0	0	2	0	0
27	झालावाड़	5	6	50	278	52	55	336	10	48	2	5	0	0
28	बांसवाडा	37	6	9	1	126	46	133	0	0	19	125	0	0
29	चित्तौड़गढ़	0	1	4	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0
30	डूंगरपुर	0	0	16	0	0	16	0	0	0	9	0	0	0
31	प्रतापगढ़	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
32	राजसमन्द	1	0	0	4	2	1	6	0	0	1	1	0	0
33	उदयपुर	5	0	10	0	0	15	0	0	0	10	0	0	0
योग		1150	463	1000	1575	1374	2150	3412	185	225	175	229	19	9

विभिन्न प्रकार की ग्रामीण पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम (मुख्य हैबीटेशन) दिसम्बर, 2018 तक

क्र. सं.	जिला	मुख्य हैबिटेेशन की संख्या	विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या							अलाभान्वित ग्रामों की संख्या	भूजल से लाभान्वित ग्रामों की संख्या	सतही स्रोतों से लाभान्वित ग्रामों की संख्या
			पाइपड योजना से	पम्प व टैंक योजना से	क्षेत्रीय योजना से	हैण्डपम्प योजना से	टी.एस.एस. से	डिग्गी व अन्य से	कुल लाभान्वित ग्रामों की संख्या			
अजमेर क्षेत्र												
1	अजमेर	1099	76	55	718	204	8	38	1099	0	204	895
2	भीलवाडा	1792	215	227	292	1035	7	16	1792	0	1149	643
3	नागौर	1581	206	475	563	42	52	243	1581	0	1415	166
4	टोंक	1116	23	91	628	370	4	0	1116	0	435	681
भरतपुर क्षेत्र												
5	भरतपुर	1428	38	316	219	855	0	0	1428	0	1365	63
6	धौलपुर	801	20	80	173	528	0	0	801	0	645	156
7	सवाईमाधोपुर	758	40	107	66	537	0	0	750	8	750	0
8	करौली	851	54	244	91	462	0	0	851	0	851	0
बीकानेर क्षेत्र												
9	बीकानेर	854	112	289	278	0	22	153	854	0	449	405
10	श्रीगंगानगर	2855	20	33	2609	64	0	108	2834	21	80	2754
11	हनुमानगढ़	1831	173	30	1081	397	0	106	1787	44	436	1351
चुरू क्षेत्र												
12	चूरू	873	63	128	597	0	34	51	873	0	350	523
अलवर क्षेत्र												
13	अलवर	2021	236	591	99	1095	0	0	2021	0	2021	0
जयपुर –I क्षेत्र												
14	सीकर	1162	104	216	40	208	594	0	1162	0	1162	0
15	दौसा	1079	30	233	130	686	0	0	1079	0	1079	0
16	झुंझुनू	926	147	12	27	5	735	0	926	0	696	230
जयपुर –II क्षेत्र												
17	जयपुर	2126	526	447	111	1040	2	0	2126	0	1948	178
जोधपुर –I क्षेत्र												
18	जोधपुर	1836	82	545	1163	0	0	0	1790	46	572	1218
19	पाली	1017	88	200	402	232	1	94	1017	0	582	435
जोधपुर –II क्षेत्र												
20	बाड़मेर	2452	39	343	1890	59	0	1	2332	120	2096	236
21	जैसलमेर	756	5	60	469	100	3	108	745	11	595	150
22	जालौर	793	64	212	498	2	0	17	793	0	682	111
23	सिरोही	475	54	19	83	178	129	12	475	0	475	0
कोटा क्षेत्र												
24	कोटा	805	27	55	222	494	7	0	805	0	639	166
25	बून्दी	867	30	163	44	630	0	0	867	0	867	0
26	बारां	1114	24	120	41	929	0	0	1114	0	1072	42
27	झालावाड़	1488	25	73	636	754	0	0	1488	0	845	643
उदयपुर क्षेत्र												
28	बांसवाडा	1487	27	41	231	1157	31	0	1487	0	1265	222
29	चित्तौडगढ	1582	48	153	2	1379	0	0	1582	0	1579	3
30	डूंगरपुर	972	25	35	101	800	11	0	972	0	871	101
31	प्रतापगढ	971	9	42	26	894	0	0	971	0	957	14
32	राजसमन्द्	1042	142	100	298	502	0	0	1042	0	764	278
33	उदयपुर	2479	131	197	207	1943	1	0	2479	0	2279	200
योग		43289	2903	5932	14035	17581	1641	947	43039	250	31175	11864

विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ढाणियाँ (अन्य हैबीटेशन) दिसम्बर, 2018 तक

क्र. सं.	जिला	ढाणियों की संख्या	विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ढाणियों की संख्या							अलाभान्वित ढाणियों की संख्या	भूजल से लाभान्वित ढाणियों की संख्या	सतही स्रोतों से लाभान्वित ढाणियों की संख्या
			पाइप योजना से	पम्प व टैंक योजना से	क्षेत्रीय योजना से	हैण्डपम्प योजना से	टी.एस.एस. से	डिग्गी व अन्य से	कुल लाभान्वित ढाणियों की संख्या			
अजमेर क्षेत्र												
1	अजमेर	1471	18	0	1097	356	0	0	1471	0	356	1115
2	भीलवाडा	1405	37	65	74	1226	3	0	1405	0	1403	2
3	नागौर	3638	9	1171	1669	290	0	77	3216	422	3216	0
4	टोंक	1803	0	43	962	795	3	0	1803	0	735	1068
भरतपुर क्षेत्र												
5	भरतपुर	722	7	15	25	675	0	0	722	0	695	27
6	धौलपुर	1005	0	0	70	935	0	0	1005	0	944	61
7	सवाईमाधोपुर	1421	0	0	5	1416	0	0	1421	0	1421	0
8	करोली	1745	39	65	64	1577	0	0	1745	0	1745	0
बीकानेर क्षेत्र												
9	बीकानेर	1035	50	291	106	53	5	239	744	291	372	372
10	श्रीगंगानगर	873	0	0	444	42	0	0	486	387	42	444
11	हनुमानगढ़	209	1	5	203	0	0	0	209	0	0	209
चूरु क्षेत्र												
12	चूरु	712	0	67	378	27	0	106	578	134	374	204
अलवर क्षेत्र												
13	अलवर	4541	0	0	0	4541	0	0	4541	0	4541	0
जयपुर - I क्षेत्र												
14	सीकर	3120	4	8	32	3076	0	0	3120	0	3020	0
15	दौसा	3737	24	45	150	3518	0	0	3737	0	3737	0
16	झुंझुनू	1525	108	0	15	979	423	0	1525	0	1094	431
जयपुर - II क्षेत्र												
17	जयपुर	10834	478	745	446	9165	0	0	10834	0	10298	536
जोधपुर - I क्षेत्र												
18	जोधपुर	9069	0	2581	3876	550	0	8	7015	2054	4259	2756
19	पाली	1492	99	48	365	843	2	135	1492	0	1231	261
जोधपुर - II क्षेत्र												
20	बाड़मेर	8982	29	491	3823	468	0	0	4811	4171	4422	389
21	जैसलमेर	3084	0	42	957	845	0	4	1848	1236	1698	150
22	जालौर	2638	146	242	1283	66	0	31	1768	870	1502	266
23	सिरोही	516	4	1	5	504	2	0	516	0	516	0
कोटा क्षेत्र												
24	कोटा	137	0	0	4	133	0	0	137	0	133	4
25	बून्दी	552	1	8	1	542	0	0	552	0	552	0
26	बाराँ	250	0	0	8	242	0	0	250	0	242	8
27	झालावाड़	141	10	0	85	46	0	0	141	0	46	95
उदयपुर क्षेत्र												
28	बांसवाडा	1119	18	11	27	1052	11	0	1119	0	1119	0
29	चित्तौड़गढ़	841	0	0	0	841	0	0	841	0	841	0
30	डूंगरपुर	1723	171	11	117	1424	0	0	1723	0	1606	117
31	प्रतापगढ़	1068	0	0	0	1068	0	0	1068	0	1068	0
32	राजसमन्द	2363	151	68	346	1798	0	0	2363	0	2068	295
33	उदयपुर	4466	112	28	67	4259	0	0	4466	0	4345	121
योग		78237	1516	6051	16704	43352	449	600	68672	9565	59641	8931

ग्रीष्म संवर्द्धन 2018-19 तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (21.06.2018 को)

क्र.सं.	जिला	विभाग द्वारा				जिला प्रशासन द्वारा				स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा				कुल योग			
		ग्राम	हिले	रकटे	रकटे	ग्राम	हिले	रकटे	रकटे	ग्राम	हिले	रकटे	रकटे	ग्राम	हिले	रकटे	रकटे
अजमेर क्षेत्र																	
1	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	भीलवाडा	0	0	0	0	283	46	329	160	689	0	0	0	283	46	329	160
3	नागौर	278	445	723	253	1084	0	0	0	0	0	0	0	278	445	723	253
4	टोंक	12	4	16	10	62	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	10
	कुल	290	449	739	263	1146	283	46	329	160	689	0	0	573	495	1068	423
बीकानेर क्षेत्र																	
5	बीकानेर	26	20	46	46	16	0	0	0	0	0	0	0	26	20	46	46
6	श्रीगंगानगर	8	0	8	13	32	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	13
7	हनुमानगढ़	6	0	6	6	26	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
	कुल	40	20	60	65	74	0	0	0	0	0	0	0	40	20	60	65
चुरू क्षेत्र																	
8	चुरू	129	22	151	51	195	0	0	0	0	0	0	0	129	22	151	51
	कुल	129	22	151	51	195	0	0	0	0	0	0	0	129	22	151	51
भरतपुर क्षेत्र																	
9	भरतपुर	42	2	44	18	88	0	0	0	0	0	0	0	42	2	44	18
10	धौलपुर	25	39	64	14	88	0	0	0	0	0	0	0	25	39	64	14
11	करौली	50	31	81	31	195	0	0	0	0	0	0	0	50	31	81	31
12	सवाईमाधोपुर	0	0	0	0	0	93	37	130	65	407	0	0	93	37	130	65
	कुल	117	72	189	63	371	93	37	130	65	407	0	0	210	109	319	128
अलवर क्षेत्र																	
13	अलवर	37	12	49	28	131	0	0	0	0	0	0	0	37	12	49	28
	कुल	37	12	49	28	131	0	0	0	0	0	0	0	37	12	49	28
जयपुर क्षेत्र																	
14	दौसा	5	0	5	12	68	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	12
15	झुंझुनू	85	43	128	130	490	0	0	0	0	0	0	0	85	43	128	130
16	सीकर	197	487	684	205	901	0	0	0	0	0	0	0	197	487	684	205
	कुल	287	530	817	347	1459	0	0	0	0	0	0	0	287	530	817	347

क्र.सं.	जिला	विभाग द्वारा				जिला प्रशासन द्वारा				स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा				कुल योग				
		ग्राम	ग्रामिण	नरि	रकट	ग्राम	ग्रामिण	नरि	रकट	ग्राम	ग्रामिण	नरि	रकट	ग्राम	ग्रामिण	नरि	रकट	
जयपुर II क्षेत्र																		
17	जयपुर	130	266	396	110	635	0	0	0	0	0	0	0	130	266	396	110	635
	कुल	130	266	396	110	635	0	0	0	0	0	0	0	130	266	396	110	635
जोधपुर I क्षेत्र																		
18	जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	पाली	14	26	40	18	79	0	0	0	0	0	0	0	14	26	40	18	79
	कुल	14	26	40	18	79	0	0	0	0	0	0	0	14	26	40	18	79
जोधपुर II क्षेत्र																		
20	बाड़मेर	0	0	0	0	0	385	520	905	49	147	0	0	385	520	905	49	147
21	जैसलमेर	0	0	0	0	0	148	562	710	31	74	0	0	148	562	710	31	74
22	जालौर	35	48	83	25	101	0	0	0	0	0	0	0	35	48	83	25	101
23	सिरोही	1	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4
	कुल	36	50	86	27	105	533	1082	1615	80	221	0	0	569	1132	1701	107	326
कोटा क्षेत्र																		
24	बारों	165	52	217	84	448	0	0	0	0	0	0	0	165	52	217	84	448
25	बून्दी	314	122	436	132	936	0	0	0	0	0	0	0	314	122	436	132	936
26	झालावाड़	271	64	335	136	692	0	0	0	0	0	0	0	271	64	335	136	692
27	कोटा	105	9	114	72	535	0	0	0	0	0	0	0	105	9	114	72	535
	कुल	855	247	1102	424	2611	0	0	0	0	0	0	0	855	247	1102	424	2611
उदयपुर क्षेत्र																		
28	बांसवाड़ा	95	21	116	51	140	0	0	0	0	0	0	0	95	21	116	51	140
29	चित्तौड़गढ़	152	12	164	79	307	0	0	0	0	0	27	6	179	18	197	97	394
30	डूंगरपुर	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
31	राजसमन्द	186	99	285	80	270	0	0	0	0	0	0	0	186	99	285	80	270
32	उदयपुर	10	0	10	11	41	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	11	41
33	प्रतापगढ़	99	27	126	53	167	0	0	0	0	0	0	0	99	27	126	53	167
	कुल	543	159	702	275	928	0	0	0	0	0	27	6	570	165	735	293	1015
	कुल योग	2478	1853	4331	1671	7734	909	1165	2074	305	1317	27	6	3414	3024	6438	1994	9138

ग्रीष्म संवर्द्धन 2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (21.06.2018 को)

क्र. स.	क्षेत्र	जिले का नाम	शहर का नाम	टैंकर प्रतिदिन	टैंकर ट्रिप प्रतिदिन
1	अजमेर	अजमेर	अजमेर	9	46
2	अलवर	अलवर	अलवर	12	82
3			बहरोर	1	4
4			खैरतल	7	67
5			खेडली	2	15
6			राजगढ़	12	120
7			तिजारा	2	12
8	अजमेर	भीलवाड़ा	गंगापुर	3	16
9		नागौर	डीडवाना	7	32
10			कुवातन सीटी	8	26
11			कुयेरा	10	50
12			लाडनु	5	40
13			मकराना	17	92
14			मेरता सीटी	4	40
15			मुडवा	6	26
16			परबतसर	4	31
17	कोटा	बारां	बारां	4	26
18			छबड़ा	1	1
19		बूंदी	नैनवां	10	148
20		झालावाड़	अकरेला	2	16
21			भवानी मंडी	1	7
22			चौमेला	2	3
23			झालावाड़	4	58
24		कोटा	कोटा	8	73
25			सतलखेडी	1	2
26	जोधपुर II	बाड़मेर	बालोतरा	5	31
27	भरतपुर	भरतपुर	बयाना	1	5
28			भरतपुर और सेवर	5	36
29			डीग	2	12
30			कामां	1	1
31			कुम्हेर	2	14
32			नगर	3	25
33		करौली	हिडॉन	4	27
34		सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	26	203
35			सवाई माधोपुर	25	177
36	बीकानेर	बीकानेर	श्री डूंगरगढ़	1	5
37			अनुपगढ़	3	2

ग्रीष्म संवर्द्धन 2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (21.06.2018 का)

क्र. स.	क्षेत्र	जिले का नाम	शहर का नाम	टैंकर प्रतिदिन	टैंकर ट्रिप प्रतिदिन
38			केसरीसिंहपुरा	1	3
39			श्री करनपुर	1	3
40	उदयपुर	चित्तोडगढ़	बेगु	1	3
41			निम्बाहेडा	9	90
42			रावतभाटा	2	3
43		डुंगरपुर	सागवाडा	1	3
44	चुरु	चुरु	चुरु	1	5
45			राजलदेसर	2	19
46			रतनगढ़	4	32
47			सुजानगढ़	1	9
48			तारानगर	10	40
49	जयपुर I	दौसा	बादीकुई	12	133
50			दौसा	15	137
51		झुझुनु	खेतडी	1	3
52			उदयपुरवाटी	8	75
53		सीकर	खंडेला	4	22
54			लोसल	1	6
55			सीकर	3	15
56			श्री माधोपुर	4	23
57	जयपुर II	जयपुर	जयपुर	298	2256
58			बगरु	8	54
59			बस्सी	6	35
60			शाहपुरा	11	94
61			विराटनगर	2	11
		कुल योग	61 शहर	626	4645

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल हैलपम्पों की संख्या	भरमवे योग हैलपम्पों की संख्या	कुल हैलपम्पों के लिए हैलपम्पों की संख्या	रिपेयर के लिए हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों के लिए हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे वाहनों की संख्या			हैलपम्पों की संख्या	कुल हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे वाहनों की संख्या	कुल हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे वाहनों की संख्या	कुल हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे वाहनों की संख्या	कुल हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे वाहनों की संख्या
										फिर	फिर	फिर									
अजमेर क्षेत्र																					
1.	अजमेर	16792	18255	18229	26	544	1112	196	4	71	2	9	19165								
2.	भीलवाड़ा	22436	12806	12786	20	1697	1335	1214	9	122	15	8	8795								
3.	नागौर	3753	3049	3049	0	131	83	0	5	5	25	10	1592								
4.	टोंक	15291	6788	6775	13	393	149	130	0	83	16	8	8916								
कुल		58272	40898	40839	59	2765	2679	1540	18	281	58	35	38468								
बीकानेर क्षेत्र																					
5.	बीकानेर	5420	4696	4689	7	142	0	0	0	0	0	0	4710								
6.	श्रीगंगानगर	2290	1402	1402	0	83	0	60	0	0	0	3	0								
7.	हनुमानगढ़	2056	794	787	7	91	0	0	0	0	0	3	0								
कुल		9766	6892	6878	14	316	0	60	0	0	0	6	4710								
चूरू क्षेत्र																					
8.	चूरू	1273	306	295	11	435	198	0	0	0	0	0	111								
कुल		1273	306	295	11	435	198	0	0	0	0	0	111								
भरतपुर क्षेत्र																					
9.	भरतपुर	11756	6266	6251	15	1092	765	358	0	42	18	6	4435								
10.	धौलपुर	21777	8402	8287	115	660	1048	0	0	50	5	2	12519								
11.	करौली	13301	5380	5286	94	1087	1547	0	0	30	21	7	9705								
12.	सवाईमाधोपुर	9614	4789	4779	10	405	440	0	0	56	26	9	10899								
कुल		56448	24837	24603	234	3244	3800	358	0	178	70	24	37558								
अलवर क्षेत्र																					
13.	अलवर	17106	3530	3530	0	1320	4420	0	3	95	19	4	5856								
कुल		17106	3530	3530	0	1320	4420	0	3	95	19	4	5856								
जयपुर I क्षेत्र																					
14.	दौसा	15888	5727	5727	0	257	1778	0	1	63	0	3	4678								
15.	झुंझुनू	8701	3768	3768	0	353	1413	324	0	6	35	5	4807								
16.	सीकर	11757	3258	3229	29	1083	2303	12	1	19	12	7	6987								
कुल		36346	12753	12724	29	1693	5494	336	2	88	47	15	16472								

क्र.सं.	जिला का क्षेत्र	कुल हैउपग्रामों की संख्या	मरम्मत योग्य हैउपग्रामों की संख्या	कुल हैउपग्रामों की संख्या	सिंपल किने गये वाते हैउपग्रामों की संख्या	परिचर्या पाये गये हैउपग्रामों की संख्या	सूखे पाये गये हैउपग्रामों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिचर्या हैउपग्रामों की संख्या	अभियान में लेने वाले अभियानियों की संख्या			वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया पाइप (मीटर में)	
									किने	सिंपली	संख्या			
जयपुर II क्षेत्र														
17.	जयपुर	26033	22355	22263	92	970	3815	0	6	167	56	16	27463	
कुल		26033	22355	22263	92	970	3815	0	6	167	56	16	27463	
जोधपुर I क्षेत्र														
18.	जोधपुर	4986	2801	2789	12	186	205	0	1	3	58	14	5797	
19.	पाली	11100	9303	9244	59	473	332	74	0	20	0	13	3453	
कुल		16086	12104	12033	71	659	537	74	1	23	58	27	9250	
जोधपुर II क्षेत्र														
20.	बाड़मेर	6183	4029	3965	64	150	92	1	5	7	38	19	5326	
21.	जैसलमेर	4621	8747	8715	32	21	18	11	1	1	116	12	462	
22.	जालौर	1737	545	545	0	388	342	0	0	0	34	6	561	
23.	सिरोही	9080	5818	5818	0	627	638	8	0	24	39	6	6984	
कुल		21621	19139	19043	96	1186	1090	20	6	32	227	43	13333	
कोटा क्षेत्र														
24.	बारौ	11688	7398	7304	94	668	1725	141	0	56	7	5	26831	
25.	बून्दी	10861	5169	5136	33	63	682	0	2	66	10	3	6939	
26.	झालावाड़	10199	4733	4710	23	858	1521	97	1	87	0	5	8052	
27.	कोटा	7982	3874	3839	35	280	89	0	2	41	25	9	12694	
कुल		40730	21174	20989	185	1869	4017	238	5	250	42	22	54516	
उदयपुर क्षेत्र														
28.	बांसवाड़ा	19285	5564	5560	4	557	314	0	1	118	5	5	6040	
29.	चित्तौड़गढ़	13476	7829	7802	27	439	1171	253	6	102	10	6	14284	
30.	झुंझारपुर	25577	8866	8866	0	813	1018	609	0	146	24	7	6171	
31.	राजसमन्द	13820	5095	5091	4	195	708	85	0	76	12	0	8244	
32.	उदयपुर	34823	17423	17423	0	546	2700	0	0	220	0	7	19011	
33.	प्रतापगढ़	13665	7547	7531	16	206	1713	0	2	70	28	9	9633	
कुल		120646	52324	52273	51	2756	7624	947	9	732	79	34	63383	
कुल योग		404327	216312	215470	842	17213	33674	3573	50	1846	656	226	271120	

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल हैलपम्पों की संख्या	भरमल योग हैलपम्पों की संख्या	कुल सिंचने वाले हैलपम्पों की संख्या	रियरर किनेटिक हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों की संख्या	सूखे पाये जाने वाले हैलपम्पों की संख्या	कुल मकौ से हटाये गये पम्पों की संख्या	अभियान में लगे			हैलर	प्रयोग में लाये गये पम्प (मीटर में)
									फिटर	सिस्टी	संख्या		
अजमेर क्षेत्र													
1.	अजमेर	4854	5524	5524	0	84	153	4	3	4	14	3	2259
2.	भीलवाडा	2974	3404	3391	13	121	46	81	2	1	0	0	2202
3.	नागौर	118	9	9	0	0	0	0	1	1	3	1	6
4.	टोंक	1178	1862	1848	14	23	50	9	0	0	2	0	1803
कुल		9124	10799	10772	27	228	249	94	6	6	19	4	6270
बीकानेर क्षेत्र													
5.	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	श्रीगंगानगर	403	258	256	2	11	0	5	0	0	0	0	40
7.	हनुमानगढ़	375	267	266	1	39	0	0	0	0	0	0	0
कुल		778	525	522	3	50	0	5	0	0	0	0	40
चूरू क्षेत्र													
8.	चूरू	168	31	27	4	39	43	0	0	0	0	0	93
कुल		168	31	27	4	39	43	0	0	0	0	0	93
भरतपुर क्षेत्र													
9.	भरतपुर	914	818	811	7	8	74	0	1	0	13	0	359
10.	धौलपुर	668	1073	1070	3	9	8	0	0	0	8	0	993
11.	करौली	296	246	239	7	70	87	0	0	0	4	0	730
12.	सवाईमाधोपुर	741	973	969	4	18	10	0	0	0	0	0	2319
कुल		2619	3110	3089	21	105	179	0	1	0	25	0	4401
अलवर क्षेत्र													
13.	अलवर	818	174	174	0	183	328	1	0	1	7	0	297
कुल		818	174	174	0	183	328	1	0	1	7	0	297
जयपुर I क्षेत्र													
14.	दौसा	982	1295	1295	0	21	63	0	0	0	0	0	1198
15.	झुंझुनू	447	177	177	0	69	100	25	0	1	1	0	227
16.	सीकर	244	36	36	0	48	107	3	0	0	1	1	195
कुल		1673	1508	1508	0	138	270	28	0	1	2	1	1620

क्र.सं.	जिला का नाम	कुल हैलपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैलपम्पों की संख्या	कुल सुधार गये हैलपम्पों की संख्या	सिंचन किने जाने वाले क्षेत्र हैलपम्पों की संख्या	परिचरित गये हैलपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैलपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिचरित हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे			वहानी की संख्या	प्रयोग में लाया गया पाइप (मीटर में)
									कितने	सिंचनी	हैलप		
जयपुर II क्षेत्र													
17.	जयपुर	3353	4266	4247	19	407	347	4	3	13	6	3	5940
कुल		3353	4266	4247	19	407	347	4	3	13	6	3	5940
जोधपुर I क्षेत्र													
18.	जोधपुर	2383	1038	1028	10	1	1	0	3	2	34	2	0
19.	पाली	1723	2882	2849	33	74	95	7	0	0	6	0	845
कुल		4106	3920	3877	43	75	96	7	3	2	40	2	845
जोधपुर II क्षेत्र													
20.	बाड़मेर	55	102	98	4	0	0	0	1	3	4	2	96
21.	जैसलमेर	5	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
22.	जालौर	128	196	196	0	13	24	0	0	0	6	2	195
23.	सिरोही	1154	574	574	0	18	11	0	0	0	4	0	935
कुल		1342	872	868	4	36	35	0	1	4	14	4	1226
कोटा क्षेत्र													
24.	बारौ	1079	883	881	2	37	54	31	0	0	0	0	3766
25.	बूंदी	625	1793	1788	5	0	37	0	0	0	0	0	3144
26.	झालावाड़	869	764	763	1	11	22	6	0	0	0	0	1554
27.	कोटा	847	910	909	1	7	0	0	0	0	0	0	1851
कुल		3420	4350	4341	9	55	113	37	0	0	0	0	10315
उदयपुर क्षेत्र													
28.	बांसवाड़ा	390	144	144	0	6	5	0	0	0	1	0	168
29.	चित्तौड़गढ़	693	526	526	0	19	32	10	0	0	0	0	759
30.	डूंगरपुर	834	765	765	0	49	37	49	0	1	0	0	453
31.	राजसमन्द	627	604	603	1	10	5	5	0	0	0	0	1593
32.	उदयपुर	3367	3395	3386	9	71	154	6	0	0	5	2	2103
33.	प्रतापगढ़	372	492	488	4	17	30	0	1	4	0	0	536
कुल		6283	5926	5912	14	172	263	70	1	5	6	2	5612
कुल योग		33684	35481	35337	144	1488	1923	246	15	32	119	16	36659

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल हैलपम्पों की संख्या	भरमने योग्य हैलपम्पों की संख्या	कुल हैलपम्पों को संचालित करने वाले हैलपम्पों की संख्या	हैलपम्पों को संचालित करने वाले हैलपम्पों की संख्या	सूखे पाए जाने वाले हैलपम्पों की संख्या	कुल संचालित हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे			सिंचने की संख्या	हैलपम्पों की संख्या	
								फिट	सिंचने की संख्या	हैलपम्पों की संख्या			
अजमेर क्षेत्र													
1.	अजमेर	16801	14746	14724	22	462	1426	0	4	73	1	6	18526
2.	भीलवाड़ा	21742	9714	9693	21	939	2691	0	10	117	26	5	7147
3.	नागौर	3904	2425	2417	8	364	81	244	6	8	20	7	1868
4.	टोंक	15607	4857	4830	27	790	346	70	1	76	5	5	6245
कुल		58054	31742	31664	78	2555	4544	314	21	274	52	23	33786
बीकानेर क्षेत्र													
5.	बीकानेर	6270	2139	2139	0	135	0	0	0	0	0	0	0
6.	श्रीगंगानगर	2284	865	865	0	23	0	0	5	7	7	2	121
7.	हनुमानगढ़	2152	666	656	10	100	0	0	0	0	0	8	0
कुल		10706	3670	3660	10	258	0	0	5	7	7	10	121
चूरू क्षेत्र													
8.	चूरू	1313	311	309	2	358	74	0	0	0	0	0	492
कुल		1313	311	309	2	358	74	0	0	0	0	0	492
भरतपुर क्षेत्र													
9.	भरतपुर	11310	5776	5738	38	1752	543	0	0	50	10	4	3995
10.	धौलपुर	21856	6912	6773	139	707	1267	0	0	47	0	2	10944
11.	करौली	11293	3725	3679	46	1113	1547	0	0	26	15	1	5108
12.	सवाईमाधोपुर	10116	4034	4020	14	601	1919	0	0	52	36	5	10707
कुल		54575	20447	20210	237	4173	5276	0	0	175	61	12	30754
अलवर क्षेत्र													
13.	अलवर	17435	2810	2784	26	1374	4898	0	3	84	9	7	4918
कुल		17435	2810	2784	26	1374	4898	0	3	84	9	7	4918
जयपुर I क्षेत्र													
14.	दौसा	15960	5177	5159	18	260	1835	0	1	68	0	3	9456
15.	झुंझुनू	8472	1882	1875	7	600	1883	12	2	6	51	7	1966
16.	सीकर	11892	3244	3198	46	1083	2993	12	0	0	0	1	5655
कुल		36324	10303	10232	71	1943	6711	24	3	74	51	11	17077

क्र.सं.	जिला का क्षेत्र	कुल हैलपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैलपम्पों की संख्या	कुल हैलपम्पों की संख्या	सिंचन के लिए हैलपम्पों की संख्या	परिचालन के लिए हैलपम्पों की संख्या	सूखे में हैलपम्पों की संख्या	कुल मों के से हटाये गये परिचालन हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लेने वाले अधिकारी			वर्तमान में लेने की संख्या	प्रयोग में लाया गया पाइप (मीटर में)	
									फिरोज	सिद्धा	हैलप			
जयपुर II क्षेत्र														
17.	जयपुर	26240	16982	16854	128	1348	4138	58	6	164	34	11	26365	
	कुल	26240	16982	16854	128	1348	4138	58	6	164	34	11	26365	
जोधपुर I क्षेत्र														
18.	जोधपुर	4312	2017	2006	11	136	203	4	1	3	59	11	3164	
19.	पाली	11284	6309	6266	43	342	308	5	0	20	42	10	2426	
	कुल	15596	8326	8272	54	478	511	9	1	23	101	21	5590	
जोधपुर II क्षेत्र														
20.	बाड़मेर	6573	3992	3867	125	144	77	65	6	10	25	17	7676	
21.	जैसलमेर	4845	7032	7002	30	14	14	4	3	2	94	14	2784	
22.	जालौर	1806	733	730	3	411	335	42	0	0	26	6	720	
23.	सिरोही	9192	4131	4061	70	628	462	60	0	15	28	4	2436	
	कुल	22416	15888	15660	228	1197	888	171	9	27	173	41	13616	
कोटा क्षेत्र														
24.	बारौ	11884	4556	4500	56	557	368	216	0	20	0	0	14020	
25.	बन्दी	10861	2947	2941	6	110	14	86	2	0	0	0	6156	
26.	झालावाड़	10354	3988	3965	23	999	1564	199	0	87	0	5	6498	
27.	कोटा	7989	3247	3225	22	118	0	0	1	29	0	4	6680	
	कुल	41088	14738	14631	107	1784	1946	501	3	136	0	9	33354	
उदयपुर क्षेत्र														
28.	बांसवाड़ा	19429	5110	5104	6	589	670	0	1	115	0	0	5350	
29.	चित्तौड़गढ़	13289	5745	5733	12	440	1104	349	6	103	0	0	8953	
30.	झुंरपुर	25674	7763	7705	58	249	973	0	0	115	0	2	9998	
31.	राजसमन्द	13811	5637	5632	5	110	1072	0	0	76	5	0	10968	
32.	उदयपुर	36291	12267	12259	8	546	2751	0	0	211	0	0	15189	
33.	प्रतापगढ़	14763	5636	5618	18	206	1197	12	2	63	28	0	8220	
	कुल	123257	42158	42051	107	2140	7767	361	9	683	33	2	58678	
	कुल योग	407004	167375	166327	1048	17608	36753	1438	60	1647	521	147	224751	

42वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2018-19 (1.4.2018 से 31.12.2018 तक) (शहरी)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल संचालित हैण्डपम्पों की संख्या	रिपेयर किए जाने वाले हैण्डपम्पों की संख्या	परिवर्तित हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौसम से ठंडा हैण्डपम्पों की संख्या	आमिया में लगे अभियान से लगे		प्रयोग में लाया गया पाइप (मीटर में)		
									फिटर	सिमेंटी		संख्या	
अजमेर क्षेत्र													
1.	अजमेर	5043	4219	4184	35	56	71	2	1	1	11	3	3692
2.	भीलवाड़ा	2939	4203	4177	26	46	43	25	0	0	3	1	1356
3.	नागौर	110	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4.	टोंक	1179	1643	1633	10	47	51	0	0	0	0	0	1611
	कुल	9271	10074	10003	71	149	165	27	1	1	14	4	6671
बीकानेर क्षेत्र													
5.	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	श्रीगंगानगर	246	193	193	0	6	0	0	2	2	2	0	46
7.	हनुमानगढ़	403	213	210	3	40	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	649	406	403	3	46	0	0	2	2	2	0	46
चूरू क्षेत्र													
8.	चूरू	161	37	36	1	40	5	0	0	0	0	0	132
	कुल	161	37	36	1	40	5	0	0	0	0	0	132
भरतपुर क्षेत्र													
9.	भरतपुर	922	663	627	36	160	91	2	1	0	15	0	289
10.	धौलपुर	676	563	556	7	9	8	0	0	0	4	0	723
11.	करौली	255	124	124	0	70	87	0	0	0	4	0	198
12.	सवाईमाधोपुर	752	969	963	6	40	28	0	0	0	0	0	2753
	कुल	2605	2319	2270	49	279	214	2	1	0	23	0	3963
अलवर क्षेत्र													
13.	अलवर	816	91	89	2	181	354	0	0	1	0	0	213
	कुल	816	91	89	2	181	354	0	0	1	0	0	213
जयपुर I क्षेत्र													
14.	दौसा	991	912	912	0	21	86	0	0	0	0	0	1587
15.	झुंझुनू	422	60	59	1	72	137	0	2	5	14	3	96
16.	सीकर	244	19	6	13	48	109	3	0	0	0	0	6
	कुल	1657	991	977	14	141	332	3	2	5	14	3	1689

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल हैलपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैलपम्पों की संख्या	कुल सुधार गये हैलपम्पों की संख्या	रियेयर किये जाने वाले खराब हैलपम्पों की संख्या	परिवहन गये हैलपम्पों की संख्या	सुधरे पाये गये हैलपम्पों की संख्या	कुल मौके से हट गये हैलपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहन की संख्या	प्रयोग में लाये गये पाइप (मीटर में)
									फिटिंग	सिस्टी	हैलर		
जयपुर II क्षेत्र													
17.	जयपुर	2911	3022	3013	9	339	241	22	2	0	4	1	5056
कुल		2911	3022	3013	9	339	241	22	2	0	4	1	5056
जोधपुर I क्षेत्र													
18.	जोधपुर	2534	949	913	36	1	0	0	3	2	34	2	0
19.	पाली	1751	1714	1681	33	45	78	0	0	3	5	2	528
कुल		4285	2663	2594	69	46	78	0	3	5	39	4	528
जोधपुर II क्षेत्र													
20.	बाड़मेर	55	103	103	0	0	0	0	0	0	1	1	110
21.	जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	जालौर	133	126	124	2	13	24	0	0	0	9	2	198
23.	सिरोही	1176	507	507	0	18	23	0	0	0	0	0	945
कुल		1364	736	734	2	31	47	0	0	0	10	3	1253
कोटा क्षेत्र													
24.	बारों	1079	593	592	1	37	17	24	0	0	0	0	1965
25.	बून्दी	625	1175	1170	5	0	5	0	0	0	0	0	2736
26.	झालावाड़	889	532	532	0	21	25	5	0	0	0	0	1170
27.	कोटा	847	613	613	0	7	0	0	0	0	6	1	819
कुल		3440	2913	2907	6	65	47	29	0	0	6	1	6690
उदयपुर क्षेत्र													
28.	बांसवाड़ा	520	198	198	0	7	0	0	0	0	0	0	189
29.	चित्तौड़गढ़	666	443	443	0	18	48	18	0	0	0	0	575
30.	झुंझारपुर	834	703	692	11	1	36	0	0	1	2	0	582
31.	राजसमन्द	650	439	439	0	5	5	0	0	0	0	0	1443
32.	उदयपुर	3361	2593	2586	7	65	123	0	0	0	3	1	1350
33.	प्रतापगढ़	372	291	285	6	17	30	1	1	4	0	0	440
कुल		6403	4667	4643	24	113	242	19	1	5	5	1	4579
कुल योग		33562	27919	27669	250	1430	1725	102	12	19	117	17	30820

वर्ष 2017-18 व 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित नलकूपों/हैण्डपम्पों/सिंगल फेज नलकूपों की संख्या

क्र. स.	जिला	नलकूपों की संख्या				सिंगल फेज नलकूपों की संख्या				हैण्डपम्पो की संख्या			
		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
		17-18	18-19 (दि. 18 तक)	17-18	18-19 (दि. 18 तक)	17-18	18-19 (दि. 18 तक)	17-18	18-19 (दि. 18 तक)	17-18	18-19 (दि. 18 तक)	17-18	18-19 (दि. 18 तक)
अजमेर क्षेत्र													
1	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	86	74	161	457
2	भीलवाडा	0	0	7	3	0	0	0	0	28	90	207	396
3	नागौर	33	2	285	205	7	0	75	12	0	1	244	374
4	टोंक	7	2	7	3	1	0	5	1	0	13	114	300
अलवर क्षेत्र													
5	अलवर	37	62	190	206	0	0	59	4	12	7	687	504
भरतपुर क्षेत्र													
6	भरतपुर	17	12	72	29	8	0	68	11	33	41	400	533
7	धौलपुर	7	1	7	2	0	0	0	0	15	9	136	167
8	करौली	5	0	78	6	0	0	0	0	4	1	186	183
9	सवाईमाधोपुर	6	6	15	28	0	0	11	11	4	16	113	181
बीकानेर क्षेत्र													
10	बीकानेर	7	0	48	14	0	0	3	0	0	0	60	90
11	श्रीगंगानगर	1	4	11	85	0	0	0	0	0	0	45	56
12	हनुमानगढ़	18	7	5	85	0	0	0	0	25	29	96	205
चूरु क्षेत्र													
13	चुरु	25	21	109	43	0	0	0	0	0	0	30	28
जयपुर I क्षेत्र													
14	दौसा	31	33	60	52	0	0	0	0	9	16	126	130
15	झुंझुनू	54	42	284	175	0	0	4	0	2	0	95	180
16	सीकर	18	41	159	211	0	0	0	0	0	0	145	239
जयपुर II क्षेत्र													
17	जयपुर	170	363	109	181	7	3	0	0	11	2	351	363
जोधपुर I क्षेत्र													
18	जोधपुर	5	29	318	149	0	0	1	0	61	91	118	138
19	पाली	6	0	54	34	0	0	0	0	0	0	308	453
जोधपुर II क्षेत्र													
20	बाड़मेर	0	0	86	101	0	0	44	28	0	0	307	778
21	जैसलमेर	0	0	68	14	0	0	0	0	0	0	206	148
22	जालौर	13	3	68	48	0	0	45	77	5	5	69	132
23	सिरोही	0	0	0	1	0	0	0	0	12	34	67	103
कोटा क्षेत्र													
24	बारों	1	0	15	3	0	0	23	0	0	10	100	178
25	बून्दी	0	2	63	27	0	0	0	0	12	5	113	73
26	झालावाड़	0	0	12	10	0	0	17	6	20	22	134	99
27	कोटा	0	0	3	0	0	0	37	4	9	12	138	118
उदयपुर क्षेत्र													
28	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	131
29	चित्तौड़गढ़	0	0	59	14	0	0	0	0	0	0	72	297
30	डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	183
31	राजसमन्द	0	0	3	1	0	0	0	0	28	13	76	176
32	उदयपुर	6	2	8	9	0	0	16	0	1	15	263	527
33	प्रतापगढ़	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	44	116
योग		468	632	2205	1740	23	3	408	154	377	506	5473	8036

वृहद् पेयजल योजनाओं का विवरण

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि रु. करोड़ में	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज शहर	ग्राम	दाणियां	शहर	ग्राम	दाणियां
(अ) पूर्ण परियोजनाएं												
क्षेत्र अजमेर												
1	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना केकडी-सरवाड़ क्षेत्र- प्रथम चरण	26/7/1994	44.35	42.73	0.00	42.73	बीसलपुर बांध			94	
2	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना नसीराबाद क्षेत्र-प्रथम चरण	7/6/1999	61.03	54.16	0.00	54.16	बीसलपुर बांध			61	
3	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना नसीराबाद क्षेत्र-द्वितीय चरण	PPC 160/ 11.01.05	11.53	13.25	0.00	13.25	बीसलपुर बांध			49	54
4	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा (प्रथम चरण) पाईप लाईन जुनिया से सरवाड़	10/7/1999	53.86	52.02	0.00	52.02	बीसलपुर बांध	1	13		
5	अजमेर	अजमेर बीसलपुर परियोजना -द्वितीय चरण के अन्तर्गत सरवाड़ नसीराबाद योजना	4/3/2007	99.75	81.24	0.00	81.24	बीसलपुर बांध				
6	अजमेर	सेप्टी मेजर कार्य अजमेर बीसलपुर परियोजना	PPC 160/ 11.01.05	26.52	21.16	0.00	21.16	बीसलपुर बांध				
7	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा क्षेत्र द्वितीय चरण	PPC 156/ 23.07.04	91.18	47.08	0.00	47.08	बीसलपुर बांध			123	29
8	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना केकडी-सरवाड़ द्वितीय चरण	PPC 155/ 12.07.04	32.62	36.97	0.00	36.97	बीसलपुर बांध			49	69
9	भीलवाड़ा	संवर्धन शहरी जल योजना भीलवाड़ा (कंकरोलिया घाटी)	1/5/2002	29.13	28.22	0.00	28.22	कंकरोलिया घाटी क्षेत्र नलकूप			7	
10	अजमेर	शहरी संवर्धन जल परियोजना ब्यावर (यूआईएसएसएमटी)	28/5/2008	49.79	43.29	0.00	43.29	बीसलपुर बांध				
11	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना	13/10/2008	152.49	143.43	0.00	143.43	बीसलपुर बांध			171	348
अराई-किशनगढ़ परियोजना												
12	अजमेर	अजमेर-बीसलपुर -द्वितीय चरण	25/5/2005	411.53	345.89	0.07	345.96	बीसलपुर बांध	7			
13	नागौर	मातासुख माईन्स से जायल हेतु डीसेलिनेटेड पेयजल योजना	13.07.07	124.37	136.02	0.00	136.02	मातासुख माईन्स			120	

14	नागौर	शहरी संवर्धन जल परियोजना मकराना (यूआईएसएसएमटी)	28/5/2008	48.70	41.72	0.00	41.72	नलकूप						
15	अजमेर	एफ.सी.पी. अजमेर पीसांगन	13-10-2008	221.34	188.25	-1.27	186.98	बीसलपुर बांध	0	113	114	0	112	170
16	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा क्षेत्र तृतीय चरण	14/02/2004	74.65	74.08	0.00	74.08	बीसलपुर बांध		124	93		124	90
17	अजमेर	अजमेर पुष्कर पेयजल योजना (जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत)	28/12/2007	166.42	151.87	0.25	152.12	बीसलपुर बांध						
18	भीलवाड़ा	चम्बल भीलवाड़ा परियोजना	"PPC 187/27.09.11 Rev PPC 199/28.06.17.FC 736/03.01.18."	913.80	757.86	19.02	776.88	चम्बल नदी	1	0	0	1	0	0
19	अजमेर	किशनगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन का कार्य	PPC 196/20.10.15	77.29	54.43	0.88	55.31	बीसलपुर बांध	0			0		
		योग		2690.35	2313.67	18.95	2332.62		9	924	707	9	920	760
क्षेत्र चूरू														
20	चुरू-झुन्झुनु	आपणी योजना-प्रथम चरण	1/11/2005	429.65	414.45	0.00	414.45	ई.गां.नहर	2	376	40	2	362	40
21	चुरू-झुन्झुनु	चूरू-बिसाउ परियोजना	1/5/1998	119.04	108.57	0.00	108.57	ई.गां.नहर	3	169		3	96	
22	श्रीगंगानगर	टिब्बा क्षेत्र सूतगढ़ की जलप्रदाय योजनाए	13/7/2007	31.74	29.25	0.00	29.25	कवरसेन लिफ्ट नहर		46			46	
23	बीकानेर	कोलायत जलप्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट)	13/7/2007	96.00	73.00	0.00	73.00	गजनेर लिफ्ट		45	17		45	17
24	बीकानेर	कोलायत जलप्रदाय योजना (कोलायत लिफ्ट)	13/7/2007	106.00	101.48	0.00	101.48	कोलायत लिफ्ट नहर		63	71		62	71
25	चुरू-झुन्झुनु	बंगी राजगढ़ परियोजना	PPC188/24.8.12	415.64	262.37	9.54	271.91	ई.गां.नहर	1	188		1	183	60
		योग		1198.07	989.12	9.54	998.66		6	887	128	6	794	188
क्षेत्र कोटा														
26	कोटा	रामगंज मण्डी-पचपहाड़ जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC 180 / 13.10.08	196.00	185.19	0.00	185.19	राणा प्रताप सागर	3	220		3	220	
27	झालावाड़	छापी-झालावाड़-झालरापाटन जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC 186 / 24.12.10"	106.23	92.82	0.00	92.82	छापी बांध	2			2		
28	झालावाड़	क्लस्टर वितरण प्रणाली-छापी-झालावाड़-झालरापाटन	PPC 174/01.02.07	91.37	96.94	0.00	96.94	छापी बांध		235			235	
29	झालावाड़	गुलण्डी जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC191/19.09.13"	53.50	51.28	0.00	51.28	गुलण्डी बांध		77			77	
30	झालावाड़	कालीखाड़ जलप्रदाय योजना	13/7/2007	61.61	63.24	0.00	63.24	कालीखाड़ बांध		70			70	
31	कोटा	कोटा शहर में वितरण प्रणाली पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य (आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा छोड़े गये कार्य)	संशोधित 19/3/2007	48.24	34.21	0.00	34.21	चम्बल नदी						

वृहद् पेयजल योजनाओं का विवरण

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि रु. करोड़ में	मार्च, 2018 तक कुल व्यय	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज शहर	ग्राम	दागियां	शहर	ग्राम	दागियां
32	झालावाड़	ग्रामीण जल प्रदाय योजना रेवा (झालावाड़)	" 30-12-07Rev 194/09.12.14"	66.29	63.19	0.00	63.19	रेवा बांध		49	5		49	12
33	झालावाड़	भीमनी पेयजल परियोजना जिला झालावाड़	PPC 187/ 27.09.11	30.80	25.05	0.07	25.12	भीमनी बांध		30	14		30	14
34	झालावाड़	माधवी पेयजल परियोजना जिला झालावाड़	PPC 187/ 27.09.11	30.87	22.29	0.00	22.29	माधवी बांध		32	3		32	3
35	झालावाड़	पीपलाद पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	32.84	27.65	0.09	27.74	पीपलाद बांध	2	14		2	14	
36	बूंदी	चम्बल-बूंदी पेयजल परियोजना	संशोधित PPC188/24.08.12"	74.37	49.46	0.75	50.21	चम्बल नदी	1			1	0	
37	बारों	नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना जिला बारों	संशोधित PPC188/24.08.12"	78.98	71.35	1.46	72.81	काली सिन्ध नदी	1	42	8	1	42	8
		योग		871.10	782.66	2.38	785.04		9	769	30	9	769	37
क्षेत्र जोधपुर														
38	जोधपुर	इन्दोका-माणकलाव-खांगटा	PPC 187/ 27.09.11	111.82	107.05	0.00	107.05	आरजीएलसी		64			64	
39	जोधपुर	उम्मेदसागर-धाहवा-समदही पार्ट-प्रथम एवं द्वितीय	PPC 169/ 29.05.06	64.76	71.08	0.00	71.08	उम्मेद सागर बांध		69	130		69	130
40	जोधपुर	राजीव गांधी लिफ्ट परियोजनाफेज-द्वितीय	4/3/2007 संशोधित	137.21	152.51	0.00	152.51	ई.गां.नहर						
41	जोधपुर	कुड़ी-लूणी-सालावास	30/3/2006	30.86	32.55	0.00	32.55	आरजीएलसी		34	69		34	69
42	जालौर	नर्मदा वाटर सप्लाई सिल्लु-जैसला-भक्ति योजना	20/05/2006	1.61	1.63	0.00	1.63	नर्मदा नहर		22	58		22	58
43	जोधपुर	केरु-बेरु-जोलियाली पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय	13/7/2007	32.01	30.66	0.00	30.66	आरजीएलसी		32	183		32	174
44	जैसलमेरबाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना	संशोधित 1/2/2007	688.66	726.16	0.00	726.16	ई.गां.नहर	1			1		
45	पाली	जवाई पाइपलाइन परियोजना-द्वितीय चरण (भाग-प्रथम)	PPC 187/ 27.09.11	199.40	146.74	0.25	146.99	जवाई हेमावास बांध	1	111		1	111	
46	जोधपुर	खुड़ीयाली-जियाबेरी-आगोलाई	1/2/2007	74.38	76.98	0.00	76.98	आर.जी.एल.सी		77	0		77	
47	जालौर	सुटूबीकरण शहरी पेयजल परियोजना जालौर	संशोधित PPC 190 / 30.05.13"	62.20	58.14	0.00	58.14	नर्मदा नहर	1	14		1	14	
48	जोधपुर	मल्लार जोड़-हिंडालगोल, फलौदी	SLSSC 8th/ 5.9.12	35.97	24.21	0.02	24.23	आर.जी.एल.सी		10			10	

49	जोधपुर	कानसिंह की सिद-मण्डोर परियोजना, फलौदी	SLSSC 8th/ 5.9.12	36.02	28.05	0.04	28.08	आर.जी.एल.सी	16			16	
50	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना आरजीएलसी आरडी-42 घाटौर-कानासर-बाप	PPC 190 / 30.05.13	88.95	68.86	0.04	68.90	आर.जी.एल.सी	25			25	
51	जालौर	नर्मदा डी.आर. परियोजना - Transmission System	संशोधित PPC188/24.08.12"	218.34	126.60	0.63	127.23	नर्मदा नहर	1			1	
52	जोधपुर	इन्दोका-माणकलाव-दातीवाड़ा	17/08/2006	308.00	322.15	1.41	323.56	आर.जी.एल.सी	2			2	119
53	जोधपुर	तिवरी-मथानिया-ऑसिया-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना	संशोधित 2@2010½	430.06	355.64	0.46	356.10	आर.जी.एल.सी	113	950		113	951
54	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स - भौरी-कलां-खारा - जालौड़ा	PPC 190 / 30.05.13	120.81	115.77	0.03	115.80	आर.जी.एल.सी	43			43	
55	जोधपुर	आरजीएलसी से पिलवा-सादडी जम्बेश्वर नगर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	PPC 191 / 19.09.13	63.78	43.75	0.00	43.76	आर.जी.एल.सी	15			15	
56	जोधपुर	देवानिया-नाथरु-शेरगढ़-खबा-फेज-प्रथम एवं द्वितीय पेयजल परियोजना	11/10/2007	234.46	202.62	0.79	203.41	आर.जी.एल.सी	264	0		264	
		योग		2939.30	2691.15	3.67	2694.82		6	1028	1390	6	1048 1382
क्षेत्र उदयपुर													
57	उदयपुर	मानसी वाकल परियोजना-प्रथम चरण	11/6/2001	42.00	41.59	0.00	41.59	मानसी वाकल बांध	1			1	
58	उदयपुर	स्ट्रेथिंग ऑफ यूडब्ल्यू.एस.एस., उदयपुर (यूआईडी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत)	SLSSC dt. 15.02.07	55.57	47.63	0.00	47.63						
59	राजसमन्द एवं उदयपुर	बघेरी का नाका परियोजना	24/8/2012 संशोधित	204.59	210.34	0.00	210.34	बनास नदी	206				206
60	झुंजारपुर	क्षेत्रीय योजनाएँ आसपुर-झुंजारपुर-सागवाड़ा	13/10/2008	71.93	62.61	2.27	64.88	सोम कमला अम्बा बांध	61				61
61	उदयपुर	देवास परियोजना-द्वितीय चरण	3/12/2007	379.19	354.54	4.04	358.58	आकोदेरा व मादडी बांध					
62	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	141.00	136.17	0.00	136.17	सुरवाणिया बांध	0	82	0	0	82 0
		योग		894.28	852.87	6.31	859.18		1	349	0	1	349 0
क्षेत्र भरतपुर													
63	धौलपुर	डांग एरिया जलप्रदाय परियोजना (भाग-प्रथम)	2/11/2004	19.84	18.27	0.00	18.27	पार्वती नदी	12				12
	धौलपुर	डांग एरिया जलप्रदाय परियोजना (भाग-द्वितीय)	संशोधित PPC 190 / 30.05.13"	103.38	93.15	0.00	93.15	पार्वती नदी	0	82	0	0	82 61
		योग		123.22	111.42	0.00	111.42		0	94	0	0	94 61

वृहद् पेयजल योजनाओं का विवरण

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि रु. करोड़ में	मार्च, 2018 तक कुल व्यय	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज शहर	ग्राम	दागियां	शहर	ग्राम	दागियां
क्षेत्र जयपुर													
64	नागौर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील (बीसलपुर-दूद परियोजना से)	संशोधित PPC-188/24.08.12"	128.72	85.11	9.08	बीसलपुर बांध	0	72	161	0	97	161
65	जयपुर	200 एम.एल.डी. क्षमता का जलशोधन संयंत्र का सूरजपुरा पर निर्माण	संशोधित PPC-190 / 30.05.13	150.53	120.30	0.00	बीसलपुर बांध						
66	जयपुर	बीसलपुर दूद परियोजना (वाकसू परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	254.45	216.14	0.00	बीसलपुर बांध	0	276	508	0	276	508
67	जयपुर	बीसलपुर दूद परियोजना (बस्सी परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	299.55	229.24	-0.28	बीसलपुर बांध	0	210	1473	0	210	1473
68	टोंक	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना निवाई तथा टोंक तहसील (बीसलपुर-टोंक अनियारा परियोजना से)	संशोधित PPC-188/24.08.12"	112.88	110.94	0.46	बीसलपुर बांध	0	212	558	0	212	558
		योग		946.13	761.73	9.26		0	770	2700	0	795	2700
विभिन्न जिलों की परियोजना													
69	जयपुर-टोंक-सवाईमाधोपुर	ईसरदा बांध परियोजना	3/4/2007	44.51	35.66	0.00	ईसरदा बांध						
70	राजस्थान के सभी जिलें	राजस्थान एकीकृत फ्लोइड निवारण परियोजना चरण- प्रथम	6/11/2007	33.80	15.54	0.00		2643				2643	
		योग		78.31	51.20	0.00		0	0	0	0	0	0
	रूप-योग पूर्ण परियोजनाएं			9740.76	8553.82	50.10		31	4821	4955	31	4769	5128
(ब) प्रगतिस्त परियोजनाएं													
क्षेत्र नागौर													
71	नागौर	नागौर लिफ्ट योजना चरण- प्रथम	Rev PPC 197/ 25.04.16	1194.26	877.74	64.81	ई.गाँ.नहर	5	502	0	5	271	0
72	नागौर	नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण	PPC 188/24.08.12	2938.00	1613.29	313.88	ई.गाँ.नहर	7	986	1063	7	340	0
		योग		4132.26	2491.03	378.69		12	1488	1063	12	611	0

क्षेत्र अजमेर														
73	अजमेर	कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर	PPC 190 / 30.05.13	231.46	122.66	53.97	176.63	बीसलपुर बांध	0	199	390	0	90	75
74	भीलवाडा	चम्बल भीलवाडा कलस्टर परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	1495.68	1004.61	238.16	1242.77	चम्बल नदी	8	1688	0	3	646	0
	योग			1727.14	1127.26	292.14	1419.40		8	1887	390	3	736	75
क्षेत्र कोटा														
75	कोटा	बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना जिला कोटा	PPC 187/ 27.09.11	118.04	62.26	6.71	68.97	चम्बल नदी		60	21		60	21
	बूंदी	चम्बल-बूंदी कलस्टरपेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	15.45	4.43	0.01	4.43	चम्बल नदी		19			0	
76	बारां	बारां कलस्टर परियोजना	Rev PPC 197/ 25.04.16	76.76	31.97	18.73	50.70	पार्वती नदी	0	50	16	0	0	0
77	झालावाड़	गागरीन पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13 Revised 192/28.07.14	351.48	220.21	35.91	256.12	गागरीन बांध	0	315	36	0	298	36
78	बारां	अटल शेरागढ पेयजल परियोजना	PPC 197/25.04.16	89.69	38.26	15.44	53.70	परवन नदी	3	24	7	0	0	0
79	झालावाड़	राजगढ पेयजल परियोजना 06.07.18"	"PPC 196/20.10.15Revise 149.31	39.68	86.65	126.33		राजगढ बांध	0	54	15	0	54	15
80	बूंदी	इन्द्रगढ पेयजल परियोजना	PPC 199/ 28.06.17	73.93	13.14	28.98	42.12	चाकन बांध	2	45	6	0	0	0
81	बूंदी	चम्बल-बूंदी कलस्टर पेयजल परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाडा परियोजना से)	PPC 199/ 28.06.17	80.80	6.72	28.90	35.61	चम्बल नदी	0	34	25	0	0	0
82	बारां	अता-मांगरोल तहसील जिला बारां की	PPC 199/ 28.06.17	105.15	14.00	12.82	26.82	काली सिन्ध नदी	0	47	7	0	0	0
		सोनवा पेयजल परियोजना												
	योग			1060.61	430.67	234.13	664.81		5	648	133	0	412	72
क्षेत्र जोधपुर														
83	जोधपुर	जोधपुर शहर संवर्धन योजना	PPC 190 / 30.05.13 (Revised)	740.50	426.95	36.92	463.87	आर.जी.एल.सी	1	0	0	0	0	0
84	जालौर	नर्मदा परियोजना बागोर-आहोर-जालौर	02-01-2007Rev 194/09.12.14"	380.17	349.62	-0.88	348.74	नर्मदा नहर	0	0	0	0	0	0
85	बाड़मेर	उम्मेदसागर-धाहवा-समदही-खण्डप पार्ट-II	Rev PPC 187/27.09.11	575.46	402.82	3.13	405.95	उम्मेद सागर बांध	1	180	0	1	180	0
86	(जिसलमेर बाड़मेर)	पोकरण-फलसूण्ड परियोजना	Rev PPC 187/27.09.11	1454.20	1346.18	167.25	1513.43	ई.गां.नहर	3	563	0	1	178	0
87	पाली	जवाई पाइपलाइन परियोजना	10-11-2007 संशोधित	634.79	396.63	31.32	427.95	जवाई हेमावास बांध	7	235	0	7	235	0
88	बाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण	PPC 187/27.09.11	202.36	66.78	0.09	66.87	ई.गां.नहर	0	171	0	0	86	0
89	बाड़मेर	नर्मदा-गुडामलानी पेयजल परियोजना	संशोधित PPC188/24.08.12"	160.00	94.04	7.01	101.05	नर्मदा नहर						
90	बाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - कलस्टर पार्ट-B	PPC188/ 24.8.12	125.00	72.58	6.61	79.19	आर.जी.एल.सी	0	67	0	0	55	0

राशि रुपये करोड़ में

वृहद् पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि रु. करोड़ में	मार्च, 2018 तक कुल व्यय	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज शहर	ग्राम	दागियां	शहर	ग्राम	दागियां
91	जालौर	नर्मदा नहर में पेयजल की हिस्सा राशि:	PPC 190 / 30.05.13	236.65	144.74	21.45	166.19	नर्मदा नहर						
92	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना पांचला घेवरा चिराई	PPC 190 / 30.05.13	396.63	262.25	31.06	293.31	आर.जी.एल.सी	0	59	892	0	13	129
93	बाडमेर	बाडमेर जिले की शिव एवं गुडामालानी तहसील की जलप्रदाय योजना	PPC 191 / 19.09.13	610.79	197.21	52.65	249.86	नर्मदा नहर	0	205	0	0	0	0
94	पाली	जवाई पाली योजना, फेज-द्वितीय, पार्ट-द्वितीय	PPC 190 / 30.05.13	366.96	283.63	6.45	290.08	जवाई हेमावास बांध	2	215	0	0	82	0
95	जालौर	नर्मदा एफ.आर. कलस्टर	PPC 191 / 19.09.13	509.20	134.20	114.84	249.04	नर्मदा नहर	0	267	0	0	70	0
96	जालौर	नर्मदा डी.आर. कलस्टर	PPC 191 / 19.09.13	263.50	82.88	40.61	123.49	नर्मदा नहर	0	138	0	0	44	0
97	जालौर	भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	PPC 191 / 19.09.13	455.16	176.04	37.71	213.75	नर्मदा नहर	1	256	0	0	0	0
98	बाडमेर	बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - कलस्टर पार्ट-C	PPC 191 / 19.09.13	700.00	43.19	91.30	134.49	आर.जी.एल.सी	0	286	0	0	0	0
	जैसलमेर	बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - कलस्टर पार्ट- D	PPC 191 / 19.09.13	451.27	210.37	44.68	255.05	आर.जी.एल.सी	0	171	0	0	0	0
99	पाली	जवाई कलस्टर परियोजना, पार्ट- चतुर्थ	"PPC 202/26.03.18FC 745/ 16-18.06.18"	476.00	0.00	0.00	0.00	जवाई हेमावास बांध	0	224	121	0	0	0
		योग		8738.64	4690.09	692.22	5382.31		15	3037	1013	9	943	129
क्षेत्र उदयपुर														
100	बांसवाड़ा-प्रतापगढ़	बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना	संशोधित PPC 191 / 19.09.13	560.00	379.65	64.84	444.49	माही बांध	0	334	0	0	140	0
101	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन का कार्य	PPC 195/09.07.15	94.07	52.13	7.48	59.61	जखम बांध	1	0	0	0	0	0
102	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ पं.सं. के 399 गाँवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना	"PPC 200/04.10.17FC 736/03.01.18"	798.35	0.00	0.00	0.00	माही बांध	0	399	395	0	0	0
103	झुंझपुर	आसपुर, दोवडा एवं झुंझपुर पेयजल परियोजना	"On File MR/608 /14.05. 18FC 745/16-18.06.18"	365.00	0.00	0.00	0.00	सोम कमला बांध	0	151	244	0	0	0
		योग		1817.42	431.78	72.32	504.10		1	884	639	0	140	0

क्षेत्र जयपुर														
104	जयपुर टॉक	बीसलपुर-दूह-फुलेरा पेयजल परियोजना	11/10/2007	678.87	598.67	-4.77	593.90	बीसलपुर बांध	9	718	2017	9	686	1602
105	जयपुर	जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना	7/10/1999	580.00	526.72	0.00	526.72	बीसलपुर बांध	1			1		
106	टॉक	बीसलपुर-टॉक-अनियारा-Deoli परियोजना	PPC188/ 24.8.12	542.11	400.73	22.60	423.33	बीसलपुर बांध	3	436	819	3	125	150
107	जयपुर	बीसलपुर दूह परियोजना (फागी परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	217.24	152.62	11.64	164.26	बीसलपुर बांध	0	161	266	0	118	85
	योग			2018.22	1678.74	29.47	1708.21		13	1315	3102	13	929	1837
क्षेत्र चुरू														
108	चुरू	आपणी योजना - द्वितीय चरण (स्तनगढ़-सुजानगढ़ सैक्शन)	संशोधित PPC 190 / 30.05.13"	971.21	802.81	14.21	817.02	ई.गां.नहर	5	256	326	2	48	33
109	सीकर	फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना	PPC188/ 24.8.12	832.00	651.60	21.74	673.34	ई.गां.नहर	3	283	13	1	14	0
110	झुन्झुनू	इ.गा.न.प. से एकिकृत तारानगर-झुन्झुनू सीकर खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	954.74	953.43	13.32	966.75	इ.गा.न.प.	5	258	811	5	258	780
	योग			2757.95	2407.85	49.26	2457.11		13	797	1150	8	320	813
क्षेत्र भरतपुर														
111	धौलपुर-भरतपुर	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना-प्रथम चरण भाग-प्रथम	PPC 189/ 28.01.13 संशोधित	548.69	351.22	27.09	378.31	चम्बल नदी	1	199		1	92	17
112	सवाईमाधोपुर	चम्बल-सवाईमाधोपुर नांदौती परियोजना -प्रथम चरण	"PPC 191 / 19.09.13 संशोधित	567.00	361.68	30.16	391.84	चम्बल नदी	1	636	2	1	0	
113	भरतपुर	डीग नगर कामां पहाड़ी पाइपलाइन परियोजना भरतपुर कुम्हेर डीग पाइपलाइन परियोजना	PPC188/ 24.8.12	311.49	88.61	80.60	169.21	चम्बल नदी	4	97		0	20	4
114	भरतपुर	चम्बल-भरतपुर कलस्टर परियोजना -प्रथम चरण भाग-द्वितीय	PPC 190 / 30.05.13	720.31	183.29	64.03	247.32	चम्बल नदी		755		0	22	17
	योग			2147.49	984.80	201.88	1186.68		6	1687	0	2	135	38
	उप-योग प्रगतिरत परियोजनाएं			24399.73	14242.22	1950.12	16192.34		73	11743	7490	47	4226	2964
(स) प्रगति रत फिजिबिलिटी स्टडीज														
क्षेत्र जयपुर														
115	जयपुर-अजमेर- टॉक	चम्बल-बीसलपुर लिंक परियोजना (Feasibility Study)"	SLSSC 2/11.11.10	2.50	0.36	0.00	0.36	चम्बल नदी						
116	अलवर	चम्बल से अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना (Feasibility Study)"	SLSSC 1/12-13 letter No. 127-144 dated 2.04.12	0.95	0.54	0.00	0.54	चम्बल नदी						

वृहद् पेयजल योजनाओं का विवरण

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि रु. करोड़ में	मार्च, 2018 तक कुल व्यय	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
								शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
117	जयपुर	जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना चरण द्वितीय डीपी0आर0 तैयार करना	PPC 193/02.08.14	2.78	0.92	0.00	बीसलपुर बांध				
118	राजस्थान के समस्त जिले	ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड -डीपी0आर0 समस्त जिले	PPC 197/25.04.16	3.84	2.05	0.00	2.05				
	तैयार करना	योग		10.07	3.87	0.00	3.87	0	0	0	0
(द) परियोजनाएं शुरू की जानी है											
क्षेत्र जयपुर											
119	दौसा - जयपुर	बनास के डाउन स्ट्रीम में इसरदा बांध का निर्माण (नल संशोधन विभाग के माध्यम से)	"PPC 191 / 19.09.13Rev PPC199/28.06.17"	1038.65	9.56	39.82	49.38				
	योग			1038.65	9.56	39.82	49.38	0	0	0	0
क्षेत्र कोटा											
120	झालावाड़ -	परवन पेयजल परियोजना-प्रथम चरण	"PPC 201/05.12.17FC 740/14.03.18"	220.05	0.00	0.00	परवन बांध		0		
121	बूंदी	झालीजी का बराना पेयजल परियोजना	"PPC 202/26.03.18FC 741/07.04.18"	109.29	0.00	0.00	मेज नदी		71	1	
122	बूंदी	गरड़दा पेयजल परियोजना	"On File MR/07.05.18FC 745/16-18.06.18"	182.86	0.00	0.00	गरड़दा बांध		116	91	
123	कोटा	हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना	"FC 746/13.07.18"	297.48	0.00	0.00	काली सिन्ध नदी		207	52	
124	बारां	कछवन पेयजल परियोजना तहसील छबड़ा, जिला बारां	"On File MR/06.07.18FC 747/03.08.18"	50.76	0.00	0.00	पार्वती नदी, कछवन देह		16	3	
	योग			860.44	0.00	0.00	0.00	0	410	147	0

क्षेत्र उदयपुर											
125	चितौडगढ़	भैसरोडगढ़ तहसील के 37 ग्रामों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	PPC 194/09.12.14	50.73	0.12	0.02	0.15	चम्बल नदी	38	17	
126	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट पं.सं. के 554 गाँवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना	"PPC 200/04.10.17FC 737/18.01.18"	918.32	2.20	0.00	2.20	जखम बांध	554		
	योग			969.05	2.32	0.02	2.35		0	592	17 0 0 0
क्षेत्र जोधपुर											
127	सिरोही	सिरोही जिले की पेयजल योजना हेतु बत्तीसा नाला पर जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण परियोजना की हिस्सा राशि	PPC 198/02.11.16	108.20	12.00	22.50	34.50	बत्तीसा नाला बांध	0	0	
	योग			108.20	12.00	22.50	34.50		0	0	
	रूप-योग परियोजनाएं निविदा के प्रक्रियाधीन			2976.34	23.88	62.34	86.23		0	1002	164 0 0 0
	महा-योग			37126.90	22823.79	2062.56	24886.36		104	17566	12609 78 8995 8092

वर्ष 2017-18 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलावार विवरण 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक

क्र. स.	जिले का नाम	कुल प्राप्त हुए	कुल निस्तारित	शेष
1	जयपुर	12105	12102	3
2	भीलवाड़ा	4107	4106	1
3	जोधपुर	5663	5662	1
4	बूंदी	1713	1713	0
5	बाड़मेर	4605	4604	1
6	भरतपुर	6561	6559	2
7	धौलपुर	2755	2754	1
8	नागौर	5875	5874	1
9	सीकर	3976	3976	0
10	सवाई माधौपुर	3965	3965	0
11	अलवर	5490	5490	0
12	उदयपुर	1812	1812	0
13	अजमेर	4967	4964	3
14	बीकानेर	2922	2921	1
15	बारा	2614	2613	1
16	हनुमानगढ़	2764	2764	0
17	दौसा	4864	4864	0
18	झुझुनू	2847	2847	0
19	करोली	2640	2639	1
20	चुरू	2599	2596	3
21	पाली	1318	1318	0
22	जालौर	1692	1691	1
23	टोंक	2670	2670	0
24	सिरोही	751	751	0
25	कोटा	1344	1344	0
26	श्री गंगानगर	1753	1753	0
27	राजसमंद	783	783	0
28	जैसलमेर	1703	1703	0
29	झालावाड़	1502	1502	0
30	चित्तोड़गढ़	880	880	0
31	प्रतापगढ़	466	466	0
32	बांसवाड़ा	457	457	0
33	डुंगरपुर	309	309	0
कुल योग		100472	100452	20

वर्ष 2018-19 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलावार विवरण 31 दिसम्बर 2018 तक

क्र. स.	जिले का नाम	कुल प्राप्त हुए	कुल निस्तारित	शेष
1	जयपुर	16651	16089	459
2	भीलवाड़ा	5099	4770	270
3	जोधपुर	9176	8631	441
4	बूंदी	1663	1648	8
5	बाड़मेर	7550	6964	452
6	भरतपुर	7032	6667	309
7	धौलपुर	2765	2684	45
8	नागौर	9135	8839	193
9	सीकर	5133	4874	235
10	सवाई माधौपुर	5301	5162	102
11	अलवर	6617	6266	328
12	उदयपुर	2361	2174	156
13	अजमेर	7649	7257	353
14	बीकानेर	4799	4490	272
15	बारा	2653	2573	70
16	हनुमानगढ़	5239	5125	64
17	दौसा	5545	5285	193
18	झुझनू	4006	3891	66
19	करोली	3068	2892	160
20	चुरू	4283	4062	196
21	पाली	2525	2338	147
22	जालौर	2110	1968	139
23	टोंक	4270	4181	61
24	सिरोही	973	915	54
25	कोटा	2144	2054	81
26	श्री गंगानगर	3323	3252	50
27	राजसमंद	1351	1291	45
28	जैसलमेर	2679	2428	215
29	झालावाड़	2379	2214	151
30	चित्तोड़गढ़	1261	1223	32
31	प्रतापगढ़	644	617	21
32	बांसवाड़ा	692	660	17
33	डुंगरपुर	344	332	4
कुल योग		140420	133816	5389

वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 (दिसम्बर 18 तक) स्वीकृत व पूर्ण जनता जल योजना के एक बारीय पुनरुद्धार कार्या का जिलावार विवरण

सं. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 (दिसम्बर 18 तक) में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय रुपये लाखों में
1	अलवर	234	2462.64	217	1511.59
2	बासवाडा	12	1107.81	9	113.85
3	बारा	13	602.83	10	375.77
4	बाडमेर	326	1067.08	326	650.88
5	भरतपुर	87	716.12	82	304.37
6	भीलवाडा	135	1271.79	135	1115.14
7	बूंदी	57	1040.34	54	519.37
8	चित्तौडगढ़	31	794.77	31	640.85
9	चुरू	40	321.2	37	251.51
10	दोसा	11	153.76	3	34.87
11	धौलपुर	8	144.11	8	85.00
12	डूंगरपुर	10	514.62	9	245.91
13	गंगानगर	221	16658.13	84	3924.45
14	जयपुर	178	4288.15	167	2523.43
15	जालोर	12	1.87	12	115.00
16	झालावाड	30	504.94	20	221.03
17	झुन्झुनू	60	400.74	65	254.74
18	जोधपुर	964	8099.47	955	5127.10
19	करौली	102	1294.71	96	758.07
20	कोटा	41	1062.37	38	412.78
21	नागौर	453	2010.75	436	1539
22	पाली	115	2348.63	111	1292.94
23	प्रतापगढ़	5	364.19	5	253.32
24	राजसमन्द	40	945.86	40	661.47
25	सवाईमाधोपुर	36	512.63	31	262.51
26	सीकर	109	1765.48	104	700.89
27	सिरोही	53	605.66	53	359.80
28	टोक	14	224.22	13	155.15
29	उदयपुर	32	1229.57	31	795.58
कुल		3429	52514.44	3182	25206.37

वर्ष 2017-18 व 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) में नगरीय एवं ग्रामीण जल योजनाओं से राजस्व प्राप्तियां एवं प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय

(राशि रु. लाखों में)

क्र. स.	वर्ष	सीवरेज योजनाओं से प्राप्तियां	सर्विस एवं सर्विस फीस से प्राप्तियां	नगरीय जल प्रदाय योजनाओं से प्राप्तियां		ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं		कुल ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं से प्राप्तियां
				जल संबंधों से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	जल संबंधों से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017-18	1417.20	0.00	42534.82	42534.82	11721.17	11721.17	55673.19
2	2018-19 (दिसम्बर 18 तक)	58.93	0.00	31163.22	31163.22	7784.56	7784.56	39006.71

क्र. स.	वर्ष	अन्य प्राप्तियां	कुल योग प्राप्तियां	नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय				ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय	कुल ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं पर व्यय
				प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय	बीमा ऋण पर ब्याज	कुल व्यय		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2017-18	6764.12	62437.31	146464.99	537.98	0.00	147002.97	143696.54	290699.51
2	2018-19 (दिसम्बर 18 तक)	1436.70	40443.41	117377.82	0.00	0.00	117377.82	123920.27	241297.99

परिशिष्ट-18

विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	चयन का आधार
1.	मुख्य अभियंता	07	03	100 प्रतिशत पदोन्नति से
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	21	06	100 प्रतिशत पदोन्नति से
3.	अधीक्षण अभियंता	82	14	100 प्रतिशत पदोन्नति से
4.	अधिशाली अभियंता	398	60	100 प्रतिशत पदोन्नति से
5.	सहायक अभियंता	1535	762	50 प्रतिशत पदोन्नति से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से
7.	मुख्य रसायनज्ञ	01	00	100 प्रतिशत पदोन्नति से
8.	अधीक्षक रसायनज्ञ	04	00	100 प्रतिशत पदोन्नति से
9.	वरिष्ठ रसायनज्ञ	09	01	100 प्रतिशत पदोन्नति से
10.	कनिष्ठ रसायनज्ञ	37	08	50 प्रतिशत सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से
11.	जीव वैज्ञानिक	01	00	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से

वित्तिय वर्ष 2017-18 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-17 से मार्च-18 तक)

अनु. लागत लाख रु. में

क्र.सं.	ग्राम	शहरी योजनाएं				ग्रामीण योजनाएं				कुल ग्रामीण				कुल शहरी व ग्रामीण			
		स्टेट प्लान		स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान		(सस्टेनेबिलिटी)		(क्वालिटी) / (डीडीपी)		(नॉर्मल)		(सपोर्ट फण्ड)		(कवरेज)		कुल ग्रामीण	
		क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत
1	अजमेर	5	1272.13	12	3318.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	3318.61
2	अलवर	7	6129.22	5	844.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	844.70
3	बाडमेर	3	598.75	5	1824.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1824.29
4	बांसवाडा	0	0.00	3	80461.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	80461.85
5	बारा	0	0.00	4	10632.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10632.70
6	भरतपुर	0	0.00	4	879.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	879.37
7	भीलवाडा	0	6966.00	2	8114.26	0	0.00	0	0.00	0	3503.00	0	0.00	0	0.00	2	11617.26
8	बीकानेर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	बूंदी	0	0.00	6	14344.12	0	0.00	0	0.00	0	2272.00	0	0.00	0	0.00	6	16616.12
10	चित्तौड़गढ़	1	499.91	3	922.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	922.29
11	चूरु	2	985.99	8	2223.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	2223.46
12	दोसा	1	186.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	186.47
13	धौलपुर	0	0.00	2	497.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	497.66
14	झुंझारपुर	0	0.00	6	1516.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1516.95
15	हनुमानगढ़	1	362.92	12	3157.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	3157.11
16	जयपुर	17	16097.29	7	1784.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1784.55
17	जैसलमेर	1	195.00	3	343.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	343.14
18	जालौर	1	375.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	375.96
19	झालावाड़	1	15.68	5	1350.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1350.58

क्र.सं.	शहरी योजनाएं	ग्रामीण योजनाएं												कुल शहरी व ग्रामीण					
		स्टेट प्लान अरबन/ डेपारिशियेशन रिजर्व फण्ड/ कटीजेंसी / 13वाँ वित्त कमीशन		स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान		(सस्टेनेबिलिटी)		(क्वालिटी) / (डीडीपी)		(नॉर्मल)		(सपोर्ट फण्ड)				(कवररेज)		कुल ग्रामीण	
		क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत			क्र.सं.	लागत	क्र.सं.	लागत
20	झुंझुनू	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	जोधपुर	2	673.86	4	2823.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2823.97	6	3497.83
22	करौली	0	0.00	4	688.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	688.02	4	688.02
23	कोटा	5	2756.25	9	1760.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	1760.64	14	4516.89
24	नागौर	2	3260.32	2	613.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	613.96	4	3874.28
25	पाली	6	2695.15	9	5961.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	5961.82	15	8656.97
26	प्रतापगढ़	0	0.00	2	91839.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	91839.76	2	91839.76
27	राजसमंद	1	499.81	5	1050.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1050.87	6	1550.68
28	स.माधोपुर	0	0.00	4	700.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	700.65	4	700.65
29	सीकर	3	1433.55	2	586.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	586.25	5	2019.80
30	सिरोही	3	476.03	3	683.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	683.52	6	1159.55
31	श्रीगंगानगर	0	0.00	12	1834.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	1834.31	12	1834.31
32	टोंक	0	7677.00	4	22285.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	21594.00	0	0.00	4	43879.75	4	51556.75
33	उदयपुर	3	728.31	3	1522.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1522.89	6	2251.20
*	अन्य योजनाएं	1	5760.64	4	21315.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	21315.82	5	27076.46
योग		66	59646.24	154	285883.87	0	0.00	0	0.00	0	27369.00	0	0.00	0	0.00	154	313252.87	220	372899.11

* Transportation of water in non famine /partially famine affected habitation of 29 district of State during Summer 2017 from April 2017 to July 2017 for Rs.2035.44 lacs.

* Transportation of water in famine affected habitations of 4 districts namely Barmer, Jaisalmer, Jalore and Jhalawar of State during Summer 2017 from April 2017 to July 2017 for Rs. 643.90 lacs.

* Transportation of water in Urban Sector for 110 towns of the State during Summer 2017 from April 2017 to July 2017 for Rs. 1897.64 lacs.

* Transportation of water in Baran, Bundi, Jhalawar and Kota District of Kota Region from Dec., 2017 to March, 2018 for Rs. 494.48 lacs.

* A&F sanction for Ph-I of Parwan Water Supply Project from Parwan Dam, Distt. Kota, Baran & Jhalawar.

वित्तिय वर्ष 2018-19 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-18 से दिसम्बर-18 तक)

अनु. लागत लाख रु. में

क्र.सं.	विवरण	शहरी योजनाएं				ग्रामीण योजनाएं				कुल ग्रामीण				कुल शहरी व ग्रामीण			
		स्टेट प्लान		स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान		(सस्टेनेबिलिटी)		(क्वालिटी) / (डीडीपी)		(नॉर्मल)		(सपोर्ट फण्ड)		(कवरज)		कुल ग्रामीण	
		अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या	अनु.प्राप्ति	संख्या
1	अजमेर	1	1064.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1064.00
2	अलवर	3	2325.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2325.10
3	बाडमेर	0	0.00	1	245.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	245.54
4	बांसवाड़ा	0	0.00	1	124.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	124.68
5	बारा	0	0.00	1	5076.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5076.00
6	भरतपुर	0	0.00	4	1056.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1056.29
7	भीलवाड़ा	0	0.00	1	140.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	140.72
8	बीकानेर	1	622.55	1	165.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	787.99
9	बूंदी	0	0.00	4	29540.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	29540.29
10	चित्तौड़गढ़	0	0.00	1	774.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	774.88
11	चुरू	0	0.00	11	6058.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	6058.30
12	दोसा	1	100.00	2	282.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.26
13	धौलपुर	0	0.00	1	230.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	230.46
14	झुंझारपुर	0	5700.00	4	31370.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	37070.87
15	हनुमानगढ़	0	0.00	9	6509.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	6509.24
16	जयपुर	14	20028.10	1	413.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	20441.13
17	जैसलमेर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	जालौर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	झालावाड़	0	0.00	2	8235.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8235.47

क्र.सं.	शहरी योजनाएं	ग्रामीण योजनाएं										कुल ग्रामीण		कुल शहरी व ग्रामीण	
		स्टेट प्लान अरबन/ डेपारिश्मियेशन रिजर्व फण्ड/ कटीजेंसी/13वॉ वित्त कमीशन		स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान		(सस्टेनेबिलिटी)		(क्वालिटी)/ (डीडीपी)		(नॉर्मल)		(सपोर्ट फण्ड)		(कवररेज)	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
20	झुझनू	1	462.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	जोधपुर	1	475.25	1	155.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	155.76
22	करौली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	कोटा	5	2004.77	1	27368.00	0	0.00	0	2380.00	0	0.00	0	0.00	1	29748.00
24	नागौर	3	2243.45	1	160.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	160.06
25	पाली	0	0.00	4	47444.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1077.00	4	48521.18
26	प्रतापगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	राजसमंद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	स.माधोपुर	0	0.00	4	1371.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1371.60
29	सीकर	0	0.00	2	887.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	887.34
30	सिरोही	1	2.12	1	169.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	169.71
31	श्रीगंगानगर	1	546.73	9	2100.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	2100.04
32	टोंक	0	0.00	1	1186.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1186.63
33	उदयपुर	5	2398.95	3	845.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	845.82
	अन्य योजनाएं	1	1716.96	2	2872.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2872.99
	योग	38	39690.88	73	174785.60	0	0.00	0	2380.00	0	0.00	0	0.00	73	178242.60
														111	217933.48

- * Transportation of water in non famine/partially famine affected habitation of 30 district of State during Summer 2018 from April 2018 to July 2018 for Rs.2195.88 lacs
- * Transportation of water in famine affected habitation of 13 district of State during Summer 2018 from April 2018 to July 2018 for Rs. 677.11 lacs
- * Transportation of water in Urban Sector for 117 towns of the State during Summer 2018 from April 2018 to July 2018 for Rs. 1716.96 lacs

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सफाई अन्तराल (घण्टो में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत फेज नलकूपों की संख्या	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	जल संबंधी संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या				
क्षेत्र अजमेर													
1	अजमेर	अजमेर	542322	642543	115	135	48/72	Bisalpur Dam	0	2	2626	35	145900
2	अजमेर	केकडी शहर	41890	49631	4.00	85	72	Bisalpur Dam	1	0	202	2	8620
3	अजमेर	किशनगढ़	154886	183509	19	90	96/72	Bisalpur Dam	0	0	671	10	29389
4	अजमेर	ब्यावर	151152	179085	21.00	135	72	Bisalpur Dam	0	0	870	89	37328
5	अजमेर	विजयनगर	32124	38061	3.50	80	72	Bisalpur Dam	0	0	275	52	10265
6	अजमेर	पुष्कर	21621	25617	2.59	100	72/48	Bisalpur Dam	14	0	30	4	4326
7	अजमेर	सरवाड	20372	24137	2.00	80	72	Bisalpur Dam	0	0	78	0	3310
8	नागौर	नागौर	105218	116860	11.00	100	24	Nagaur Lift Canal	2	0	87	10	18867
9	नागौर	मुण्डवा	16871	18738	1.58	90	48	Nagaur Lift Canal	5	0	0	0	2214
10	नागौर	कुचेरा	23468	26065	1.68	70	48	Nagaur Lift Canal	6	0	0	0	2357
11	नागौर	मकराना	139877	149668	3.50	23	72	Nagaur Lift Canal	26	0	33	15	11264
12	नागौर	परबतसर	15157	16060	1.03	64	72	-	18	1	35	1	3311
13	नागौर	कुचामन	61969	68826	4.50	51	48		27	1	4	18	11120
14	नागौर	डीडवाना	53749	59696	3.65	65	72	Nagaur Lift Canal	22	0	21	0	9453
15	नागौर	लाडनू	65575	72831	4.60	55	72	Nagaur Lift Canal	27	0	0	0	10614
16	नागौर	नावा	22088	24532	1.38	60	24	-	5	2	8	0	3125
17	नागौर	मेडता	46070	51168	3.56	60	96	-	10	0	0	0	8119
18	नागौर	गोरडीचावा	10655	11834	0.73	50	96	-	7	0	0	0	2308
19	भीलवाडा	भीलवाडा	359483	425000	56.00	132	24/48	56(Meja + Chambal)	0	0	1861	323	54662
20	भीलवाडा	गगापुर	18777	20650	1.20	58	72		1	9	112	102	4213
21	भीलवाडा	माण्डल	17361	18500	1.60	85	48	Mandal Tank + Chambal)	0	3	145	8	3650
22	भीलवाडा	आसींद	16611	17700	1.50	75	48	Chambal	0	5	92	27	2600

23	भीलवाडा	माण्डलगढ	13844	15500	1.08	70	24	Chambal	7	2	115	18	2345
24	भीलवाडा	बिजौलिया	14140	15100	1.80	118	24	Mandoli Dam + Chambal)	0	0	75	5	2650
25	भीलवाडा	जहाजपुर	20586	22500	1.60	71	48		9	1	76		3374
26	भीलवाडा	शाहपुरा	30320	33000	2.30	70	48	Chambal)	7	2	284	0	5542
27	भीलवाडा	गुलाबपुरा	27215	29600	1.10	37	120	Bisalpur Dam	0	0	179		4271
28	टोंक	टोंक	165294	198353	12.50	63	48	Bisalpur Dam- 8 MLD & Rest from TWs	8	11	505	50	18300
29	टोंक	निवाई	37765	45318	2.10	46	48	Intke Well Upstream of Bisalpur Dam & TWs	5	0	300	37	7468
30	टोंक	देवली	22065	38478	2.00	52	24	Bisalpur Dam	0	1	102	0	5484
31	टोंक	मालपुरा	36028	43234	2.72	63	48	Bisalpur Dam	14	0	80	0	6404
32	टोंक	टोडारयसिंह	23559	28271	1.00	35	48	Bisalpur Dam- 2.0 MLD & Rest from TWs	0	0	92	0	5136
33	टोंक	उनियारा	12551	15061	1.20	80	24	Bisalpur Dam	10	2	75	0	2043
		योग	2340663	2725124.76	7	294		Thadoli RWR	231	42	9033	806	450032
क्षेत्र एनसीआर-अलवर													
34	अलवर	अलवर	322568	354825	36.50	102	24		230	0	140	0	45010
35	अलवर	बहरोड	29531	32779	1.80	65	24		31	0	0	5	3820
36	अलवर	खेरली	17634	19627	0.70	35	48		5	0	13	5	2610
37	अलवर	गोविन्दगढ	11552	12707	0.70	49	24		9	0	8	3	1857
38	अलवर	खेरथल	38298	42128	2.60	58	24		28	0	20	0	5683
39	अलवर	तिजारा	24747	27222	1.66	70	12		17	0	22	1	2820
40	अलवर	राजगढ	26631	29640	0.96	38	48		12	0	73	5	3987
		योग	470961	518928	44.92				332	0	276	19	65787
क्षेत्र जयपुर-प्रथम													
41	सीकर	सीकर	244497	285500	38.00	120	24	-	256	4	2	15	37062
42	सीकर	लक्ष्मणगढ	53392	57625	4.40	77	24	-	57	8	4	8	8821
43	सीकर	फतेहपुर	92595	102500	8.10	79	24	-	89	4	6	9	15991
44	सीकर	लोसल	28504	30700	2.15	70	24	-	28	0	0	2	3762
45	सीकर	रामगढ शेखावाटी	33024	36200	4.20	116	24	-	35	1	10	1	5808
46	सीकर	नीमकाथाना	36231	40579	4.00	100	24	-	30	0	8	6	7308

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सफाई अन्तराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत हेण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संवंधों की संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या			
47	सीकर	खण्डेला	29044	30300	1.60	50	48	-	24	25	33	4549
48	सीकर	श्रीमोधोपुर	31366	32600	2.28	60	24	-	32	0	7	4525
49	सीकर	रीगंस	26139	27500	2.83	98	24	-	29	11	7	4493
50	झुझुनू	चिडावा	43953	46590	3.50	75	24	-	58	0	3	8960
51	झुझुनू	बगड	14238	15692	1.55	99	24	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 0.5 MLD	23	10	0	2800
52	झुझुनू	मण्डावा	23335	25668	2.20	86	24	-	30	8	0	5636
53	झुझुनू	बिसाऊ	23227	25317	2.30	91	24	-	13	22	3	3203
54	झुझुनू	झुझुनू	118473	125581	15.00	119	24	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 1.5 MLD	133	0	12	23801
55	झुझुनू	नवलगढ	63948	67785	9.10	134	24	-	96	25	3	9950
56	झुझुनू	मुकन्दगढ	18469	19577	1.90	97	24	-	24	11	0	4320
57	झुझुनू	उदयपुरवाटी	29236	30990	2.30	74	48	-	29	41	4	3190
58	झुझुनू	गोटडा	16933	18457	1.10	60	48	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 1.5 MLD	10	27	0	6468
59	झुझुनू	सूरजगढ	21666	23616	1.36	58	24	-	23	7	3	4128
60	झुझुनू	खेतडी	18209	19848	1.40	71	72	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 1.0 MLD	12	123	0	3493
61	झुझुनू	पिलानी	29741	43105	1.40	32	24	-	43	4	6	7092
62	दौसा	बादीकुई	44664	57170	1.80	35	120		33	0	53	6525
63	दौसा	बसवा	15532	19880	1.90	25	96		8	0	17	1610
64	दौसा	दौसा	85960	105730	5.00	42	48	बीसलपुर-तुगा-दौसा पाईप लाईन से 2.5 एम.एल.डी. पानी प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है।	26	4	54	11427

65	दौसा	लालसोट	34363	43985	3.60	82	24			17	0	86	24	4593
66	दौसा	महवा	24846	29802	1.81	60	24			18	0	65	16	3158
	योग		1201585	1362297.15	124.78					1176	31	1165	238	202673
क्षेत्र जयपुर-द्वितीय														
67	जयपुर	जयपुर शहर	3073350	3700000	403.00	108	24		Bisalpur Dam-303.00 MLD + TWs-100.00	2168	0	1852	329	430907
68	जयपुर	सांगानेर					24			99	0	275	65	
69	जयपुर	आमेर					24			21	3	133	58	
70	जयपुर	बगरू	31229	35452	1.00	28	48		TWs at begus road Gochar	15	0	120	48	2610
71	जयपुर	चाकसू	33432	36819	2.50	68	24		Bisalpur Dam-1.5MLD & Rest from TWs/Ows	11	5	397	25	4168
72	जयपुर	नरैना	13275	16063	0.80	50	24		Bisalpur Dam-0.6MLD & Rest from TWs/Ows	6	6	198	0	1413
73	जयपुर	सांभर	22327	24560	14.40	59	48		Bisalpur Dam-1.4MLD & Rest from Ows	0	4	0	0	4655
74	जयपुर	फुलेरा	26091	28700	15.20	53	48		Bisalpur Dam-1.4MLD & Rest from Ows	0	18	74	17	4304
75	जयपुर	जोबनेर	11354	12489	0.80	64	24		Bisalpur Dam-0.3MLD & Rest from TWs	7	0	42	20	2645
76	जयपुर	के.रेनवाल	29201	32121	14.20	44	48		Bisalpur Dam-1.0MLD & Rest from TWs	7	0	6	21	4196
77	जयपुर	बस्सी	26029	28632	1.60	56	24		Bisalpur Dam-0.4MLD & Rest from TWs	23	0	128	12	2874
78	जयपुर	चौमू	72152	79367	3.99	50	24			109	0	0	0	9540
79	जयपुर	कोतपूतली	49202	57100	2.35	41	24			27	0	128	28	5052
80	जयपुर	मनोहरपुर	20287	23600	1.60	66	24			16	0	17	21	2948
81	जयपुर	शाहपुरा	33895	39400	1.92	49	24			16	0	10	6	5010
82	जयपुर	विराटनगर	20568	23900	1.35	57	24			15	0	15	3	2556
	योग		3462392	4138203.3	464.71					2540	36	3395	653	482878
क्षेत्र भरतपुर														
83	भरतपुर	भरतपुर व सेवर	252838	300000	40.00	133	24		Chambal River Bandh Baretha & Tws	15	0	63	0	44277
84														

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सफाई अन्तराल (घण्टों में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत हेण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधों की संख्या	
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या				कार्यरत खुले कुओं/ डैसीबी की संख्या
85	भरतपुर	बयाना	38502	41582	2.60	60	24		14	0	37	0	3865
86	भरतपुर	वैर	19385	20936	1.35	61	24		10	0	70	0	1704
87	भरतपुर	कुम्हेर	23540	25423	1.00	39	24		9	0	69	0	2074
88	भरतपुर	भुसावर	19946	21542	1.30	58	24		9	0	45	0	2185
89	भरतपुर	नदबई	26411	28524	1.45	56	24		12	0	144	0	2402
90	भरतपुर	डीग	44999	49780	2.20	44	24		15	1	73	0	2197
91	भरतपुर	नगर	25572	27870	1.30	42	48		14	0	62	10	2251
92	भरतपुर	कामा	38040	40778	1.50	55	24/48		18	1	176	0	4045
93	धोलपुर	धोलपुर	133075	155000	18.00	110	12	Chambal River & TWs, Ows	4	1	356	0	10305
94	धोलपुर	बाडी	62721	71500	5.44	76	12		18	1	94	0	4908
95	धोलपुर	राजाखेडा	33666	37000	2.80	75	12		15	0	211	0	2420
96	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	120998	136894	7.60	56	24		106	1	380	150	21811
97	सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी	119090	126235	4.00	33	48		48	2	260	35	12678
98	सवाईमाधोपुर	टोडरा	5490	6700	0.40	60	24		4	0	53	0	812
99	करौली	करौली	82960	90000	6.30	70	24		40	0	110	0	8446
100	करौली	हिण्डौन	105452	115000	6.20	54	24		38	0	62	26	6033
101	करौली	टोडाभीम	22977	28000	2.10	75	24		15	0	64	8	1925
		योग	1175662	1322764	105.54				404	7	2329	229	134338

क्षेत्र कोटा

102	कोटा	कोटा	1001365	1200000	330.00	275	12	Kota Barrage on Chambal River	92	0	309	15	146819
103	कोटा	रामगंज मण्डी	41328	45000	4.50	100	48	RanaPratap Sagar Dam on Chambal River	0	2	218	4	6468

104	कोटा	सुकेत	22319	24000	1.90	80	48	Anicut on Ahu River	0	2	52	5	2744
105	कोटा	सांथलखेडी	15617	17000	1.20	70	48	RanaPratap Sagar Dam on Chambal River	0	1	38	7	1536
106	कोटा	उदपुरा	10051	11000	0.60	52	24	RanaPratap Sagar Dam on Chambal River	0	0	52	0	1305
107	कोटा	सांगोद	21840	24000	2.00	83	24	Kali Sindh & T/W	12	0	66	15	3204
108	कोटा	कैथून	26537	27781	1.50	70	12	NIL	19	0	84	24	2493
109	बूंदी	बूंदी	104919	110270	14.00	127	24	Chambal River-13 MLD	11	0	312	18	19901
110	बूंदी	नैनवां	19485	22544	0.90	40	48		16	2	132	18	3750
111	बूंदी	लाखेरी	29572	34215	3.00	101	24	Anicut on Mej/ River	2	2	260	8	4803
112	बूंदी	के.पाटन	24627	28493	2.00	70	12		16	0	78	2	3762
113	बूंदी	कापरैन	20748	24005	1.50	63	12		12	0	95	5	2750
114	बूंदी	इन्दरगढ	7444	8613	0.60	70	24		9	0	60	5	1172
115	बारां	बारां	117992	136000	18.00	132	24	Hiker Deh (18MLD)	9	0	455	20	14390
116	बारां	अंता	32377	38850	2.80	72	24	KALISNDH RIVER (2.8MLD)	7	0	243	5	2084
117	बारां	मांगरोल	25073	31662	2.40	75	24	PARVATI RIVER (2.4 MLD)	4	0	170	5	1956
118	बारां	छबडा	32285	34235	3.50	100	24	LAHSI DAM (3.5 MLD)	12	0	101	12	4352
119	बारां	छीपाबडोद	18837	20600	2.00	100	24	LAHSI DAM (2.0MLD)	7	0	71	7	3390
120	झालावाड	झालावाड	66919	76956	10.00	130	24	Kali Sindh River, Pipaji Ka Deh, Chaapi Dam	2	0	260	3	11273
121	झालावाड	जे.पाटन	37506	43131	4.50	104	24	Kali Sindh River, Bhanwrasa Deh, Mundliya Kheri Talab, Chaapi Dam	0	0	128	5	5344
122#	झालावाड	चौमेला	8584	9614	0.70	73	48	Choti Kali Sindh River	0	0	39	0	2067
123	झालावाड	खानपुर	13848	15925	2.20	125	24	Bheemsagar Dam	0	0	56	10	3114
124	झालावाड	मनोहरस्थाना	11292	12985	2.00	125	12	Parwan River Borda Deh	0	0	80	0	1613
125	झालावाड	अकलेरा	26240	30176	2.00	66	24	Parwan River Amlawda Deh	0	0	99	3	2469

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सप्लाई अन्तराल (घण्टों में)	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत हेण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधों की संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या				
126#	झालावाड	सुनेल	14696	16460	1.50	91	24	Ahu River Rangbari	0	0	62	0	2656
127	झालावाड	भवानीमण्डी	42283	47357	4.00	85	24	Thala Deh, Piplad Dam	0	0	96	0	4944
128	झालावाड	पिरवा	12807	14344	1.00	70	24	Chanwli Dam	0	0	41	0	2007
		योग	1806591	2105216	420.3				230	9	3657	196	262366
क्षेत्र जोधपुर-प्रथम													
129	जोधपुर	बिलारा	39590	45500	3.50	75	24	Canal Water-3 MLD	3	0	0	0	4910
130	जोधपुर	पिपाडसिटी	36810	42300	3.60	85	72	Canal Water-3.6 MLD	0	0	3	0	6629
131	जोधपुर	फलौदी	49914	54157	5.50	100	24	RGLC-3.5 MLD	10	0	0	0	7200
132	जोधपुर	जोधपुर शहर	1056191	1350000	214.36	135	48	RGLC	77	52	1435	1097	194239
133	पाली	पाली	230075	255000	32.00	125	72	Jawai Dam-32MLD	0	0	528	0	43668
134	पाली	मारवाड जक्शन	12004	16000	0.95	60	72	Siryari Dam-1.0MLD	8	0	114	0	3208
135	पाली	सोजतसिटी	43023	47600	3.50	70	72	Jawai Dam-3.2MLD	0	0	79	28	8993
136	पाली	सोजतरोड	12472	14300	0.82	55	72	Kantaliya Dam	2	3	30	12	3105
137	पाली	जैतारण	22621	24883	1.20	45	48	Jawai Dam-1.1 MLD	10	0	12	1	3888
138#	पाली	नीमज	15071	17500	0.70	45	48	TW's & Ow's	2	8	212	0	2015
139#	पाली	रायपुर	12157	13373	0.90	65	48	Ow's	0	3	82	3	2500
140	पाली	सुमेरपुर	37093	39500	3.20	80	48	Jawai Dam 3.2MLD	0	4	130	0	7569
141	पाली	बाली	19880	23700	1.35	55	72	Jawai Dam 1.38 MLD	0	1	180	0	4420
142	पाली	रानी	13880	14700	1.20	70	72	Jawai Dam 1.1MLD	0	1	96	0	3177
143	पाली	फालना	24839	27300	1.85	65	72	Jawai Dam 1.9 MLD	0	0	140	0	5485
144	पाली	सादडी	27390	29700	2.25	75	72	PHED Dam 2.20 MLD	0	4	128	0	4657
		योग	1653010	2015513	276.88				112	76	3169	1141	305663

क्षेत्र जोधपुर-द्वितीय													
145	जैसलमेर	जैसलमेर	65471	73066	10.00	120	48/72	IGNP Mohangarh -10 MLD	12	0	0	0	10282
146	जैसलमेर	पोकरण	23554	25438	2.60	100	48	Pokaran Falsoond Balotra Siwana Lift Project	4	0	5	0	2450
147	बाडमेर	बाडमेर	96225	115470	16.00	135	48/72	Barmer Lift Canal	0	0	55	0	27200
148	बाडमेर	बालोतरा	74496	89395	7.20	80	96/120	TW Kitnod, Bithuja	25	0	0	0	14258
149#	बाडमेर	सिवाना	24387	29264	2.00	80	72	TW Goliya	13	0	0	0	3630
150#	बाडमेर	समदडी	13322	15986	1.10	70	72	IGNP	0	1	0	0	2950
151	जालौर	जालौर	54851	60900	7.00	110	48	TW & Narmda Project	34	0	38	0	14788
152	जालौर	भीनमाल	47932	53970	5.50	100	72	TW & Narmda Project	14	0	42	10	13000
153	जालौर	सांचौर	32875	37020	4.00	100	48	TW & Narmda Project	12	0	0	0	7394
154	सिरोही	सिरोही	42520	47198	2.70	56	48	TW's, Ow's	15	12	300	10	8896
155	सिरोही	शिवगंज	28053	31138	2.40	65	48	Jawai Dam & TW's, Ows	4	8	145	25	6176
156	सिरोही	पिण्डवाडा	24487	27180	1.50	54	48		9	4	135	0	4289
157	सिरोही	आबूरोड	55599	61715	4.40	90	24		8	11	307	0	8050
158	सिरोही	माउण्ट आबू	22943	39013	2.50	60	72	Lower & Upper Kodra Dam	0	0	120	0	3875
159	सिरोही	भावरी	15312	16996	0.85	50	48		7	3	46	0	2526
		योग	622027	723749	69.75				157	39	1193	45	129764
क्षेत्र उदयपुर													
160	उदयपुर	उदयपुर	451100	575000	57.96	101	48	Pichola 22 MLD, Fatehsagar 15 MLD, Badi 0.5 MLD, Jaisamand 20MLD & Mansiwakal 22.50 MLD U/G- 5	61	52	2651	218	91347
161	उदयपुर	भिण्डर	17878	19665	1.05	53	48	1. Anicut Jadu (0.55), 2. Ratamagara (0.15), 3. Kadecha (0.1)	4	2	133	5	2986
162	उदयपुर	कनौड	13239	14563	0.75	52	48	Anicut peepalwas (0.6)	1	1	137	2	1935
163	उदयपुर	फतेहनगर	22812	25093	0.85	34	48	NIL	15	5	217	15	3560

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सप्लाई अन्तराल (घण्टों में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत खुले कुओं/ डीप्पी की संख्या	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या					
164	उदयपुर	सलूम्वर	16425	18971	1.33	70	48	Jaisamand Lake-1.05 MLD & TWs/Ows	-0.2 MLD	4	2	102	0	4096
165	उदयपुर	खेरवाडा	7581	9317	0.65	70	48	Godawari Dam 0.50		2	2	43	0	2067
166	उदयपुर	रिसभदेव	9171	11700	0.82	70	48	Som Kagdar 0.4 MLD & TWs/Ows 0.3 MLD		1	3	78	0	1598
167	राजसमंद	कांकोली	67798	90000	15.10	168	24	Rajsamand Lake-15 MLD		1	2	401	55	13492
168	राजसमंद	नाथद्वारा	42016	60000	5.60	93	24	Nandsamand Dam-4.1MLD		9	2	235	55	8424
169	राजसमंद	ओमेट	17335	18000	1.25	69	48	Manoharsagar Dam-TWs/Ows-1.25MLD		4	12	118	14	3410
170	राजसमंद	देवगढ	17604	18500	1.30	70	48	Sopari Dam 0.8mld and local OW 0.5mld		7	13	131	12	3665
171	डूंगरपुर	डूंगरपुर	47706	48500	3.34	69	24	Adwardsamand 1.70 MLD & Vijaychakra sagar Dam1.4 MLD		5	7	580	0	9795
172	डूंगरपुर	सागवाड़ा	31659	33242	2.33	70	24	Lodeshwar Dam 1.8 MLD		7	4	210	2	6532
173	डूंगरपुर	गलियाकोट	4707	5000	0.30	60	24	Kagdi Pickup Weir 12.58MLD		2	2	58	0	1396
174	बांसवाडा	बांसवाडा	101017	113140	13.58	120	24	Kalinjara Dam, 0.60MLD		13	4	271	0	15710
175	बांसवाडा	कुशलगढ	10666	11945	0.85	71	24	Bhagora Dam , 0.65 MLD		0	2	119	0	2800
176	बांसवाडा	परतापुर	10758	12050	0.85	71	24	Jakhm Dam3.00 MLD		0	5	130	0	4240
177	प्रतापगढ	प्रतापगढ	42079	48409	3.00	62	72	Bari Mansarovar		0	0	249	7	9959
178	प्रतापगढ	छोटीसादडी	18360	21122	1.70	80	24			0	0	62	11	2695

क्षेत्र बीकानेर

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सप्लाई अन्तराल (घण्टों में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	कार्यरत हेण्डपम्पों की संख्या	जल संबंधी संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	कार्यरत नलकूपों की संख्या				
क्षेत्र चूरु-प्रोजेक्ट													
207	चूरू	सुजानगढ	101523	107746	6.48	74	72	Canal-3.480 MLD & TWs/DCBs-3.00MLD	24	0	7	42	13569
208	चूरू	छापर	19744	20954	2.62	100	48	Canal-1.0MLD & TWs/DCBs-1.62MLD	9	0	5	0	3953
209	चूरू	बिदासर	35683	37870	2.70	71	24		15	0	0	0	6825
210	चूरू	रतनगढ	71124	98235	11.70	120	24	-	76	10	12	3	17152
211	चूरू	राजलदेसर	22836	24000	4.00	100	24	-	18	5	12	16	5167
212	चूरू	तारानगर	32640	36555	3.45	82	24	Canal-3.45 MLD	0	0	0	0	8468
213	चूरू	राजगढ	59193	66296	6.50	98	48	Canal-6.40MLD & TWs/DCBs-0.1MLD	3	5	53	38	11795
214	चूरू	चूरू	120157	134578	14.80	110	24	Canal-3.75MLD & TWs/DCBs-11.05MLD	101	16	41	7	25940
215	चूरू	रतननगर	12841	13600	1.35	99	24	Canal-0.30MLD & TWs /DCBs-1.05MLD	12	3	0	0	2531
216	चूरू	सरदारशहर	95911	107100	10.90	102	24	Cannal 9.1MLD TWS /DCB-1.8MLD	39	10	0	28	20665
		योग	571652	646935	64.50				297	49	130	134	116065
	कुल योग		16166049	18877219	2269.58				6030	441	31784	4312	2687320

NOTE-1 : Six Towns not maintained by PHED since long -

- (1) Nasirabad(Ajmer)- By Defence, (2) Vidhya Vihar (Jhunjhunu)-By Bits Pilani, (3) Bhiwari (Alwar)- By RIICO (4) Bhaleria (Udaipur) - By HZL (5) Newa Talai(Udaipur) - By HZL (6) Takatgarh (Pali)- By Nagar Palika

NOTE-2 : Seven Towns transferred from 2013-14 to Local Bodies -

- (1) Nagaur (2) Nokha (3) Karauli (4) Chomu (5) Jaisalmer (6) Bundi (7) Nathdwara

NOTE-3 : One Town transferred from 2015-16 to Local Bodies -

- (1) Sriganganagar

ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से लाभान्वित जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	जिला	पाइप योजनाओं से लाभान्वित जनसंख्या											
		4000 से अधिक आबादी			4000 से कम व 3000 से अधिक आबाद			3000 से कम व 1500 से अधिक आबादी			1500 से कम आबादी		
		ग्रामों की संख्या	लाभान्वित की जनसंख्या	जल संबंधों की संख्या	ग्रामों की संख्या	लाभान्वित की जनसंख्या	जल संबंधों की संख्या	ग्रामों की संख्या	लाभान्वित की जनसंख्या	जल संबंधों की संख्या	ग्रामों की संख्या	लाभान्वित की जनसंख्या	जल संबंधों की संख्या
1	अजमेर	40	269455	49409	18	63168	11610	14	35883	4412	4	4100	618
2	भीलवाडा	50	318278	45988	38	124494	11565	83	182983	17110	44	44337	4094
3	नागौर	91	645842	65509	36	114053	14315	50	112638	9512	29	32816	4780
4	टोंक	16	105939	20750	3	11498	1125	1	2387	114	3	2197	446
5	भरतपुर	34	217846	11265	2	6508	281	1	2459	120	1	1175	92
6	धौलपुर	12	99685	6707	4	13860	365	4	9137	440	0	0	0
7	सवाईमाधोपुर	33	254552	20381	4	20740	1680	2	4664	317	1	1316	0
8	करौली	26	149618	11671	13	44591	1595	9	18208	755	6	5941	483
9	बीकानेर	62	450261	22832	18	60637	2615	15	38749	2088	17	10859	770
10	श्रीगंगानगर	3	17790	3106	1	3007	342	5	11425	1885	11	6860	570
11	हनुमानगढ़	60	361576	55124	40	139636	38439	51	114487	17084	22	22820	3038
12	चूरू	22	152098	30317	8	27747	3582	22	51901	5353	11	12622	1345
13	अलवर	93	593838	45243	35	122915	8449	65	137107	9310	43	48147	3276
14	सीकर	55	412826	44529	22	76604	7462	24	52883	6250	3	4024	499
15	दौसा	27	151410	17074	1	3350	432	2	3635	200	0	0	0
16	झुझुनू	63	411138	52344	23	99955	13490	41	90711	9364	20	18002	1844
17	जयपुर	133	914018	58676	61	209232	10975	200	413601	5069	132	175368	6458
18	जोधपुर	43	314751	34363	11	39134	2102	19	35468	3613	9	5684	221
19	पाली	50	327805	63447	18	60806	10720	16	33630	6669	4	7696	1031
20	बाड़मेर	27	208491	37800	6	19730	4988	6	14002	3538	0	0	0
21	जैसलमेर	5	38369	3973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	जालौर	44	318854	53813	11	40117	5567	9	22036	2937	0	0	0
23	सिरोही	37	246187	32579	6	17300	2112	8	21350	4526	3	2575	506
24	कोटा	20	162195	20633	4	14209	2120	2	4621	500	1	1321	200
25	बून्दी	19	111317	10344	8	28776	2687	2	3912	472	1	544	88
26	बारां	14	117799	15452	5	18463	2910	5	10424	2386	0	0	0
27	झालावाड़	10	71144	7853	3	10719	495	9	19638	1341	3	3394	176
28	बांसवाडा	16	103055	9136	9	14611	1293	2	5262	554	0	0	0
29	चित्तौड़गढ़	30	179328	26136	9	31743	5176	6	13567	1789	3	3667	472
30	डूंगरपुर	13	75640	8303	4	13190	1087	4	8665	961	4	4079	817
31	प्रतापगढ़	7	44847	5280	0	0	0	2	5384	549	0	0	0
32	राजसमन्द	16	101490	19886	15	47662	7065	89	202320	17972	22	27126	2503
33	उदयपुर	25	141312	14063	30	107895	9812	62	129133	11378	14	14130	1640
योग		1196	8088754	923986	466	1606350	186456	830	1812270	148568	411	460800	35967

ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संख्या का विवरण

क्र. सं.	जिला	पाइप योजनाओं की संख्या	पम्प व टैंक योजनाओं की संख्या	क्षेत्रीय योजनाओं की संख्या	हेण्डपम्प योजनाओं की संख्या	टी.एस.एस योजनाओं की संख्या	डिग्गी योजनाओं की संख्या	अन्य योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या
अजमेर क्षेत्र									
1	अजमेर	76	55	387	204	8	0	38	768
2	भीलवाड़ा	215	227	56	1035	7	0	16	1556
3	नागौर	206	475	155	42	52	0	243	1173
4	टोंक	23	91	188	370	4	0	0	676
भरतपुर क्षेत्र									
5	भरतपुर	38	316	37	855	0	0	0	1246
6	धौलपुर	20	73	10	528	0	0	0	631
7	सवाईमाधोपुर	40	107	15	537	0	0	0	699
8	करौली	54	244	23	462	0	0	0	783
बीकानेर क्षेत्र									
9	बीकानेर	112	289	66	0	22	156	0	645
10	श्रीगंगानगर	20	33	605	64	0	41	20	783
11	हनुमानगढ़	19	30	273	397	0	50	52	821
चुरू क्षेत्र									
12	चुरू	63	128	34	0	34	0	51	310
अलवर क्षेत्र									
13	अलवर	236	591	35	1095	0	0	0	1957
जयपुर - I क्षेत्र									
14	सीकर	104	216	27	208	594	0	0	1149
15	दौसा	30	233	39	685	0	0	0	987
16	झुंझुनू	147	12	5	5	735	0	0	904
जयपुर - II क्षेत्र									
17	जयपुर	526	447	86	1038	2	0	1	2100
जोधपुर - I क्षेत्र									
18	जोधपुर	82	545	40	0	0	0	0	667
19	पाली	88	199	104	232	1	0	111	735
जोधपुर - II क्षेत्र									
20	बाड़मेर	39	343	274	59	0	1	0	716
21	जैसलमेर	5	60	93	100	3	100	0	361
22	जालौर	64	212	121	2	0	0	17	416
23	सिरोही	54	19	23	178	132	0	12	418
कोटा क्षेत्र									
24	कोटा	27	55	14	494	7	0	0	597
25	बून्दी	30	163	20	630	0	0	0	843
26	बारां	24	120	1	929	0	0	0	1074
27	झालावाड़	21	73	11	754	0	0	0	859
उदयपुर क्षेत्र									
28	बांसवाड़ा	27	41	13	1157	31	0	0	1269
29	चित्तौड़गढ़	48	153	1	1379	0	0	0	1581
30	डूंगरपुर	25	35	4	800	11	0	0	875
31	प्रतापगढ़	9	42	26	894	0	0	0	971
32	राजसमन्द	142	100	16	502	0	0	0	760
33	उदयपुर	131	197	26	1943	1	0	0	2298
योग		2745	5924	2828	17578	1644	348	561	31628

सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम सह डिप्लोरीडेशन संयंत्र

(दिसम्बर 18 तक)

क्र. स.	जिला	स्वीकृत	स्थापित	व्यय (रूपये करोड़ों में दिसम्बर 2018 तक)
फेज-I				
1	जयपुर	79	79	5.01
2	झुझुनु	11	11	0.7
3	जोधपुर	18	18	1.14
4	पाली	22	22	1.39
5	जालौर	19	19	1.2
6	सिरोही	40	40	2.54
7	राजसमंद	49	45	2.85
8	उदयपुर	6	2	0.13
9	डूंगरपुर	101	101	6.4
योग		345	337	21.36
फेज-II				
1	अलवर	61	32	2.03
2	बांसवाडा	189	189	11.98
3	बारा	5	1	0.06
4	भीलवाडा	10	10	0.63
5	चित्तौड़गढ़	5	5	0.32
6	जैसलमेर	56	54	3.42
7	जालौर	47	46	2.92
8	झालावाड	4	0	0
9	कोटा	6	2	0.13
10	नागौरा	119	110	6.97
11	पाली	15	15	0.95
12	प्रतापगढ़	5	5	0.32
13	राजसमंद	177	177	11.22
14	सिरोही	212	212	13.44
15	उदयपुर	21	18	1.14
16	डूंगरपुर	145	145	9.19
17	दोसा	22	14	0.89
18	जयपुर	20	20	1.27
19	झुझुनु	3	1	0.06
20	सीकर	2	2	0.13
21	करौली	13	3	0.19
22	सवाईमाधोपुर	38	16	1.01
योग		1175	1077	68.27
फेज-III				
1	जैसलमेर	84	32	2.72
योग		84	32	2.72
फेज-IV				
1	नागौर	95	5	0.46
2	करौली	14	0	0
3	सवाईमाधोपुर	1	0	0
4	जयपुर	61	0	0
5	पाली	1	0	0
6	सिरोही	262	13	1.05
7	बांसवाडा	76	0	0
8	डूंगरपुर	64	0	0
9	प्रतापगढ़	3	0	0
10	राजसमंद	43	0	0
11	उदयपुर	7	0	0
योग		627	18	1.51
कुल योग		2231	1464	93.86

सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम

(दिसम्बर 18 तक)

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत	स्थापित	व्यय (रूपये करोड़ों में दिसम्बर 2018 तक)
1	जोधपुर	11	11	0.48
2	पाली	63	63	2.74
	योग	74	74	3.22
3	अलवर	92	72	3.14
4	भरतपुर	37	36	1.57
5	धोलपुर	29	26	1.13
6	सवाईमाधोपुर	68	61	2.66
7	करौली	20	20	0.87
8	बाडमेर	70	68	2.96
9	जालौर	47	47	2.05
10	सिरोही	53	53	2.31
11	जैसलमेर	6	6	0.26
12	बांरा	24	23	1.00
13	बूंदी	52	52	2.26
14	झालावाड	24	23	1.00
15	कोटा	47	45	1.96
16	उदयपुर	93	99	4.31
17	बांसवाडा	27	25	1.09
18	डूंगरपुर	26	26	1.13
19	चित्तोडगढ़	27	25	1.09
20	राजसमन्द	27	23	1.00
21	प्रतापगढ़	12	12	0.52
	योग	781	742	32.31
21	दौसा	24	9	0.39
22	सीकर	73	56	2.44
23	झुंझुनु	48	28	1.22
24	जयपुर	44	28	1.22
	योग	189	121	5.27
कुल योग		1044	937	40.80

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या

क्र. सं.	जिला	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	
		वर्ष 2017-18 में	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक
1	अजमेर	80	90
2	भीलवाडा	50	33
3	नागौर	502	263
4	टोंक	67	42
5	भरतपुर	446	382
6	धौलपुर	99	172
7	सवाईमाधोपुर	112	38
8	करौली	176	225
9	बीकानेर	67	67
10	श्रीगंगानगर	107	86
11	हनुमानगढ़	40	98
12	चूरु	95	78
13	अलवर	390	302
14	सीकर	462	372
15	दौसा	171	90
16	झुंझुनूं	346	344
17	जयपुर	377	262
18	जोधपुर	454	350
19	पाली	182	103
20	बाड़मेर	291	362
21	जैसलमेर	45	34
22	जालौर	79	121
23	सिरोही	65	33
24	कोटा	106	65
25	बून्दी	213	46
26	बारौ	193	400
27	झालावाड़	157	121
28	बांसवाडा	227	4
29	चित्तौड़गढ़	66	218
30	डूंगरपुर	12	19
31	प्रतापगढ़	10	17
32	राजसमन्द	35	18
33	उदयपुर	5	13
योग		5727	4868

शहरी क्षेत्रों में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या

क्र. सं.	जिला	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	
		वर्ष 2017-18 में	वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक
1	अजमेर	106	20
2	भीलवाडा	4	9
3	नागौर	10	2
4	टोंक	6	1
5	भरतपुर	51	28
6	धौलपुर	12	12
7	सवाई माधौपुर	8	2
8	करौली	10	7
9	बीकानेर	22	4
10	श्री गंगानगर	6	18
11	हनुमानगढ़	8	4
12	चुरू	39	28
13	अलवर	27	7
14	सीकर	15	8
15	दौसा	22	22
16	झुंझुनू	30	29
17	जयपुर	320	327
18	जोधपुर	9	21
19	पाली	12	6
20	बाड़मेर	3	4
21	जैसलमेर	0	0
22	जालौर	2	5
23	सिरोंही	6	4
24	कोटा	31	29
25	बूंदी	7	2
26	बांरा	4	21
27	झालावाड़	14	7
28	बांसवाड़ा	3	2
29	चित्तोड़गढ़	3	3
30	डुंगरपुर	1	0
31	प्रतापगढ़	1	0
32	राजसमंद	1	3
33	उदयपुर	24	23
कुल योग		817	658



समय रहते जल को है बचाना इसको यूँ न व्यर्थ बहाना



जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

2 सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान
phedwater.rajasthan.gov.in
