

प्रगति विवरणिका

2024-25



जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

आपकी बेहतर सेवा के लिए, आपके सहयोग की अपेक्षा में

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	01
2.	जल जीवन मिशन (हर घर जल)	03
3.	शहरी क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं	05
4.	वार्षिक योजना 2024–25	09
5.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन राजस्थान (SWSM)	11
6.	पेयजल परिवहन	15
7.	हैण्डपम्प मरम्मत अभियान	16
8.	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र	17
9.	प्रतिबद्ध राज्य निधि एवं संधारण व्यय तथा राजस्व	18
10.	वृहद् पेयजल परियोजनाएं	19
11.	प्रयोगशालाएं	25
12.	सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम एवं डी फ्लोरीडेशन संयंत्र	29
13.	ड्रिलिंग रिगों का प्रबन्धन	30
14.	परिशिष्ट	31
	विभागीय संगठनात्मक ढांचा	32
	परिशिष्ट-1 दिनांक 1.4.2024 तक हैबीटेशन में पेयजल की जिलेवार स्थिति	34
	परिशिष्ट-2 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2023–24 में घरेलू जल संबंधों पेयजल से लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की जिलेवार संख्या का विवरण	35
	परिशिष्ट-3 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2024–25 में घरेलू जल संबंधों से ग्रामीण लाभान्वित परिवारों की जिलेवार संख्या का विवरण (दिसम्बर 2024 तक)	36
	परिशिष्ट-4 विभिन्न प्रकार की ग्रामीण पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम (मुख्य हैबीटेशन) 31 दिसम्बर, 2024 तक	37
	परिशिष्ट-5 विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ढाणियाँ (अन्य हैबीटेशन) 31 दिसम्बर, 2024 तक	38
	परिशिष्ट-6 ग्रीष्म संवर्द्धन 2024–25 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (20.06.2024 तक)	39

परिशिष्ट-7 ग्रीष्म संवर्द्धन 2024-25 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (28.06.2024 तक)	41
परिशिष्ट-8 47वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.24 तक) (ग्रामीण)	44
परिशिष्ट-9 47वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (शहरी)	46
परिशिष्ट-10 48वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2024-25 (01.04.2024 से 31.12.2024 तक) (ग्रामीण)	48
परिशिष्ट-11 48वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2024-25 (01.04.2024 से 31.12.2024 तक) (शहरी)	50
परिशिष्ट-12 वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित नलकूपों/हैण्डपम्पों की संख्या	52
परिशिष्ट-13 वृहद् पेयजल परियोजनाओं का विवरण	53
परिशिष्ट-14 वर्ष 2023-24 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलेवार विवरण 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	71
परिशिष्ट-15 वर्ष 2024-25 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलेवार विवरण 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक	72
परिशिष्ट-16 जल जीवन मिशन के तहत जारी घरेलु जल सम्बंधों का जिलेवार विवरण (31.12.2024 तक)	73
परिशिष्ट-17 वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) में नगरीय एवं ग्रामीण जल योजनाओं से राजस्व प्राप्तियां एवं प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय	74
परिशिष्ट-18 विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण	75
परिशिष्ट-19 वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-23 से मार्च-24 तक)	76
परिशिष्ट-20 वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-24 से दिसम्बर-24 तक)	78
परिशिष्ट-21 राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति	80
परिशिष्ट-22 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण (31.12.2024 तक)	91
परिशिष्ट-23 हर घर जल का विवरण (100% FHTC कवरेज) (31.12.2024 तक)	92
परिशिष्ट-24 स्थापित आर.ओ. एवं सोलर डी.एफ.यू. संयंत्र व सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग संयंत्र	93
परिशिष्ट-25 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	94

1

प्राक्कथन

राजस्थान जहाँ भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के गौरव से सम्मानित है, वहीं विषम भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप सीमित एवं न्यूनतम जल स्रोत विरासत में प्राप्त हैं। राज्य का क्षेत्रफल देश का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। 2022 के सर्वे के अनुसार राज्य के 302 ब्लॉक में से 203 ब्लॉक अत्यधिक दोहित, 23 विषम व 29 अर्द्ध विषम ब्लॉक हैं।

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	3,42,239
2011 की जनगणना के अनुसार	
कुल आबादी	6,85,48,437
शहरी आबादी	1,70,48,085
ग्रामीण आबादी	5,15,00,352
गत दशक में जनसंख्या वृद्धि दर	21.30%
पशुओं व मानव आबादी का अनुपात	1.2 : 1
जिलों की संख्या	41
ग्रामों की संख्या	43199
ढाणियों की संख्या	84537
शहरों/कस्बों की संख्या	256

प्रदेश की विपरीत परिस्थितियाँ, लगातार वर्षों से पड़ रहे अकाल, जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विकास से बढ़ती हुई जलापूर्ति की मांग, वर्षा की मात्रा व दिनों में कमी एवं कृषि हेतु अत्यधिक भूजल दोहन जल समस्या के मुख्य कारण हैं। प्रदेश की लगभग 59 प्रतिशत ग्राम-ढाणियों का जलस्रोत भूजल ही है। अतः इस प्राकृतिक सम्पदा को योजनाबद्ध व मितव्ययी तरीके से उपयोग में लेते हुए, समस्या के स्थायी निराकरण का निर्णय, राज्य सरकार ने लिया है। स्थायी निराकरण और

समाधान का कार्य कोई कम मुश्किल नहीं है और राज्य सरकार ने इस बारे में गहन चिन्तन किया है। समस्या के निराकरण के कई सम्बन्धित पहलू हैं जिनमें यहां यह विचारणीय है कि योजनाबद्ध व आवश्यकता तथा प्राथमिकता अनुरूप भू-गर्भीय जल का सीमित उपयोग ही हो और सतही स्रोतों पर आधारित योजनाओं के साथ-साथ वर्षा जल के उपयोग की योजनायें बनायीं जायें। राज्य में सतही स्रोत भी अधिक नहीं हैं। अतः इन स्रोतों का दोहन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इन स्रोतों का भी वही हाल न हो जाए जो भू-गर्भीय जल का हुआ है।

राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि वर्षा जल से भूजल के पुनर्भरण व संग्रहण को प्राथमिकता दी जाये और सतही स्रोतों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाये ताकि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सम्भव हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वसनीय पेयजल वितरण हेतु भूजल, वर्षा जल संग्रहण एवं सतही स्रोतों को साथ-साथ उपयोग में लिया जायेगा।

वर्तमान में प्रदेश के 256 शहरों/कस्बों एवं 127736 ग्रामों व ढाणियों (हेबीटेशन) में से 43170 ग्रामों एवं 76250 ढाणियों को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। अनेक स्थानों पर उपलब्ध भूजल में अत्यधिक घुलनशील लवणों (क्लोराइड, फ्लोराइड व नाइट्रेट आदि) के होने से गुणवत्ता पेयजल के मानक मूल्यों से कम है। इसके अतिरिक्त भूजल की गुणवत्ता में बदलाव, भूजल की आमद में कमी, गिरते जल स्तर, शहरों का तीव्र विकास एवं बढ़ती हुई जनसंख्या से पेयजल की मांग में वृद्धि के कारण प्रभावी योजनाओं से पेयजल सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है।

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही अत्यंत आवश्यक है कि पेयजल की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास हैं कि समय-समय पर स्रोत व उपभोक्ता के स्तर पर पेयजल की जांच की जाए व कमी पाये जाने पर उसका तुरंत निराकरण हो।


1.1 शहरी पेयजल परियोजनाएं

राज्य के 256 शहरों व कस्बों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। इनमें से लगभग 85 शहरों व कस्बों को सतही जल स्रोतों से एवं 89 शहरों व कस्बों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 82 शहरों व कस्बों की पेयजल योजनाएं सतही एवं भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सभी बड़े एवं संभाग मुख्यालय शहरों— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर को विभिन्न सतही जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। योजनाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 21 पर उपलब्ध है।

1.2 ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं

वर्तमान में कुल 43199 आबाद ग्राम व 84537 ढाणियाँ हैं। इनमें से वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक) विभिन्न योजनाओं द्वारा 43170 ग्राम व 76250 ढाणियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 23193 ग्राम व 51972 ढाणियां भूजल से व 19977 ग्राम व

24278 ढाणियां सतही स्रोतों से लाभान्वित हैं। इसके साथ अनेक ग्राम एवं ढाणियों में हैण्ड पम्प योजनाएं भी क्रियाशील हैं। राज्य के बड़े हिस्से में भूजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। भूजल में फ्लोराइड व खारेपन की समस्या प्रमुख है। इन्हें दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे फ्लोराइड की अशुद्धि दूर करने के लिए एक्टिवेटेड एल्युमिना व खारेपन को दूर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया (आर. ओ.)। अनेक ग्रामों व ढाणियों को सतही स्रोतों पर आधारित वृहद् परियोजनाओं द्वारा भी लाभान्वित किया जा रहा है।

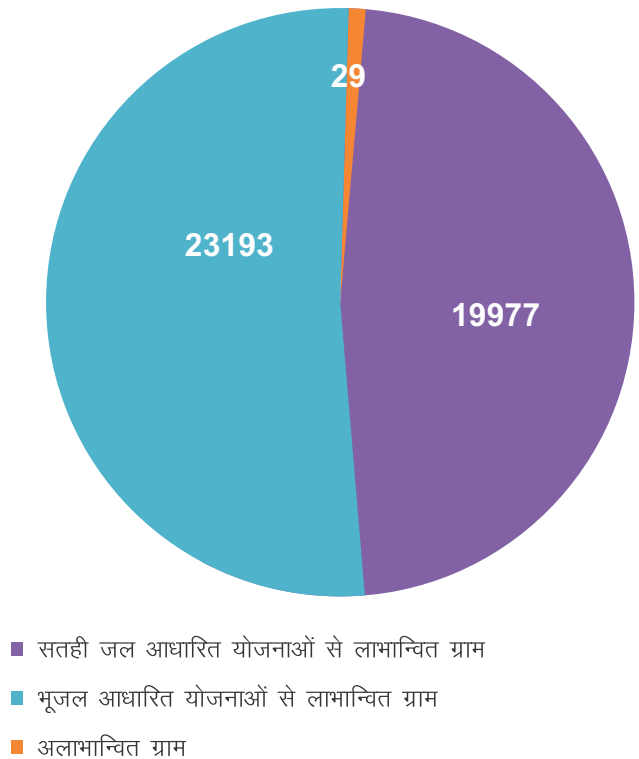

2

जल जीवन मिशन हर घर जल

1. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस, 15.08.2019 पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिसम्बर 2019 में जारी किये गये हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना लक्षित है। राजस्थान राज्य हेतु योजनाओं की लागत राशि में केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50:50 है।
2. जल प्रदाय स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन एवं संधारण में ग्राम पंचायत/स्थानीय समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है। अन्तः ग्राम पाईप लाईन जल आपूर्ति अवसंरचना और सम्बन्धित स्रोत विकास के लिए पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा नगद/या वस्तु और/या श्रम के रूप में जन भागीदारी से अनिवार्य है। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / DDP ब्लॉक की आबादी वाले ग्रामों में 5 प्रतिशत जन भागीदारी आवश्यक है।
3. जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार 4000 से अधिक आबादी वाले गांवों में (जनजाति क्षेत्र में छूट के अलावा) नल से जल उपलब्ध कराने हेतु पाईप योजनाओं के लिये मापदण्ड निर्धारित थे। कम जनसंख्या वाले गांवों में पनघट एवं हैण्डपम्प योजना हेतु मापदण्ड थे। योजनाएं 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (मरुस्थलीय इलाकों में पशुधन की मांग सम्मिलित कर 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) के

जल सेवा स्तर के अनुसार बनाई जाती थी। सतही स्रोत आधारित वृहद् पेयजल योजनाएं 35 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (मरुस्थलीय इलाकों में पशुधन की मांग सम्मिलित कर 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) के जल सेवा स्तर के अनुसार बनाई जाती थी।

4. जल जीवन मिशन की शुरुआत के पश्चात् नवम्बर 2019 में इन मापदण्डों को संशोधित किया गया। अब सभी ग्राम/बस्तियों में नल से जल उपलब्ध कराने हेतु पाईप योजनाओं के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। योजनाएं 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के जल सेवा स्तर के अनुसार बनाई जा रही है।



5. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा
 - a. राज्य स्तर पर —राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अपेक्स कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में (गठित) कार्यकारी कमेटी— सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की अध्यक्षता में (गठित)
 - b. जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन DWSM (सभी 33 जिलों में गठित)
 - c. ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति VWSC (वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता जल एवं पोषण समिति सभी 43364 गांवों में विद्यमान है। मई 2020 में राज्य सरकार के आदेश अनुसार इन विद्यमान समितियों में 5 अतिरिक्त तकनीकी सदस्य जोड़कर ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया। राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (State Project Management Unit)
 - जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को गति देने हेतु।
 - जल जीवन मिशन हेतु योजनाओं का तकनीकी आर्थिक विश्लेषण करने, देश में प्रचलित उत्तम मॉडल खोजकर लाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग इत्यादि में।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (Implementing Support Agencies)

- अन्तः ग्राम आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रखरखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी जिलों में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ आई.एस.ए. (Implementing Support Agencies) / एन.जी.ओ. (NGOs) के चयन हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आई.एस.ए. ग्रामों की जल योजनाओं हेतु कार्य योजना बनाने में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का सहयोग करेगी।

तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियाँ (Third Party Inspection Agencies)

- जल जीवन मिशन के तहत कराये गये जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता जांच के लिये।
 - जल प्रदाय योजनाओं की सुरक्षा एवं कार्यशीलता को सुनिश्चित करने के लिये।
6. वर्ष 2023–24 की प्रगति —

(अ) भौतिक प्रगति

दिनांक 01.04.2024 को कुल ग्रामीण परिवार	107.76 लाख
मार्च 2023 तक नल के माध्यम से लाभान्वित परिवार	38.84 लाख
वर्ष 2023–24 के दौरान नल द्वारा जल से लाभान्वित किये गये परिवार	12.16 लाख
दिनांक 01.04.2024 को शेष ग्रामीण परिवार जिन्हें लाभान्वित किया जाना है।	56.76 लाख

(ब) जल जीवन मिशन (राज्यांश सहित) की वित्तीय प्रगति (राशि रुपये लाखों में)

	01.04.23 को प्रारम्भिक शेष	2023–24 में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय राशि	31.3.24 को शेष राशि
जल जीवन मिशन	356433	361166	717599	683430	34169

7. वर्ष 2024–25 की प्रगति —

(अ) भौतिक प्रगति (ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन)

2024–25 का लक्ष्य	25.00 लाख
दिसम्बर 2024 तक की प्रगति	7.99 लाख

(ब) जल जीवन मिशन (राज्यांश सहित) की वित्तीय प्रगति

(राशि रुपये लाखों में)

	01.04.24 को प्रारम्भिक शेष	2024–25 में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	12/2024 तक व्यय राशि	31.12.2024 को शेष राशि
जल जीवन मिशन	34169	357565	391734	356029	35705


3

शहरी पेयजल परियोजनाएं

राज्य में जिला मुख्यालयों सहित 256 शहर/कस्बे हैं। राज्य के 256 शहर/कस्बे पाइपड पेयजल योजना से लाभान्वित हैं (जिनमें घरेलू जल कनेक्शन दिए हुए हैं)। इन सभी शहर/कस्बों में से 85 शहर/कस्बे सतही जल स्रोत एवं 89 शहर/कस्बे भूगर्भीय जलस्रोत पर आधारित हैं। शेष 82 सतही एवं भूगर्भीय दोनों जलस्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सात प्रमुख शहर यथा— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में सतही जलस्रोत से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। राज्य के अन्य शहरों/कस्बों में अत्यधिक भू-जल दोहन एवं भू-जल के कम संरक्षण होने से स्थानीय पेयजल स्रोतों के असफल होने के कारण पेयजल कमी की समस्या है। राज्य सरकार द्वारा भूगर्भीय स्रोत से सतही जलस्रोत आधारित पेयजल योजनाएं परिवर्तित करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त नीतिगत निर्णय के क्रम में सतही स्रोत आधारित विभिन्न वृहद् पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे सतही जलस्रोत से अन्य कई शहरों/कस्बों को पेयजल से लाभान्वित किया जा सकेगा। वृहद् पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में शहरी क्षेत्र में पेयजल के दीर्घकालीन स्थाई समाधान हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा रही हैं।

शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण पर गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 2020.65 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं तथा 32.39 लाख जल सम्बंधों द्वारा 408.11 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा शहरों में बुनियादी सेवाएं (अर्थात् जलापूर्ति, सीवरज, शहरी परिवहन इत्यादि) मुहैया कराने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की स्थापना की गई है। देश भर में 500 शहरों हेतु वित्त

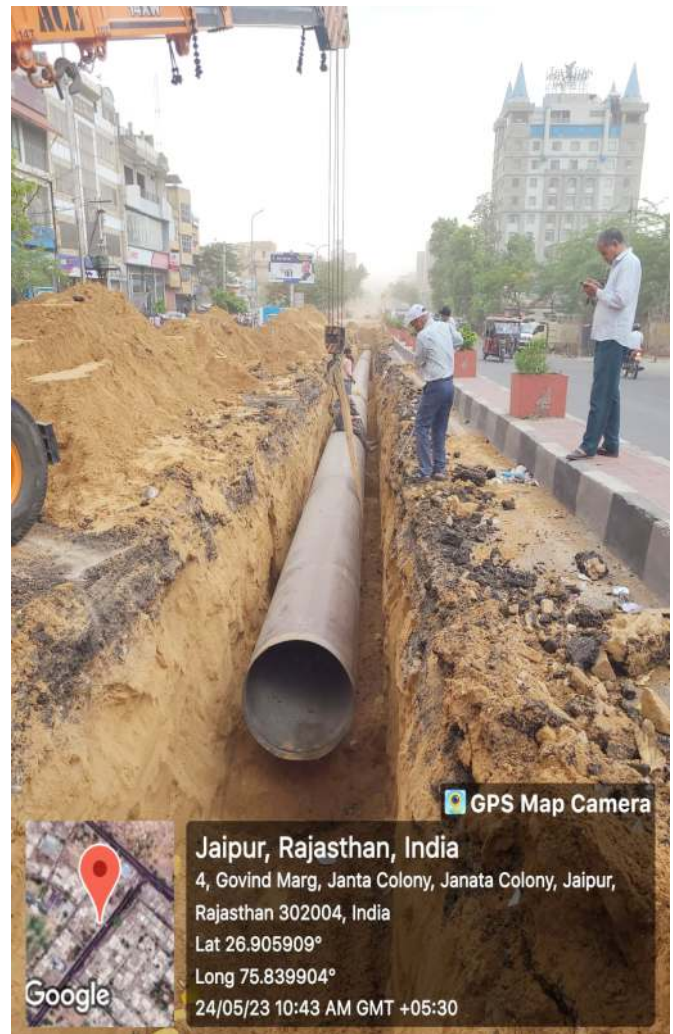

वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिये अमृत के लिये कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपये हैं और मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में संचालित किया जा रहा है। देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ हेतु चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जलापूर्ति को प्रथम वरीयता पर रखा गया है।

मिशन के अन्तर्गत राज्य में 29 शहरों (स्मार्ट सिटीज़ सहित) क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, सीकर, पाली, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर, हनुमानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर, चुरू, झुंझुनू, बारां, चित्तोड़गढ़, नागौर, हिण्डौन, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़ एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) अपनी सम्पूर्ण हैसियत में इस मिशन के कार्यक्रम का संचालन करने हेतु अधिकृत है। राज्य के 29 शहरों हेतु विभिन्न सेवाओं के लिये धनराशि निर्धारित की गई है। कुल राशि ₹ 3223.94 करोड़ (excluding A&OE and Reform Incentive) में से ₹. 1007.36 करोड़ पेयजल हेतु निर्धारित की गई। 29 शहरों में से 5 शहर क्रमशः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, टोंक एवं झुंझुनू हेतु पेयजल से संबंधित कार्य RUIDP Phase-III के अन्तर्गत, एक शहर किशनगढ़ राज्य योजना मद से एवं एक शहर उदयपुर स्मार्ट सिटीज़ के अन्तर्गत कार्य क्रियान्वित कराये जाने का निर्णय लिया गया। अमृत योजना के अन्तर्गत शेष 22 शहरों में पेयजल से संबंधित कार्य प्रस्तावित है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 1.0)

अमृत 1.0 योजना के अन्तर्गत 22 शहरों हेतु राशि रुपये 1067.83 करोड़ (मय सात वर्ष के संचालन एवं संधारण) के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक इन योजनाओं पर रुपये 831.03 करोड़ का व्यय किया जाकर, 18 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, शेष 4 योजनाओं के 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। अमृत योजना में गैर राजस्व जल में कमी करने के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0)

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अमृत 2.0 योजना की शुरुआत की गई है जिसके अन्तर्गत सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक "हर घर नल" द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उक्त योजनान्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 50 प्रतिशत, 1 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 33.33 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का

10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश के से 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति से संबंधित अमृत 2.0 के अन्तर्गत राशि 5123.06 करोड़ के कार्य स्वीकृत है जिनका क्रियान्वयन जन स्वा0 अभि0 विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

183 नगरीय निकायों में से 165 नगरीय निकायों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा शेष कस्बों की तकनीकी स्वीकृति और निविदाएं आमंत्रण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्तर्गत शामिल अलवर जिले में 5 शहर/कस्बे – अलवर, राजगढ़, बहरोड़, तिजारा एवं भिवाड़ी की पुनर्गठित/संवर्द्धन पेयजल योजनाएं क्रमशः ₹. 174.86 करोड़, ₹. 20.24 करोड़, ₹. 26.02 करोड़, ₹. 16.46 करोड़ एवं ₹. 40.69 करोड़ की राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड (NCRPB) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु NCRPB द्वारा 75 प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध करवाई जायेगी एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध विभाग द्वारा अलवर, राजगढ़, बहरोड़, तिजारा एवं भिवाड़ी कस्बे के लिए क्रमशः ₹. 145.15 करोड़, ₹. 17.43 करोड़, ₹. 24.04 करोड़, ₹. 16.02 करोड़ एवं ₹. 60.64 करोड़ के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं जिनमें से तिजारा एवं बहरोड़ पर फर्म द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण कार्य टर्मिनेट कर दिया गया है। अलवर व भिवाड़ी में कार्य प्रगति पर है। भिवाड़ी कस्बे के लिए प्रदत्त कार्यादेश में राज्यमद से जारी स्वीकृति तथा उक्त स्वीकृति (NCRPB) दोनों के कार्य सम्मिलित है। उक्त परियोजनाओं में राजगढ़ कस्बे का कार्य पूर्ण हो चुका है। अलवर, राजगढ़, बहरोड़, तिजारा एवं भिवाड़ी कस्बे के लिए क्रमशः ₹. 122.45 करोड़, ₹. 12.77 करोड़, ₹. 14.25 करोड़, ₹. 7.50 करोड़ एवं ₹. 55.51 करोड़ खर्चा किया जा चुका है।

इस क्रम में 2 शहर/कस्बे—खैरथल एवं किशनगढ़बास हेतु राशि क्रमशः ₹.36.26 करोड़ एवं ₹. 21.05 करोड़ की पेयजल योजनाओं हेतु राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड (NCRPB) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं एवं स्रोत निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कस्बे—खैरथल एवं किशनगढ़बास हेतु राशि क्रमशः ₹. 13.83 करोड़ एवं ₹. 09.34 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त

स्वीकृतियों के कार्यादेश राशि क्रमशः रु. 41.13 करोड़ दिनांक 3.10.2018 एवं रु. 28.52 करोड़ दिनांक 25.7.2018 जारी किये जा चुके हैं। खैरथल पेयजल परियोजना का कार्य धीमी प्रगति से होने के कारण टर्मिनेट कर दिया गया है, पुनः निविदा प्रक्रियाधीन है तथा किशनगढ़बास पेयजल परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

गैर राजस्व जल

राज्य सरकार एवं डेनमार्क के मध्य शहरी पेयजल क्षेत्र में सतत विकास हेतु सहयोग के लिए दिनांक 19.05.2023 को एम.ओ.यू. स्थापित। प्रथम चरण में जयपुर, भीलवाड़ा एवं नवलगढ़ शहरों में पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 24x7 पेयजल वितरण एवं गैर जल राजस्व के छीजत में कमी हेतु कार्य प्रस्तावित।

जयपुर शहर में गैर राजस्व जल में कमी करने के लिए शहर के 5 क्षेत्रों क्रमशः मानसरोवर सेक्टर 1 कावेरी पथ, रामद्वारा सांगानेर, चित्रकूट, बजाज नगर एवं मालवीय नगर सेक्टर 9 को चिन्हित कर DMA आधार पर ट्रायल बेसिस पर 24X7 जल वितरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत ट्रायल बेसिस पर नवंबर माह से बजाज नगर एवं चित्रकूट में 24X7 जल का वितरण किया जा रहा है जिससे यहां वर्तमान गैर राजस्व जल क्रमशः 44.2% एवं 27% है, जिसे घटाकर 20 %

किया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अन्य 3 क्षेत्रों में 24X7 आधार पर जल वितरण सर्वे का कार्य प्रगतिरत है, जिसे अगले दो माह में पूर्ण कर 24X7 आधार पर जल वितरण किया जाना लक्षित है।

जयपुर शहर में गैर राजस्व जल में कमी करने के उद्देश्य से अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत है।

जयपुर शहरी पेयजल परियोजनाएं

बीसलपुर— डिग्गी—मालपुरा रोड़ से टोंक रोड़ के मध्य क्षेत्र (बीसलपुर जोन एस—15 से एस—18):—

जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना डिग्गी—मालपुरा रोड़ से टोंक रोड़ के मध्य क्षेत्र (बीसलपुर जोन एस—15 से एस—18) हेतु राशि रु. 114.73 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 06.10.2022 को जारी किया गया एवं परियोजना पर राशि रु. 98.45 करोड़ का व्यय किया गया है। योजना से वर्ष 2024 की 125000 आबादी को बीसलपुर पेयजल से लाभान्वित किया जाना है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 70467 आबादी को परियोजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है जो कि फरवरी, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।



इंटेक पंप हाउस एवं सूरजपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट

बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत सेन्ट्रल ट्रांसफर मैन के पुर्नगठन का कार्य:—

जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत सेन्ट्रल ट्रांसफर मैन के पुर्नगठन का कार्य हेतु राशि रु. 94.22 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 18.04.2022 को जारी किया गया एवं वर्तमान में परियोजना पर राशि रु. 86.78 करोड़ व्यय किया गया है। उक्त परियोजना का कार्य दिनांक 10.06.2024 को पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से मुख्यतः हवामहल, आमेर एवं आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभांविता किया गया है। परियोजना अन्तर्गत 4 वितरण केन्द्रों ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी, बन्ध गेट एवं न्यू फिल्टर प्लांट पम्प हाउस पर क्रमशः 17.20, 20.20, 14.30 एवं 15.90 मिलियन लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाकर क्रमशः 110771, 98131, 96212 एवं 102324 वर्तमान आबादी को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

बीसलपुर बांध आधारित जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड़ के आस-पास के क्षेत्र हेतु पेयजल योजना फेज द्वितीय:—

बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड़ के आस-पास के क्षेत्र हेतु राशि रु. 214.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 28.04.2023 को जारी किया गया एवं परियोजना पर राशि रु. 81.18 करोड़ व्यय किया गया है। वर्तमान में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं, तथा शेष कार्य प्रगतिरत है जो कि मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। उक्त परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण होने पर वर्ष 2054 तक 226002 आबादी को लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना स्टेज—द्वितीय, फेज— प्रथम:—

जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना स्टेज—द्वितीय, फेज—प्रथम हेतु राशि रु. 288.90 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया एवं परियोजना पर राशि रु. 182.80 करोड़ व्यय किया गया है। वर्तमान में 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत है जो कि दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज—प्रथम, स्टेज—प्रथम:—

जयपुर शहर में पेयजल से अलाभान्वित बाहरी क्षेत्र की कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज—प्रथम, स्टेज—प्रथम के लिए राशि रु. 563.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 12.03.2020 को दिया गया एवं परियोजना पर राशि रु. 440.86 करोड़ व्यय किया गया है। योजना से वर्ष 2024 की 234000 आबादी को बीसलपुर पेयजल से लाभान्वित किया जाना है जिसमें से वर्तमान में लगभग 70000 आबादी को परियोजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत है जो कि जुलाई—2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज—प्रथम स्टेज—द्वितीय, फेज—द्वितीय:—

परियोजना के द्वितीय चरण में राशि रु. 747.08 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 04.07.2023 को जारी किया गया एवं परियोजना पर राशि रु. 184.98 करोड़ व्यय किया गया है। वर्तमान में 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत है जो कि दिनांक 12.08.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।


4

वार्षिक योजना 2024-25

4.1 भौतिक प्रगति

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) के तहत वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत दिसम्बर 2024 तक के लक्षित 25 लाख घरेलू जल संबंधों (FHTC) के विरुद्ध 7.99 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंधों से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 के प्रारम्भ में कुल ग्रामीण परिवार 106.93 लाख में से मार्च 2024 तक 38.84 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंध जारी किया जा चुका था एवं जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023-24 में 12.15 लाख घरेलू जल संबंध जारी किये गए। विवरण परिशिष्ट- 2 व 3 पर दर्शाया गया है।

राज्य में कुल 256 शहर/कस्बे, 43199 आबाद ग्राम व 84537 ढाणियाँ हैं। इनमें से वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक) विभिन्न योजनाओं द्वारा 43170 ग्राम व 76250 ढाणियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 23193 ग्राम व 51972 ढाणियां भूजल से व 19977 ग्राम व 24278 ढाणियां सतही स्रोतों से लाभान्वित हैं। दिसम्बर 2024 तक लाभान्वित कुल ग्राम व ढाणियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 4 व 5 पर उपलब्ध है।

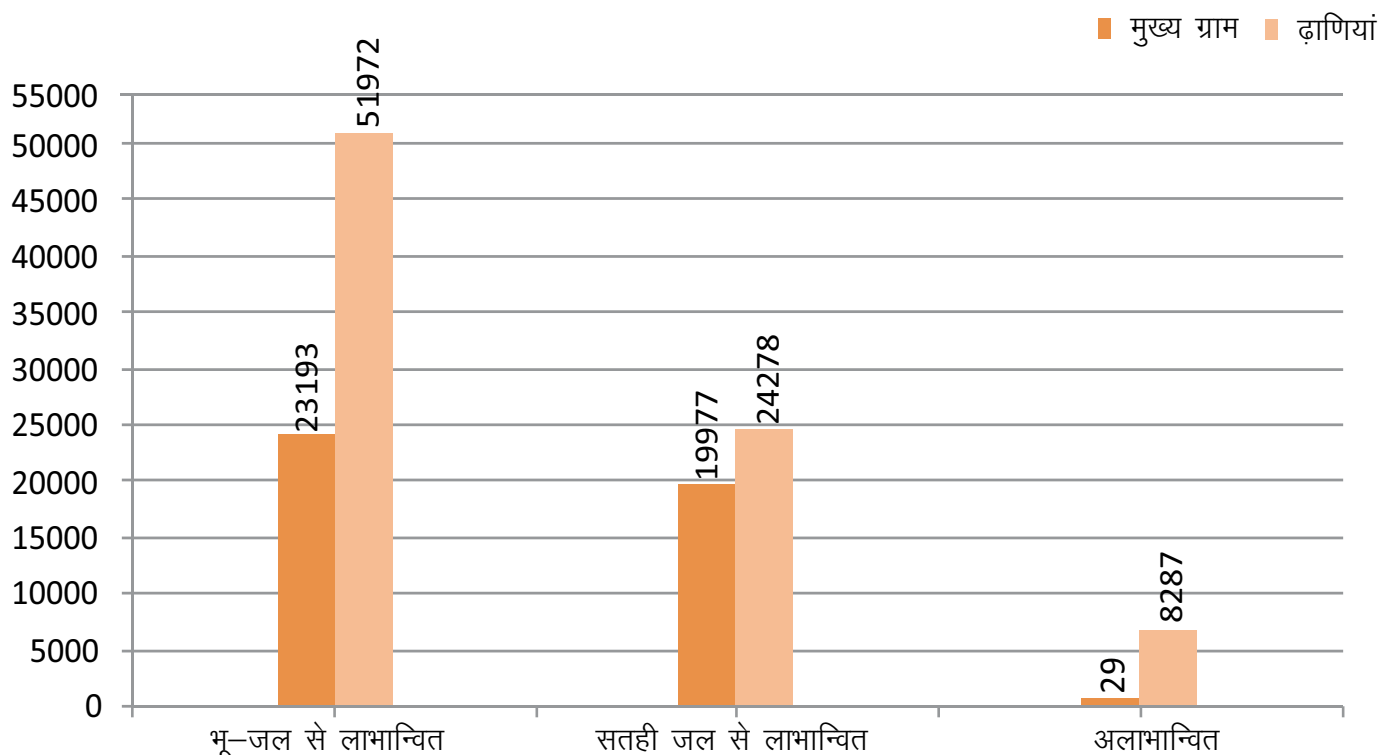

विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित ग्राम व ढाणियों की संख्या

4.2 वित्तीय प्रगति

4.2.1 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त राशि व व्यय

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामान्य, गुणवत्ता एवं सस्टेनबिलिटी योजनाएं

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	केन्द्र/राज्य	प्रारम्भिक शेष (01.04.24)	प्राप्त राशि 2024-25 12/2024 तक	कुल उपलब्ध राशि 2024-25 12/2024 तक	व्यय 2024-25 12/2024 तक
1	भारत सरकार से प्राप्त राशि	637.58	1659.22	2296.80	2315.58
2.	राज्य सरकार से प्राप्त राशि	-295.89	1916.43	1620.54	1244.71
	योग	341.69	3575.65	3917.34	3560.29

4.2 राज्य फण्ड एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की वार्षिक योजना 2024-25 का बजट अनुमान एवं व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना	बजट अनुमान 2024-25	व्यय 2024-25 12/2024 IFMS के अनुसार
1	नगरीय (शहरी) पेयजल योजनाएं		
	राज्य फण्ड	235804.53	116976.24
2	ग्रामीण पेयजल योजनाएँ		
	राज्य फण्ड	373564.58	202245.00
	कुल योग (नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाएँ)	609369.11	319221.24

5

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राजस्थान (SWSM)

सपोर्ट प्रोग्राम (सहायक गतिविधियाँ)

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.), कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सहायक गतिविधि) द्वारा सहायक गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन कार्यों के सम्पादन हेतु त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र निम्नानुसार है:—

संस्थागत तंत्र (Institutional Set Up)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)

राज्य स्तर पर “राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन” का गठन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अनुसार वर्ष 2000 में हुआ था। यह संगठन राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। पूर्व में जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन जल एवं स्वच्छता मिशन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) के माध्यम से किया जा रहा था। जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस के अनुसार डब्ल्यू.एस.एस.ओ. को दिनांक 31.10.2022 को एस.डब्ल्यू.एस.एम. में समाहित कर दिया गया एवं सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सहायक गतिविधि), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर का अस्थायी रूप से नवसृजन किया गया है। तदनुसार वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सहायक गतिविधि) द्वारा किया जा रहा है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.)

जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन मुख्य सचिव, राजस्थान के आदेश दिनांक 29.05.2020 के अनुसार समस्त जिलों में किया जा चुका है। यह संगठन

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी)

ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन मुख्य सचिव, राजस्थान के आदेश दिनांक 29.05.2020 के अनुसार समस्त जिलों में किया जा चुका है। यह समिति अंतः ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन प्रबंधन और रखरखाव में मुख्य भूमिका निभाएगी।

वर्ष 2024–25 में जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत किए गए मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

1. एस.पी.एम.यू (S.P.M.U)
2. टी.एस.यू (T.S.U)
3. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (I.S.A)
4. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियाँ (IEC)
5. मानव संसाधन विकास (HRD)
6. क्षमता संवर्धन एवं कौशल विकास
7. तृतीय पक्ष निरीक्षण (TPI)

1. एस.पी.एम.यू (S.P.M.U)

जल जीवन मिशन के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों की राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. को नवीनतम ज्ञान के साथ विशेषज्ञता प्रदान करने एवं सहायता तालमेल स्थापित करने और कार्यों को गति प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञों की सेवाएं लेने हेतु एस.पी.एम.यू हेतु परामर्शदाता एजेंसी मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग को कार्य आवंटित कर टीम लीडर, वित्तीय विशेषज्ञ, पेयजल वितरण विशेषज्ञ, प्रोक्योरमेंट विशेषज्ञ, जल गुणवत्ता विशेषज्ञ एवं



स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्यस्तरीय समारोह झुंझुनू में

प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाकर मिशन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

2. टी.एस.यू (T.S.U)

राज्य में राज्य/उपखण्ड/संभाग/जिला स्तर पर तदर्थ (अस्थाई) रूप से एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग बेसिस पर अभियांत्रिकी, वित्तीय एवं डेटा प्रबंधन के कार्यों हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बनाई जाकर एजेन्सी को कार्य आवंटन हेतु R.T.P.P. नियमों के तहत निविदा प्रक्रिया अपनाई जाकर में नियत कार्यों के संपादन से जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट (MP) तथा अन्य पेयजल योजनाओं (OTMP) के त्वरित क्रियान्वयन में T.S.U एजेन्सी की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

3. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (I.S.A)

अंतःग्राम आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित कर एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राज्य के समस्त जिलों में आई.एस.ए. का चयन कर कार्य किया जा रहा है। नई योजनाओं के लिए, प्रत्येक आई.एस.ए. एक बार में 50-60 गांवों के लिए अधिकतम 18 महीने के पूरे परियोजना चक्र के लिए उत्तरदायी होगा। आई.एस.ए. द्वारा मुख्य रूप से वी.डब्ल्यू.एस.सी का गठन सुगम बनाना और इसके कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन की व्यवस्था करना, वी.डब्ल्यू.एस.सी. के बैंक खाते खोलना, सामुदायिक अंशदान जुटाना, ग्राम सभा का आयोजन करना, ग्राम योजना स्वीकृत करना, संचालन एवं

रखरखाव की व्यवस्था करना, समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों में वी.डब्ल्यू.एस.सी को सहायता देने के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। आई.एस.ए. के द्वारा 42066 गांवों में से 41890 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है एवं 41880 विलेज एक्शन प्लान बनाए जा चुके हैं। आई.एस.ए. एजेंसियों द्वारा प्री-प्लानिंग एवं प्लानिंग फेज के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं वर्तमान में क्रियान्विति फेज के कार्य जारी हैं। समस्त जिलों की जिला कार्य योजना (DAP) तैयार कराई जाकर जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित कराई जा चुकी है।

4. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियाँ (IEC)

इस वर्ष के दौरान राज्य में जन समुदाय में जल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने; जल जीवन मिशन का प्रचार प्रसार करने एवं समाज में पेयजल संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न संप्रेषण माध्यमों यथा—इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिसप्ले, विडियो स्पॉट्स, बस अड्डों पर ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेलवे कोचेज की बाहरी सतह पर विनाईल रैपिंग आउटडोर मीडिया—(होर्डिंग्स, सनबोर्ड, फ्लैक्स, बैनर, वॉल पेटींग) इत्यादि का उपयोग करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना में प्रावधान किये गये हैं, उक्त वार्षिक कार्य योजना की भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। आई.ई.सी. के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:—

- हर घर नल से जल एवं जल जीवन मिशन
- जन समुदाय द्वारा जल का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग
- जल संरक्षण

(iv) वर्षा जल संग्रहण

(v) शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य

5. मानव संसाधन विकास (HRD)

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- एक दिवसीय राज्य स्तरीय आरिऐन्टेशन "Jal Jeevan Mission in Rajasthan" का आयोजन दिनांक 23 फरवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर जयपुर में किया गया, जिसमें विभाग के 1100 अभियंताओं ने भाग लिया।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत लेवल-1 के अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Water Security & Climate Adaption Plan" का आयोजन दिनांक 14-15 मार्च 2024 को होटल क्लार्क्स आमैंर, जयपुर में किया गया, जिसमें 25 वरिष्ठ अभियंताओं ने भाग लिया।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत लेवल-2 के अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के तहत "Climate Resilience Water Supply Infrastructure in Planning and Implementation" का आयोजन दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2024 को जयपुर में किया गया, जिसमें 40 अभियंताओं ने भाग लिया।
- विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च, 2024 को विभाग के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जल संरक्षण हेतु जल शपथ ली गयी।

- दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "IEC Workshop on JJM" का आयोजन दिनांक 21-22 मई 2024 को SPM-Niwas निवास कोलकाता में किया गया, जिसमें विभाग से दो अधिकारियों ने भाग लिया।
- एक दिवसीय जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु सेमीनार का आयोजन दिनांक 5 जुलाई 2024 को कॉन्फ्रेंस हाल, जल भवन, जयपुर में माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया जिसमें विभाग के अभियंताओं, ISA, व NGO के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Stress Management and Strategic Financial Planning for Organization Excellence" में तत्कालीन मिशन निदेशक (जे.जे.एम.) ने दिनांक 22-26 जुलाई 2024 भाग लिया।
- एक दिवसीय कार्यशाला "IEC for Demand Side Management and Other Related Issues" का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को भारत मण्डप, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें मिशन निदेशक (जे.जे.एम.) ने भाग लिया।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण नीति के प्रावधानों पर राज्य स्तरीय चर्चा का आयोजन, समिति कक्ष, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर में दिनांक 27 नवम्बर 2024 को किया गया, जिसमें NJJM प्रतिनिधि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के





अधिकारियों, NGO, TPIA प्रतिनिधियों एवं जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों सहित 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत सफलता की कहानियों "Good Practices in Jal Jeevan Mission, Rajasthan" का विमोचन माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2024 को किया गया।
- राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 15-17 दिसम्बर 2024 को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का जवाहर कला केन्द्र में आयोजन किया गया, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की गत एक वर्ष की उपलब्धियां को प्रदर्शित किया गया।
- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत लेवल-2 हितधारकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) के सहयोग से Change Management for Jal Jeevan Mission Project एवं Planning and Management for Jal Jeevan Mission Project विषयों पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर सेंटर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

विभाग के 1270 अभियन्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत लेवल-3 हितधारकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर चयनित 3 एजेंसीज के माध्यम से सरपंच, उप-सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल हितधारकों हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें लगभग 22691 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

6. क्षमता संवर्धन एवं कौशल विकास

जल जीवन मिशन के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के सहयोग से विभिन्न ITI संस्थानों द्वारा 7799 इलेक्ट्रीशियन, 7705 फिटर एवं 6009 प्लंबर कुल 21513 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

7. तृतीय पक्ष निरीक्षण (TPI)

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार मिशन के कार्यों हेतु अन्य पक्ष निरीक्षण संस्थाओं द्वारा सम्पूर्ण राज्य के जल जीवन मिशन के कार्यों की तृतीय पक्ष जांच हेतु निम्नानुसार कार्य आवंटित किया गया है:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	आवंटित क्षेत्रीय कार्यालय
1	मैसर्स वॉपकोस लिमिटेड	अजमेर, उदयपुर, प्रोजेक्ट रीजन अजमेर प्रोजेक्ट रीजन उदयपुर
2	मैसर्स नैबकॉन्स	भरतपुर, कोटा, जोधपुर (प्रथम एवं द्वितीय) एन.सी.आर. अलवर, प्रोजेक्ट रीजन बाड़मेर, आर.जी.एल.सी. जोधपुर, प्रोजेक्ट रीजन भरतपुर, प्रोजेक्ट रीजन चूरू, मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट, जोधपुर।
3	मैसर्स राईट्स लिमिटेड	जयपुर (प्रथम एवं द्वितीय), बीकानेर, प्रोजेक्ट रीजन जयपुर

उक्त संस्थाओं द्वारा समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुबंध स्थापित कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की साईट निरीक्षण के कार्य, सामग्री की गुणवत्ता

निरीक्षण, डिजाइन की समीक्षा इत्यादि के कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं।

6

पेयजल परिवहन

संवत् 2080 में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा 13 जिलों की 48 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इन अभावग्रस्त जिलों/क्षेत्रों में जल परिवहन जिला प्रशासन द्वारा करवाया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी अन्य समस्याग्रस्त जिलों/क्षेत्रों जल परिवहन करवाया गया।


वर्ष 2024 की ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग से अधिकतम 6786 गांव एवं 8631 ढाणियों (कुल 15417) में 16022 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अधिकतम 92 कस्बों/शहरों में 5114 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया गया।

ग्रीष्म, 2024 के दौरान राज्य में सड़क मार्ग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम प्रतिदिन उपलब्ध करवाये गये पेयजल का विवरण निम्नानुसार है।

ग्रीष्म संवर्धन 2024 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

विवरण	शहरी	ग्रामीण
लाभान्वित शहर/गांव/ढाणियां	92	15417
सड़क द्वारा अधिकतम परिवहन टैंकर ट्रिप प्रतिदिन की संख्या	5114	16022

ग्रीष्म संवर्धन 2024 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है।

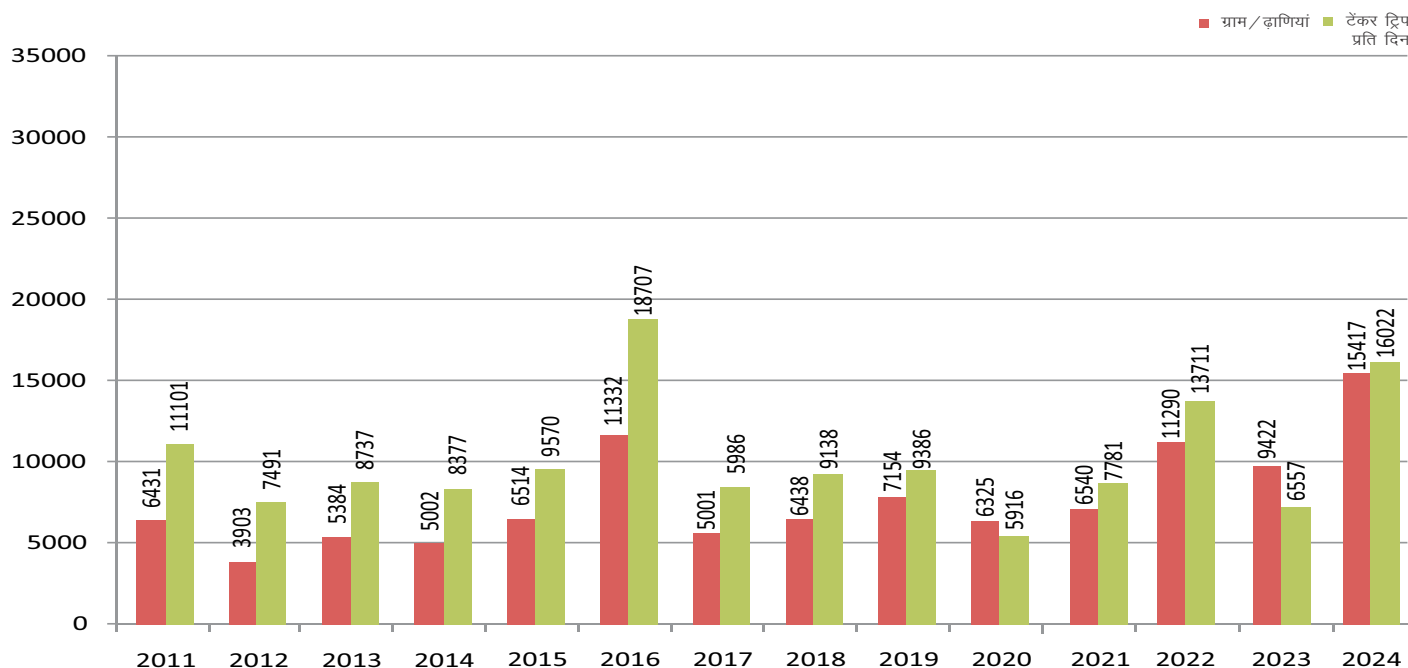


विगत वर्षों में ग्रीष्म संवर्धन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन

हैण्डपम्प मरम्मत अभियान

हैण्डपम्पों का रखरखाव जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा किया जाता रहा है। जनवरी 2008 से सभी जिलों में वर्ष पर्यन्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में पेयजल वितरण एवं संधारण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु 48वाँ विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1.04.2024 से 31.03.2025 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 164684 एवं शहरी क्षेत्रों में 27994 हैण्डपम्प मरम्मत किये गये। इस हेतु प्रति वर्ष की भांति ग्रीष्म काल, 2024 में 560 अनुबन्ध वाहन एवं 2500 श्रमिक संविदा पर उपलब्ध कराए गये। वर्तमान में 110 किराये के वाहन उपलब्ध करवा कर हैण्डपंप मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। 47वें अभियान के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों का जिलेवार विवरण क्रमशः

परिशिष्ट-8 व 9 पर दर्शाया गया है। इसी तरह 48वें मरम्मत अभियान के तहत अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक मरम्मत हैण्डपंप का विवरण परिशिष्ट 10 व 11 पर उपलब्ध है।

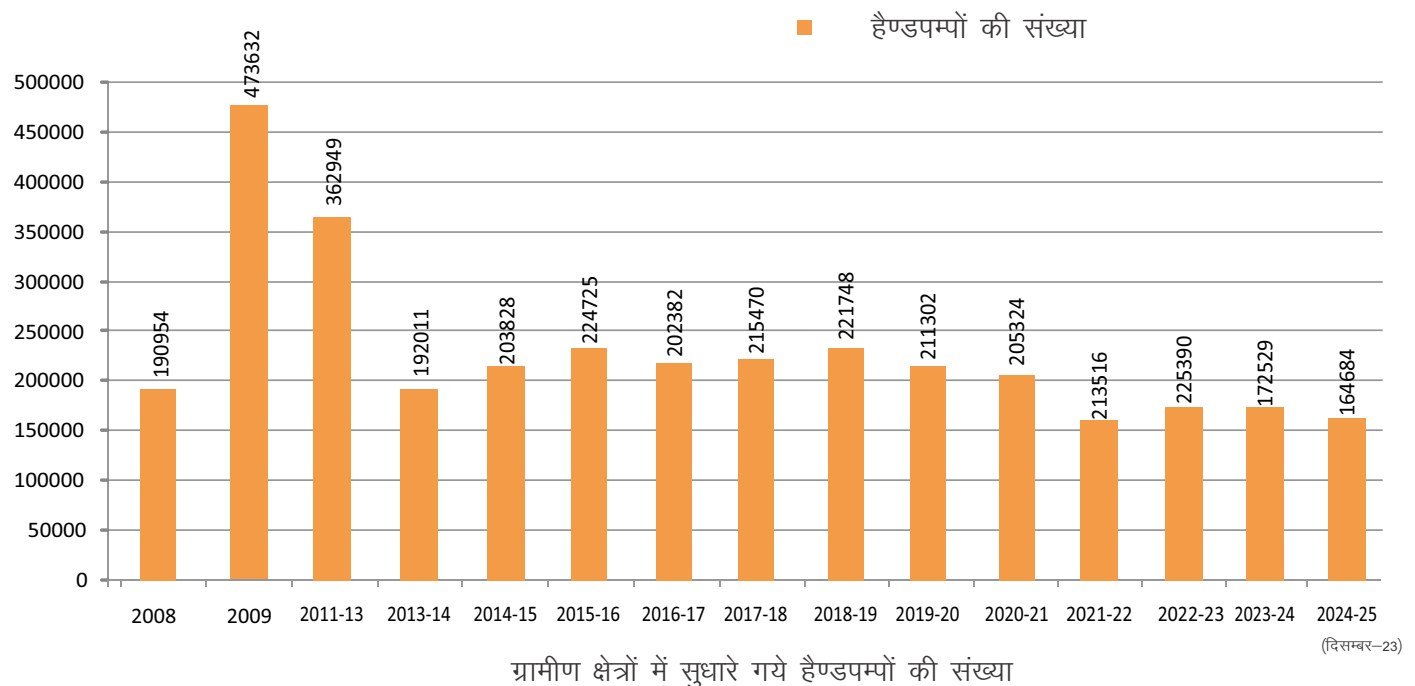

8

सामुदायिक जल शोधन संयंत्र

आर ओ प्लान्ट

विभाग द्वारा मुख्यतः पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराईड की समस्याओं सहित बहुगुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों/ढाणियों में आर. ओ. प्लांट्स मय बोरवेल निर्माण, विद्युत कनेक्शन एवं 07 वर्ष ओ एण्ड एम सहित लगाने का कार्य हाथ में लिया गया था। अब तक कुल 4063 आर. ओ. प्लांट की स्थापना की जा चुकी है।

सौर आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र

राज्य में गुणवत्ता प्रभावित एवं ग्राम एवं ढाणियों में जहां केवल फ्लोराईड की समस्या है में प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सौर उर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र का कार्य हाथ में लिया गया था। योजना की सफलता के लिए सात वर्ष तक संधारण एवं संचालन भी मूल कार्य में सम्मिलित है, जो स्थापना करने वाली फर्म द्वारा ही किया जाना है। अब तक कुल 3,455 सौर आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरीडेशन यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 24 पर दर्शाया गया है।



प्रतिबद्ध राज्य निधि संधारण व्यय तथा राजस्व

वर्ष 2023–24 में बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के संशोधित अनुमान राशि रुपये 4665.99 करोड़ के थे। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 300.02 करोड़ बजट मद 2215 में बजट मद 4215 से ओ. एण्ड एम. के लिए स्थानान्तरित किये जाने के संशोधित बजट अनुमान थे, इस प्रकार बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय अन्तर्गत कुल राशि रुपये 4966.01 करोड़ के संशोधित बजट अनुमान थे। वर्ष 2024–25 में बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के बजट अनुमान राशि रुपये 5193.46 करोड़ के थे। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 296.85 करोड़ के बजट मद 2215 में

बजट मद 4215 से ओ. एण्ड एम. के लिये स्थानान्तरित किये जाने के बजट अनुमान के प्रावधान थे। इस प्रकार बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 5490.31 करोड़ के बजट अनुमान हैं। इस मद अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि में से कार्मिकों के वेतन, भत्तों तथा योजनाओं के संचालन एवं संधारण संबंधी व्यय किये जाते हैं। योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए उनके विद्युत बिलों का भुगतान, पम्प मोटर की मरम्मत, पाईप लाईनों की मरम्मत के बिलों का भुगतान उक्त स्वीकृत प्रावधान में से किया जाता है।

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	2023–24	2024–25 दिसम्बर 24 तक
1	19— विद्युत प्रभार	2644.29	2020.22
2	21— अनुरक्षण मरम्मत	131.10	114.94
3	41— संविदा व्यय	213.06	192.05
4	45— वितरण प्रणाली में सुधार	129.80	109.25
5	70— रायासनिक प्रभार	30.38	27.63
6	वेतन एवं अन्य भत्ते	1492.59	1837.25

इसके अतिरिक्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए एलम, क्लोरीन एवं ब्लीचिंग पाउडर आदि का व्यय भी इस राशि से भारित होता है। जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से लिए जा रहे रौं-वाटर का भुगतान भी इस मद से किया जाता है। वृहद

परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण संबंधी व्यय भी इस मद के अन्तर्गत उपमद संविदा व्यय से किया जाता है। वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 (माह दिसम्बर 2024 तक) अन्तर्गत बजट मद 2215 प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय उपरोक्तानुसार है।

10

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

वर्तमान में रु. 39362.64 करोड़ लागत की 120 वृहद् पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनके अन्तर्गत 107 शहरों, 16680 ग्रामों व 12685 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक रु. 24406.44 करोड़ लागत की 98 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर 77 शहरों, 10095 ग्रामों तथा 10946 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 19 परियोजनाएं रु. 13558.18 करोड़ लागत की प्रगतिरत हैं, जिनसे अभी तक 29 शहरों, 4453 ग्रामों तथा 852 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 03 परियोजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

जल जीवन मिशन के तहत रु. 71557.39 करोड़ लागत की 139 परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिनके तहत 28328 गांवों में 48.50 लाख जल संबंध किये जाने हैं। वर्तमान तक 6847 गांवों में 14.60 लाख जल संबंध किये जा चुके हैं। इन योजनाओं पर दिसम्बर 2024 तक रु. 9326.69 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

वृहद् पेयजल परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

1.0 चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना – प्रथम चरण

जिला करौली एवं सवाई माधोपुर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु चम्बल नदी को जल स्रोत लेते हुए चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति (पी.पी.सी.) 157/22.09.2004 एवं संशोधित स्वीकृति (पी.पी.सी.) 191/19.09.2013 द्वारा रु. 567.00 करोड़ की जारी की गयी। परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के कुल 636

ग्राम एवं सवाई माधोपुर शहर तथा द्वितीय चरण में कस्बा सवाई माधोपुर तथा करौली की 100 प्रतिशत पेयजल मांग एवं कस्बा गंगापुर सिटी तथा टोडाभीम की 50 प्रतिशत पेयजल मांग के अतिरिक्त सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के कुल 926 ग्रामों (प्रथम चरण के 636 ग्रामों सहित) की पेयजल मांग सम्मिलित है।

प्रथम चरण के प्रथम पैकेज के तहत चम्बल नदी पर मण्डरायल के पास इन्टेक वैल, मण्डरायल घाटी में जलशोधन प्लांट एवं पम्प स्टेशन तथा सवाई माधोपुर तक मुख्य ट्रान्समिशन पाईप लाईन डालने के कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 23.09.2005 को लागत रु. 269.30 करोड़ का जारी किया गया था। परियोजना का कार्य प्रगतिरत है।

प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज के तहत नादौती तहसील के 63 गांवों तथा गंगापुर एवं करौली के 46 मार्गस्थ गांव कुल 109 गांवों के क्लस्टर पेयजल वितरण का कार्यादेश दिनांक 23.09.2013 को, रु. 234.90 करोड़ का जारी किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत 2 कस्बे करौली व गंगापुर सिटी को आंशिक जल उपलब्ध कराया गया है एवं 76 ग्रामों को पेयजल वितरण शुरू किया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक कुल रु. 451.27 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

2.0 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना-प्रथम चरण, भाग प्रथम

भरतपुर जिले में खारे पानी की समस्या से ग्रसित तहसील भरतपुर, कुम्हेर, रूपवास, नगर, डीग, कांमा एवं पहाड़ी के समस्त 945 गाँवों एवं परियोजना की मुख्य पाइप लाइन के रास्ते के जिला धौलपुर में तहसील धौलपुर के 62 गाँवों एवं तहसील सैंपड के 44 गाँवों (धौलपुर जिले के कुल 106

गाँवों), कुल 1051 गाँवों व भरतपुर जिले के 5 शहरों (भरतपुर, कुम्हेर, नगर, डीग एवं कांमा) को लाभान्वित किये जाने के लिए चम्बल नदी पर इन्टेक वैल बनाकर भरतपुर तक ट्रान्समिशन मेन इत्यादि कार्य एवं धौलपुर जिले के 106 गाँवों व भरतपुर जिले के 93 गाँवों का जल वितरण परियोजना के इस प्रथम भाग के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की संशोधित स्वीकृति पी.पी.सी. 189/28.01.2013 द्वारा रु. 548.68 करोड़ की जारी की गई थी।

चम्बल धौलपुर से मलाह हैड वर्क्स भरतपुर तक मुख्य ट्रान्समिशन मेन के सभी कार्य लगभग पूर्ण कर दिये हैं एवं दिनांक 11.10.2011 से जल सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई थी जिसके तहत भरतपुर शहर को आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। धौलपुर जिले के 62 गाँवों की ग्रामीण जल योजना के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं प्रस्तावित सभी गाँवों में पेयजल वितरण चालू कर दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1 कस्बे, 177 ग्राम एवं 22 ढाणियों को पेयजल वितरण शुरू किया गया है। परियोजना के इस भाग पर दिसम्बर 2024 तक कुल 408.06 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

3.0 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना- प्रथम चरण, भाग- द्वितीय (क्लस्टर)

भरतपुर जिले में खारे पानी की समस्या से ग्रसित तहसील भरतपुर, कुम्हेर, रूपवास, नगर, डीग, कांमा एवं पहाड़ी के समस्त 755 गाँवों एवं भरतपुर जिले के 4 शहरों (कुम्हेर, नगर, डीग एवं कांमा) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की स्वीकृति पी.पी.सी. द्वारा 190 वीं मीटिंग दिनांक 30.05.2013 में रु. 720.31 करोड़ की जारी की गई है। परियोजना के कार्यों को तीन क्लस्टर पैकेज के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। 4 शहरों, 433 ग्रामों एवं 25 ढाणियों को चम्बल नदी का पानी पहुँचा दिया गया है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक रु. 604.94 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

4.0 नर्मदा (ई.आर.) ट्रांसमिशन मेन परियोजना :-

जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की नर्मदा ई.आर. आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को रु. 455.16 करोड़ की जारी की गई। वर्तमान में योजना पर कार्य प्रगतिरत है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय

राशि रु. 330.09 करोड़ किये जा चुके हैं।

5.0 नर्मदा गुडामलानी पेयजल परियोजना (एच.आर.) :-

बाड़मेर जिले के 177 गाँवों (जनगणना 2001) के लिये पेयजल हेतु आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को रु. 160 करोड़ की जारी की गई। वर्तमान में योजना पर कार्य प्रगतिरत है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 124.43 करोड़ किये जा चुके हैं।

6.0 इन्दिरा गांधी मुख्य नहर पर आधारित विभिन्न पेयजल परियोजनाएं

6.1 बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-अ (भाडका-चोखला-बांदरा-ईस्ट परियोजना) :-

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट अ (भाडका, चोखला, बांदरा, ईस्ट परियोजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 187 दिनांक 27.09.11 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 202.36 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत कुल 171 गांव शामिल हैं। परियोजना के 125 गाँवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यादेश निरस्त कर शेष कार्य हेतु अन्य फर्म को दिनांक 04.10.2019 को कार्यादेश जारी किया गया। योजना पर दिसम्बर 2024 तक रु. 141.90 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

6.2 बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-ब (बाड़मेर-रावतसर-खरन्टिया परियोजना) :-

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट ब (बाड़मेर-रावतसर-खरन्टिया परियोजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 188 दिनांक 24.08.12 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 125 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत बाड़मेर तहसील के 50 गांव एवं बायतु तहसील के 17 गांव, कुल 67 गांव शामिल हैं। परियोजना के 67 गाँवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में योजना पर कार्य प्रगतिरत है। योजना पर दिसम्बर 2024 तक रु. 102.46 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

6.3 बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-स (केकेडी-शिव-भाड़का-बाड़मेर) :-

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के पार्ट-स (केकेडी-शिव-भाड़का-बाड़मेर) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पी.पी.सी. की बैठक संख्या 191 दिनांक 19.09.13 द्वारा अनुमानित लागत राशि रु. 700 करोड़ की जारी की गई। योजना के अन्तर्गत शिव तहसील के 132, रामसर तहसील के 30, बाड़मेर तहसील के 121 बाड़मेर एवं बायतु तहसील के 3 गांव, कुल 286 गांव शामिल हैं। कार्य का कार्यादेश रु. 595.34 करोड़ का दिनांक 24.01.17 को जारी किया गया है। वर्तमान में योजना पर कार्य प्रगतिरत है। परियोजना के 286 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक कुल रुपये 544.84 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

7.0 पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना :-

बाड़मेर जिले के 386 गांवों एवं जैसलमेर जिले के 177 गांवों (कुल 563 गांवों) एवं 3 शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना पी.पी.सी बैठक दिनांक 29.03.2005 को राशि 1084.83 करोड़ की स्वीकृति की गई। जिसे कालान्तर में पी.पी.सी बैठक दिनांक 27.09.2011 में रु. 1454.20 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। पी.पी.सी बैठक दिनांक 27.09.2011 में रु. 1454.20 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात पी.पी.सी बैठक दिनांक 05.12.2017 में रु. 2034.62 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के कार्यों को 9 पैकेजों में विभक्त किया गया था जिसमें से 07 पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 पैकेजों के कार्य प्रगति पर हैं। वर्तमान में परियोजना द्वारा कुल स्वीकृत 3 कस्बे एवं 563 गांवों में से 2 कस्बे एवं 455 गांवों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर दिसम्बर 2024 तक कुल रु. 1799.51 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

8.0 राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जोधपुर पर आधारित वृहद् परियोजना

8.1 ए.एफ.डी द्वारा वित्त पोषित पुर्नःगठित जल प्रदाय योजना जोधपुर शहर :-

जोधपुर शहर में पर्याप्त एवं इसके आस-पास के नवविकसित क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए पुर्नगठित शहरी जल प्रदाय योजना जोधपुर की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति



CLARIFLOCCULATOR



TONNER BUILDING

विभाग की 190 वीं नीति निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 30.05.2013 को राशि रु. 740.50 करोड़ की गई। योजना फ्रांसिसी वित्त सहायता से वित्त पोषित है। योजना के विभिन्न पैकेजों का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 667.27 करोड़ का किया जा चुका है।

8.2 फेज़- तृतीय :-

जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर को पेयजल हेतु PPC /200 दिनांक 04.10.2017 तथा PPC / 207 दिनांक 22.02.2022 में स्वीकृति राशि रु. 1799.00 करोड़ जारी की गई। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 1059.29 करोड़ का किया जा चुका है।

9.0 जवाई पाइप लाइन परियोजना पाली :-

9.1 फेज़-प्रथम (आधारभूत परियोजना) :-

परियोजना की स्वीकृति पी.पी.सी. की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 में राशि रु. 634.79 करोड़ की जारी हुई थी। योजना के कार्यों को 5 पैकेज में विभक्त किया गया था। पैकेज-1 बाँध के डेड स्टोरेज से पम्पिंग करने से संबंधित है।

पैकेज संख्या 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत जवाई बांध से पाली-रोहट-सोजत तक पाइपलाइन बिछाकर उपयोग में ली जा रही है। योजना के पैकेज 5 के अन्तर्गत सोजत से चंडावल, रायपुर, बर, जैतारण, आनन्दपुरकालू पाइप लाइन का कार्य क्लस्टर योजना तृतीय के साथ प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 437.02 करोड़ का किया जा चुका है।

9.2 फेज़-द्वितीय (क्लस्टर परियोजना) :-

जवाई क्लस्टर परियोजना में पी. पी. सी. की 178 वीं(फेज़ प्रथम) बैठक दिनांक 11.10.2007 में राशि रु. 112.54 करोड़ की जारी हुई थी। फेज़ द्वितीय (भाग द्वितीय पैकेज II एवं पैकेज III) की स्वीकृति पी.पी.सी. 190 / 30.05.13 एवं एफ. सी. 656 में क्रमशः राशि रु. 152.46 करोड़ व रु. 214.50 करोड़ कुल रु. 479.25 करोड़ की जारी हुई। जवाई क्लस्टर परियोजना फेज़ द्वितीय (भाग द्वितीय पैकेज II) कार्य मार्च 2020 में पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत 2 शहर एवं 241 गांव स्वीकृत हैं। परियोजना के 2 शहर एवं 230 गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। जवाई क्लस्टर परियोजना फेज़ द्वितीय (भाग द्वितीय पैकेज II एवं पैकेज III) पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 428.43 करोड़ का किया जा चुका है।

10.0 चम्बल भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना-द्वितीय चरण :-

चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.5.2013 से राशि रु. 1495.68 करोड़ की जारी की गई एवं संशोधित स्वीकृति 203वीं बैठक दिनांक 14.02.2021 से राशि रु. 2443.73 करोड़ की जारी की गई। द्वितीय चरण को 8 क्लस्टर पैकेजों में विभक्त कर 7 क्लस्टर आसीन्द, माण्डल, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुर, गुलाबपुरा एवं माण्डलगढ़ पैकेजों के कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष रहे गंगापुर पैकेज का कार्य प्रगतिरत है। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी 8 कस्बों एवं 1698 गांवों को चम्बल जल से लाभान्वित किया जा चुका है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल रु. 2022.02 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

11.0 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ब्यावर. जवाजा -पंचायत समिति जवाजा :-

पंचायत समिति जवाजा, तहसील ब्यावर के 199 ग्रामों एवं 390 ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 से राशि रु. 231.46 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात SLSSC की 19वीं बैठक दिनांक 26.12.2019





द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 395.51 करोड़ की जारी की गई जिसमें राशि रु. 62.74 करोड़ में जल जीवन मिशन अन्तर्गत 57 ग्रामों हेतु रेट्रोफिटिंग कार्य तथा शेष रु. 332.77 करोड़ का परियोजना का शेष कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया। परियोजनांतर्गत कार्यों का कार्यादेश जारी कर वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। माह दिसम्बर, 2024 तक 193 ग्राम एवं 358 ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। माह दिसम्बर 2024 तक योजना के विरुद्ध राशि रु. 285.77 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.0 बांसवाड़ा जिले की वृहद परियोजनाएं माही बांध आधारित बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना :-

माही बांध आधारित बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गांवों एवं उनकी ढाणियों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेत 18 किमी. की दूरी पर स्थित माही बांध को मुख्य स्रोत प्रस्तावित किया गया है परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.01.2018 को आयोजित विभाग की वित्त समिति की 737 वीं बैठक में राशि रु. 798.35 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यों को 03 पैकेज में बांटा गया है। प्रथम पैकेज का कार्य दिनांक 05.10.2023 को, द्वितीय पैकेज का कार्य दिनांक 20.10.2023 एवं तृतीय पैकेज का कार्य दिनांक 30.10.2023 को पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना (पैकेज 1, 2 एवं 3) पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल राशि रु. 521.76 करोड़ का व्यय हो चुका है।

13.0 डूंगरपुर जिले की वृहद परियोजना सोम कमला बांध आधारित डूंगरपुर जिले की 151 गांवों की पेयजल परियोजना :-

जिला डूंगरपुर की पं.स. आसपुर, दोवडा एवं डूंगरपुर के 151 समस्याग्रस्त गांवों, उनकी 244 ढाणियों एवं 1 शहर डूंगरपुर




की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु सोम कमला आम्बा बांध को मुख्य स्रोत के रूप में चयन किया गया। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2018 को आयोजित विभाग की वित्त समिति की 745 वीं बैठक में राशि रु. 365.00 करोड़ की जारी की गई। परियोजना को क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यों को 02 पैकेज में बांटा गया है। दिनांक 16.07.2018 को विभाग की तकनीकी समिति की 666वीं बैठक में प्रथम पैकेज की राशि रु. 295.93 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के प्रथम पैकेज का कार्यादेश दिनांक 20.09.2018

को राशि रु. 253.15 करोड़ का जारी किया गया। पैकेज प्रथम का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल राशि रु. 239.84 करोड़ का व्यय हो चुका है।

14.0 उदयपुर शहर की जयसमन्द झील से सुदृढीकरण जल पेयजल परियोजना:—

उदयपुर शहर को जयसमन्द झील से पेयजल पहुंचाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 12.10.2020 को राशि रु. 215.00 करोड़ जारी की गई। परियोजना पर माह दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय रु. 60.60 करोड़ का किया जा चुका है।

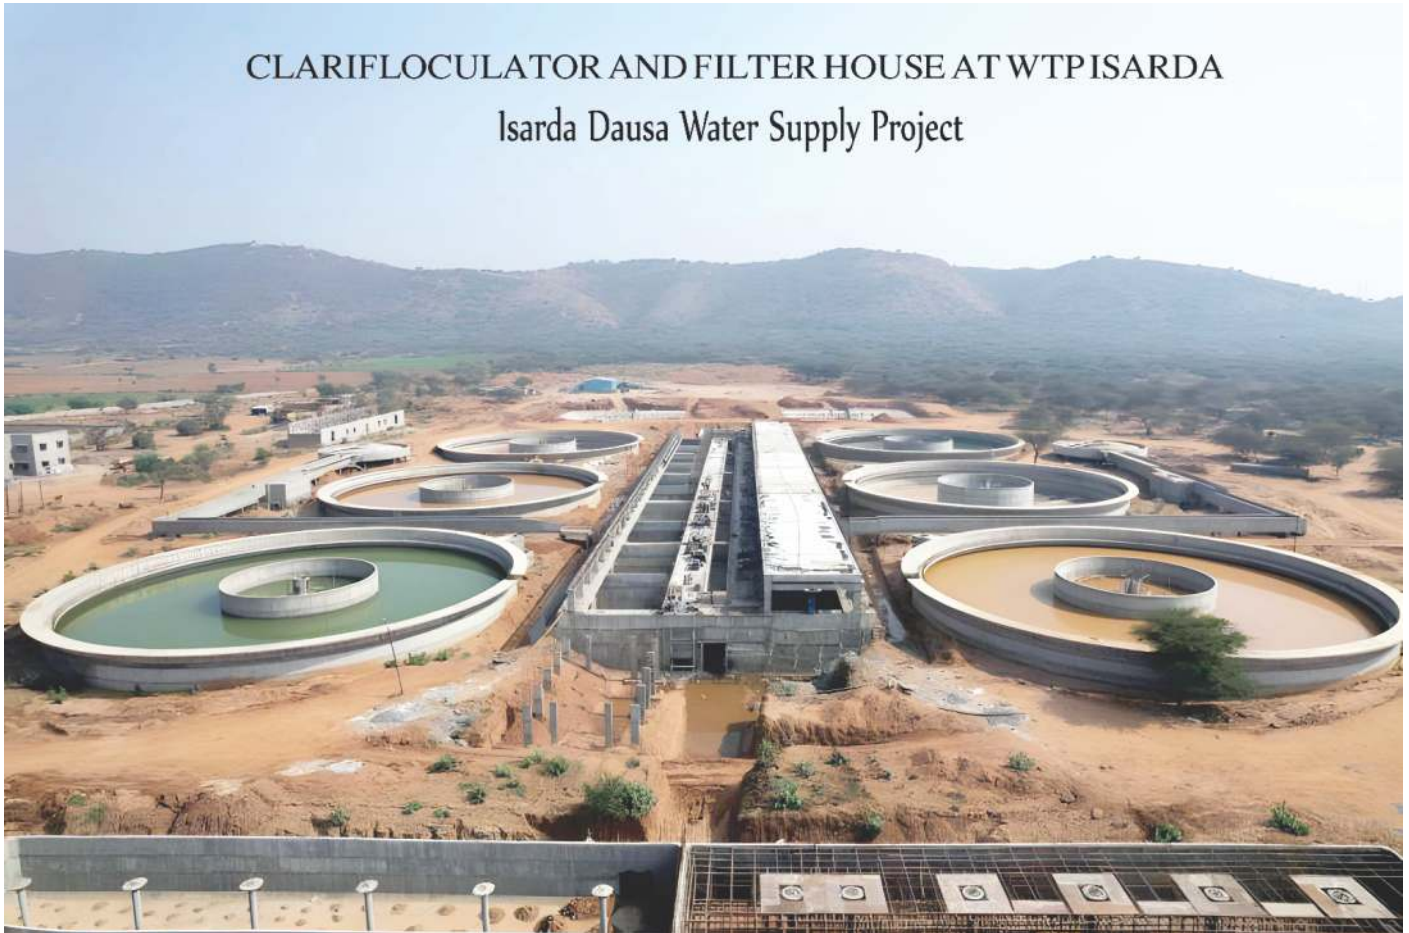

11

प्रयोगशालाएं

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पेयजल गुणवत्ता जाँच एवं जल गुणवत्ता से सम्बंधित विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण हेतु 01 राज्य स्तरीय एवं एक सचल प्रयोगशाला कार्यरत है। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में जल सम्बन्धी निम्न विश्लेषण कार्य किये जाते हैं:-

1. रासायनिक परीक्षण जिसके तहत पेयजल में pH, Turbidity, Colour, Odour, Total Alkalinity, Total Hardness, Calcium, Magnesium, Chloride, Nitrate, Fluoride एवं TDS इत्यादि की जाँच की जाती है।
2. जीवाणु परीक्षण जिसके तहत पेयजल में Total Coliform एवं E-Coli की जाँच की जाती है।
3. पेयजल में अवशेष क्लोरीन जाँच।
4. नहरी पानी में हैवी मेटल्स की मात्रा की जाँच।
5. सीवेज जल परीक्षण जिसके तहत सीवेज जल में DO, BOD, COD, TSS एवं Phosphate इत्यादि की जाँच की जाती है।





6. पेयजल में क्लोरीनेशन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले ब्लीचिंग पाउडर की गुणवत्ता का परीक्षण ।
7. वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट पर उपयोग में आने वाले फिल्टर मीडिया (Sand एवं Gravel) की गुणवत्ता का परीक्षण ।
8. Bentonite की गुणवत्ता का परीक्षण ।
9. जल शोधन हेतु फिल्टर प्लांट में काम में ली जाने वाली एलम व पी.ए.सी. का विश्लेषण कार्य ।

राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के अधीन 06 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं एवं 26 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। जिनमें अधीक्षण/वरिष्ठ/कनिष्ठ रसायनज्ञ विभागीय प्रयोगशालों में कार्यरत हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में नवसृजित जिलों में कुल 17 प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव मुख्य अभियंता (प्रशासन) के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं।

राज्य स्तरीय प्रयोगशाला जयपुर, क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा तथा जिला स्तरीय प्रयोगशाला भीलवाड़ा, राजसमन्द, बून्दी, पाली, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, बाड़मेर, झालावाड़,

अलवर, जालौर, करौली, धौलपुर, चुरू, बारां, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिराही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सहित सभी 33 प्रयोगशालाएं NABL Accredited हैं।

सभी जिला प्रयोगशालाओं में विभागीय जलप्रदाय योजनाओं की जल गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रभावी मोनिटरिंग के अतिरिक्त दूषित पेयजल, मौसमी बीमारियों एवं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जल शुद्धिकरण एवं पेयजल गुणवत्ता की प्रभावी मोनेटरिंग का कार्य किया जाता है।

विभागीय पेयजल योजनाओं से की जा रही जलापूर्ति में जल गुणवत्ता परीक्षण एवं समुचित क्लोरीनीकरण की जांच के सामयिक प्रबन्ध कर जलगुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी परिणामों की साप्ताहिक समीक्षा कर जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किये जाते हैं।

वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक विभागीय प्रयोगशालाओं में कुल 281085 जल नमूनों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	विवरण	लक्ष्य जल नमूने	उपलब्धि जल नमूने
1	रासायनिक परीक्षण	37750	47335
2	जीवाणु परीक्षण	76750	91848
3	अवशेष क्लोरीन	123250	141902

इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा विभागीय पेयजल योजनाओं तथा विभिन्न पेयजल स्रोतों के कुल 207391 जल नमूनों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	विवरण	लक्ष्य जल नमूने	उपलब्धि जल नमूने
1	रासायनिक परीक्षण	37250	39319
2	जीवाणु परीक्षण	76750	65758
3	अवशेष क्लोरीन	123250	102314

सचल प्रयोगशाला (Mobile Lab):— मुख्य रसायनज्ञ के अधीन मुख्यालय जयपुर पर एक सचल प्रयोगशाला कार्यरत है जिसमें सभी प्रकार के जल विश्लेषणों की सुविधा उपलब्ध है। यह सचल प्रयोगशाला राजस्थान के मेले/त्यौहारों एवं जल जनित बिमारियों के फैलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार जल गुणवत्ता, नियन्त्रण एवं निगरानी का कार्य करती है। वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक सचल प्रयोगशाला के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार है—

क्र.	विवरण	लक्ष्य जल नमूने	उपलब्धि जल नमूने
1	रासायनिक परीक्षण	1000	1350
2	जीवाणु परीक्षण	2000	2227
3	अवशेष क्लोरीन	4000	4012

वर्ष 2024-25 में 01.04.2024 से 31.12.2024 तक सचल प्रयोगशाला के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार है—

क्र.	विवरण	निर्धारित लक्ष्य जल नमूने	आनुपातिक लक्ष्य जल नमूने	उपलब्धि जल नमूने
1	रासायनिक परीक्षण	1000	750	961
2	जीवाणु परीक्षण	2000	1500	1607
3	अवशेष क्लोरीन	4000	3000	3496



सतही जल स्रोत (Surface Water Source):— सभी विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा जिले में स्थित सतही जल स्रोतों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण वर्ष में दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् किया जाता है।

शहरी कस्बों में वितरित पेयजल (Urban Town water supply):— सभी विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा जिले में स्थित सभी शहरी/कस्बों में वितरित किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता का विश्लेषण वर्ष में दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् किया जाता है।

‘जल जीवन मिशन एवं ग्रामीण के कार्यों का विवरण

मुख्य रसायनज्ञ (जल जीवन मिशन) द्वारा राज्य में हो रहे जे. जे.एम. संबंधी कार्यों की निगरानी रखी जाती है। जेजेएम कार्यों में वर्ष 2023-24 में राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर 23वीं रैंक है जिसके अंतर्गत फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी, स्कूल एवं FHTC इत्यादि पर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच का कार्य किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा आवंटित लक्ष्य 99000 जल नमूनों के विरुद्ध कुल 124767 जल नमूनों का परीक्षण किया गया था तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला प्रयोगशालाओं को आवंटित लक्ष्य 99000 जल नमूनों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2024 तक कुल 92939 जल नमूनों का परीक्षण करते हुए 94 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है।



जल जीवन मिशन के अंतर्गत गतिविधि अनुसार कार्यो का विवरण: –

S.No.	Activity	Target	Achievements on 31.12.2024	
			Nos.	%age
1	Remedial Measures taken (Bacteriological Contamination) (Toal 122373 Samples tested)	48 Samples	47 Samples	97.92
2	Remedial measures taken (Chemical Contamintaion) (Toal 141129 Samples tested)	11042 Samples	7881 Samples	71.37
3	"Women Training in Villages:-Status of training of women for use of FTKs/ H2S vials "	42327 Villages	40524 Villages	95.74
4(a)	"Villages Coverage :-Water testing in Villages for Chemical Parameters "	42327 Villages	32296 Villages	76.30
4(b)	Villages Coverage :- Water testing in Villages for Bacteriological Parameters	42327 Villages	24082 Villages	56.89
5(a)	Sources Coverage:- Chemical Testing of drinking water sources	53531 Sources	30944 Sources	57.80
5(b)	Sources Coverage:- Testing of drinking water sources Bacteriological Parameters	53531 Sources	18084 Sources	33.78
6	"Schools Coverage:- Water testing in Schools for chemical and bacteriological parameters"	49150 Schools	21631 Schools	44.01
7	"Aanganwadi Centres Coverage:-Water testing in Aanganwadi Centres for chemical and bacteriological parameters"	38466 Aanganwadi Centres	16754 Aanganwadi Centres	43.56
8	"FHTC villages Coverage:-Water testing at household level (FHTC) in villages for chemical and bacteriological parameters (Total Villages:42327)"	26091 FHTC villages	12157 FHTC villages	46.59

12

सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम

राज्य में ऐसे क्षेत्र जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं अथवा अनियमित है में सौर उर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना की पहल की गई है। सौर आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जनप्रतिनिधियों की अभिशंषा एवं फिजिबिलिटी के आधार पर की जाती है। वर्तमान तक 2,961 सौर आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-24 पर दर्शाया गया है।



ड्रिलिंग रिगों का प्रबन्धन


विभाग में विभागीय नलकूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण जन स्वा० अभि० विभाग, की ड्रिलिंग रिगों द्वारा किया जाता है, परन्तु बढ़ती मांग व निर्माण को समय पर सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय रिगों की क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करते हुए नियमित खण्डों द्वारा निजी संवेदकों से भी कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं। ड्रिलिंग क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 32 रिग मशीनों में से प्रमुख शासन सचिव महोदय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग राज० जयपुर के आदेश क्रमांक राजकाज संख्या 10656587 दिनांक 29-10-2024 की अनुपालना में कार्यशील 15 रिग मशीनें भूजल विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी हैं। शेष 17 रिग मशीनों के कार्यशील न होने के कारण नाकारा घोषित करने एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीलामी करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रमुख शासन सचिव महोदय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग राज० जयपुर के आदेश क्रमांक राजकाज संख्या 11461158 दिनांक 29-10-2024 द्वारा 76 तकनीकी कर्मचारी एवं राजकाज रेफरेन्स दिनांक 28-11-2024 द्वारा 10 तकनीकी कर्मचारियों का भूजल विभाग के खंडीय / उपखंडीय कार्यालयों में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं जिनकी अनुपालना में 68 कर्मचारियों को भूजल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है शेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2022-23 में इन विभागीय रिगों द्वारा 255 हैण्डपम्पों एवं 18 नलकूपों का निर्माण किया गया था। वर्ष 2023-24 (माह दिसम्बर 2023 तक) में विभागीय रिगों द्वारा 274 हैण्डपम्पों एवं 14 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रिलिंग क्षेत्र जयपुर के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों द्वारा 183 हैण्डपंप, 6 नये नलकूप एवं 36 नलकूपों का डीपनिंग एवं फ्लशिंग कार्य किया गया।




परिशिष्ट

विभागीय संगठनात्मक ढांचा

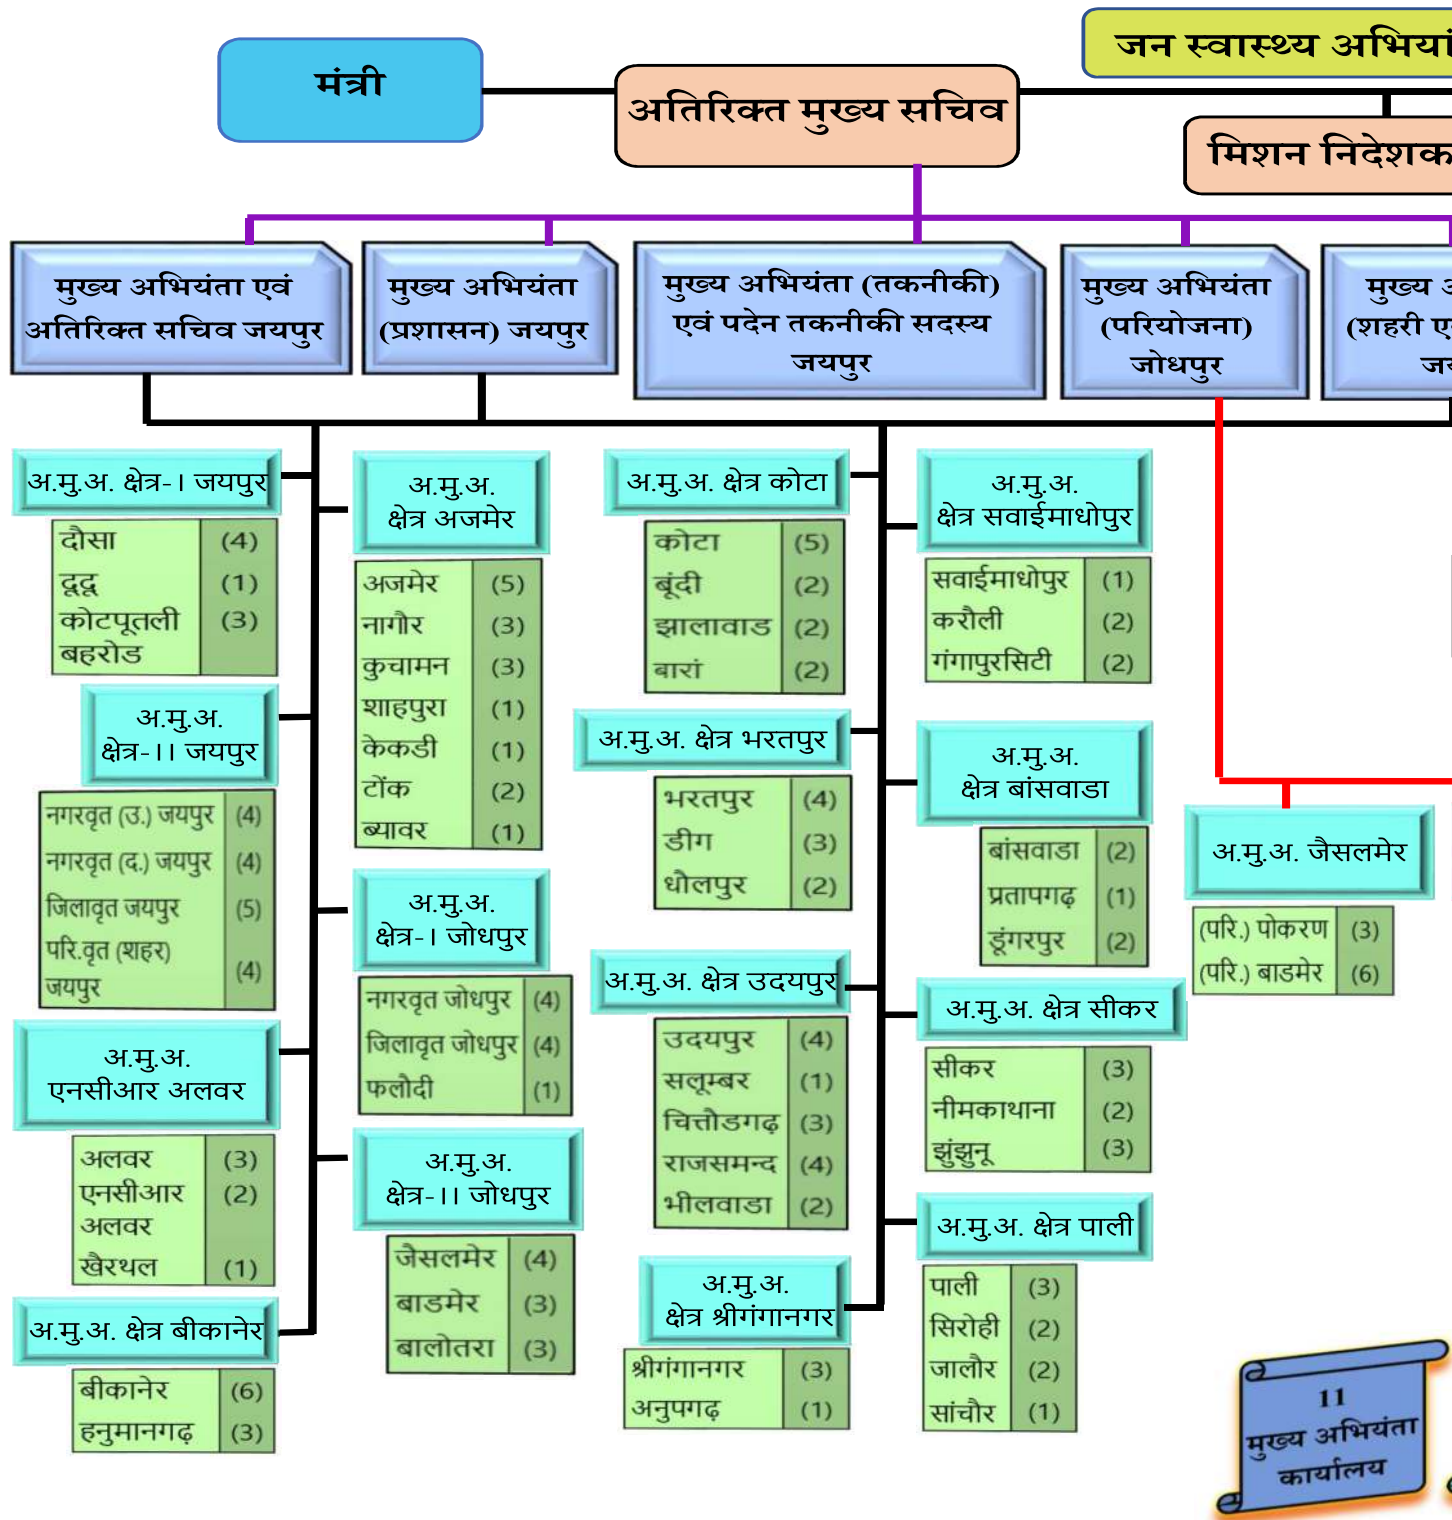

पदों का विवरण परिशिष्ट-18 पर उपलब्ध है।

अभियांत्रिकी विभाग

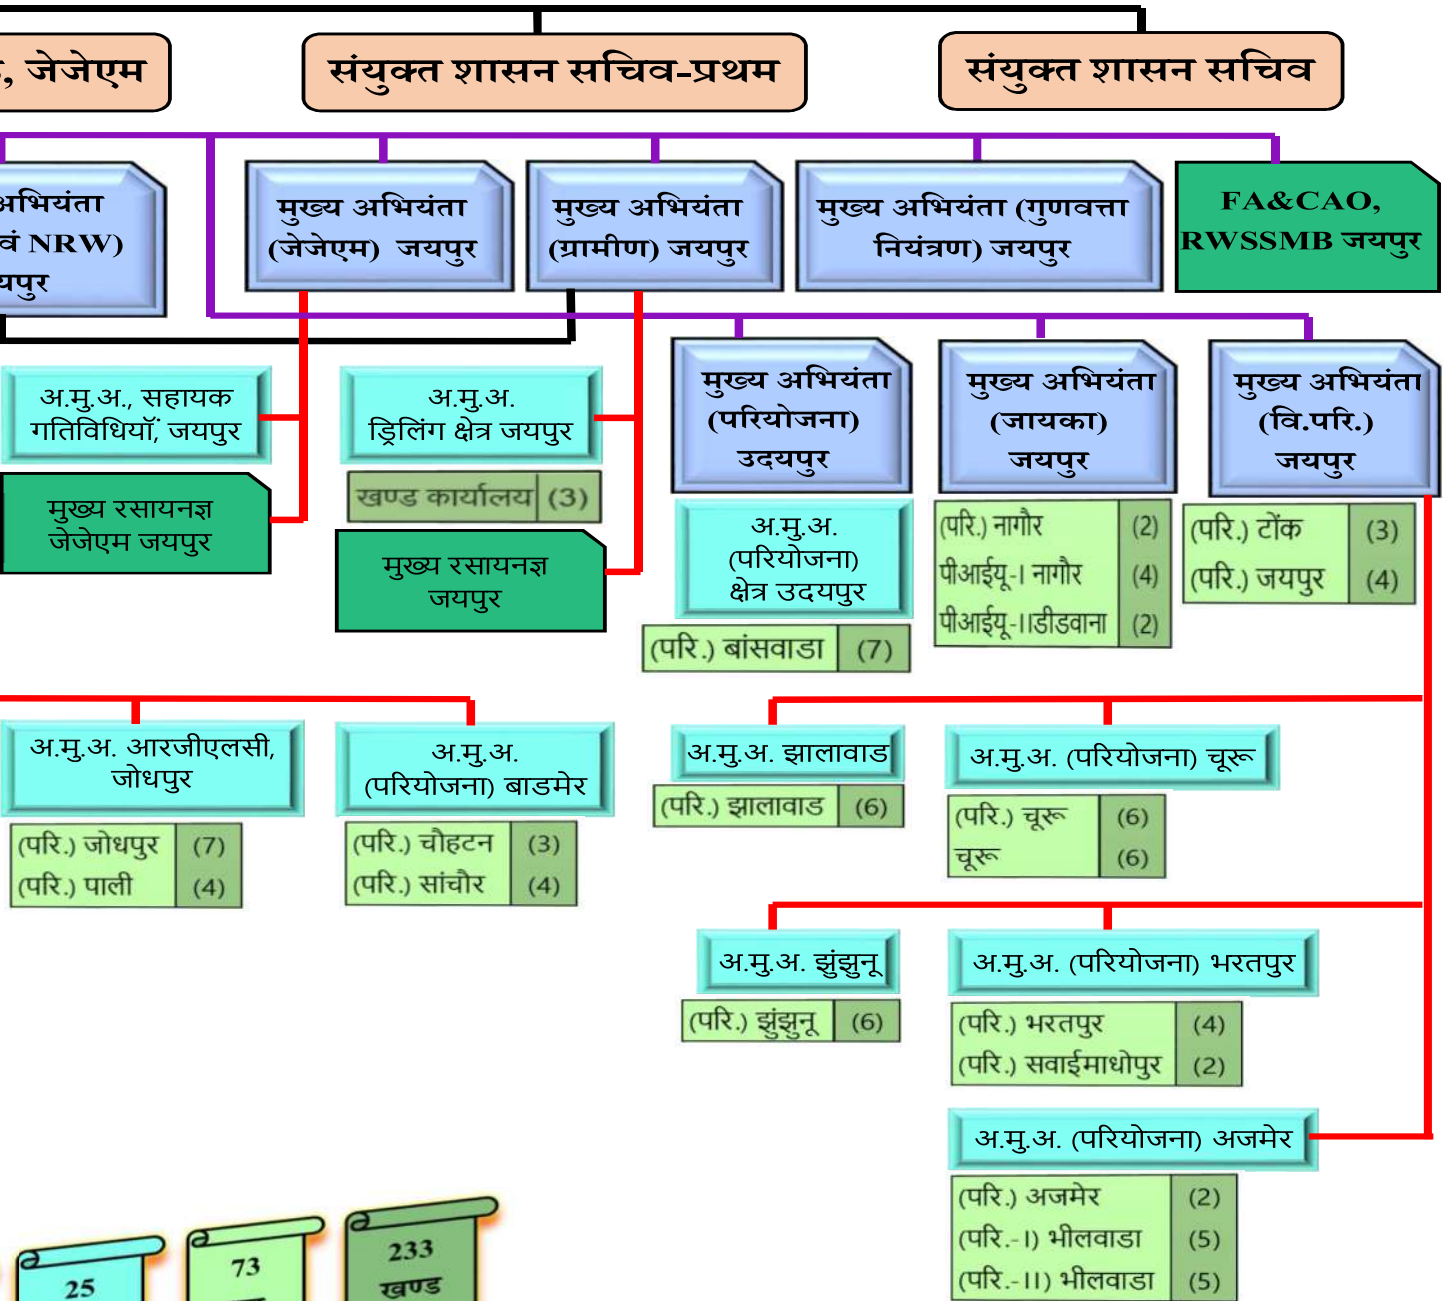

दिनांक 1.4.2024 तक हेबीटेशन में पेयजल की जिलेवार स्थिति

क्र.स.	जिला	कुल हेबीटेशन की संख्या	हेबीटेशन की स्थिति जनसंख्या कवरेज के अनुसार				
			शुन्य से 25%	25% से 50%	50% से 75%	75% से 100%	100%
1	अजमेर	1616	70	27	44	59	572
2	अलवर	3412	138	138	115	116	1552
3	बालोतरा	3627	216	144	152	281	1474
4	बांसवाड़ा	2667	1154	84	92	86	420
5	बारां	1368	17	20	42	100	176
6	बाड़मेर	8178	133	66	70	124	595
7	ब्यावर	2135	109	68	90	122	842
8	भरतपुर	1295	55	40	58	80	480
9	भीलवाड़ा	3069	41	69	102	148	2229
10	बीकानेर	1860	116	122	137	205	411
11	बूंदी	1428	16	12	10	22	242
12	चित्तौड़गढ़	2437	28	37	70	31	170
13	चुरू	1561	35	57	77	249	563
14	दौसा	4805	93	96	95	157	1374
15	डीग	862	19	13	24	30	58
16	धौलपुर	1754	90	88	80	113	446
17	डीडवाना-कुचामन	3581	105	83	76	108	2212
18	डूंगरपुर	2714	94	90	92	195	365
19	श्री गंगानगर	3618	165	128	195	707	1896
20	हनुमानगढ़	1711	144	117	187	363	693
21	जयपुर	10222	451	476	501	639	4027
22	जैसलमेर	3687	101	84	99	179	887
23	जालौर	3439	238	202	227	245	688
24	झालावाड़	1624	16	37	71	227	739
25	झुंझुनूं	1439	56	53	63	106	416
26	जोधपुर	7841	335	287	315	566	3146
27	करौली	1709	149	103	125	144	544
28	खैरथल-तिजारा	1777	47	45	80	80	873
29	कोटा	922	8	17	33	32	250
30	कोटपूतली-बहरोड़	2529	143	127	163	190	849
31	नागौर	2887	105	86	113	188	668
32	पाली	1610	98	60	111	125	788
33	फलोदी	3164	95	66	65	79	779
34	प्रतापगढ़	2038	68	58	80	94	441
35	राजसमंद	3104	70	79	137	212	1055
36	सलूंबर	1874	116	93	105	166	276
37	सवाई माधोपुर	3012	175	108	139	200	1136
38	सीकर	5382	427	229	232	311	1923
39	सिरोही	943	49	47	84	122	180
40	टोंक	2804	296	152	219	235	968
41	उदयपुर	4959	210	201	196	292	814
कुल		120664	6091	4109	4966	7728	38217

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2023-24 में घरेलू जल संबंधों पेयजल से लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की जिलेवार संख्या का विवरण

क्र. स.	जिला	ग्रामीण परिवारों की संख्या दिनांक 1.4.2023	लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की संख्या दिनांक 1.4.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की संख्या
1	अजमेर	257616	108149	23674
2	अलवर	251826	66335	26279
3	बालोतरा	202094	77302	32167
4	बांसवाड़ा	381364	51866	29863
5	बारां	238350	62206	15728
6	बाड़मेर	265858	14908	12518
7	ब्यावर	195294	72051	37934
8	भरतपुर	214048	57394	40419
9	भीलवाड़ा	431324	232134	102986
10	बीकानेर	306778	122309	36927
11	बूंदी	192891	67062	1622
12	चित्तौड़गढ़	293887	72703	9214
13	चुरू	307339	146878	50584
14	दोसा	256706	69779	31583
15	डीग	177427	22493	11355
16	धौलपुर	181509	39275	23341
17	डीडवाना-कुचामन	284909	188161	35460
18	डूंगरपुर	305683	51212	18177
19	श्री गंगानगर	302401	177666	50382
20	हनुमानगढ़	292508	172799	42836
21	जयपुर	508396	256942	56739
22	जैसलमेर	120786	15976	21597
23	जालौर	383693	121860	35504
24	झालावाड़	253531	134979	37000
25	झुंझुनू	269002	93111	36156
26	जोधपुर	331243	127810	43805
27	करौली	166440	57984	21211
28	खैरथल-तिजारा	145808	54030	16558
29	कोटा	161334	51676	18947
30	कोटपूतली-बहरोड़	205267	81865	17078
31	नागौर	305955	128570	39254
32	पाली	294293	161716	43786
33	फलोदी	110937	23456	10388
34	प्रतापगढ़	169894	29696	13614
35	राजसमंद	203318	117880	7028
36	सलूबर	132216	35005	8351
37	सवाई माधोपुर	295327	105015	34878
38	सीकर	458598	183523	39272
39	सिरोही	181790	71884	19667
40	टोंक	220148	75155	30560
41	उदयपुर	435240	82870	31328
कुल		10693028	3883685	1215770

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2024-25 में घरेलू जल संबंधों से लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की जिलेवार संख्या का विवरण (दिसम्बर 2024 तक)

क्र. स.	जिला	वर्ष 2024-25 के लिये लक्षित जल सम्बन्धों की संख्या	दिसम्बर 2024 तक लक्ष्य	दिसम्बर 2024 तक प्रगति
1	अजमेर	89138	62397	16508
2	अलवर	50321	35225	49698
3	बालोतरा	58435	40904	18164
4	बांसवाड़ा	134595	94217	26501
5	बारां	25105	17573	5217
6	बाड़मेर	42561	29792	20159
7	ब्यावर	24558	17192	15274
8	भरतपुर	80493	56345	27947
9	भीलवाड़ा	32166	22517	35181
10	बीकानेर	84295	59007	14473
11	बूंदी	58000	40600	1234
12	चित्तौड़गढ़	20395	14277	2148
13	चुरू	33525	23468	5026
14	दौसा	40000	28000	5616
15	डींग	25000	17500	9266
16	धौलपुर	51228	35860	18706
17	डीडवाना-कुचामन	40056	28039	18584
18	डूंगरपुर	74000	51800	18345
19	श्री गंगानगर	45144	31601	36304
20	हनुमानगढ़	55000	38500	31502
21	जयपुर	126044	88231	17738
22	जैसलमेर	60000	42000	12437
23	जालौर	171224	119856	49543
24	झालावाड़	52015	36411	10188
25	झुंझुनू	39842	27890	10362
26	जोधपुर	77495	54247	20247
27	करौली	10772	7540	24776
28	खैरथल-तिजारा	46000	32200	14733
29	कोटा	8796	6158	4896
30	कोटपूतली-बहरोड़	92000	64400	17467
31	नागौर	57894	40526	19855
32	पाली	50164	35115	33135
33	फलीदी	43179	30225	5063
34	प्रतापगढ़	35000	24500	10226
35	राजसमंद	52000	36400	7049
36	सलूबर	37174	26022	12223
37	सवाई माधोपुर	83133	58193	35826
38	सीकर	128308	89815	40608
39	सिरोही	59000	41300	14797
40	टोंक	50333	35233	32211
41	उदयपुर	156100	109270	30009
कुल		2500487	1750346	799242

विभिन्न प्रकार की ग्रामीण पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम (मुख्य हैबीटेशन) 31 दिसम्बर, 2024 तक

क्र. स.	जिला	मुख्य हैबीटेशन की संख्या	कुल लाभान्वित ग्रामों की संख्या	अलाभान्वित ग्रामों की संख्या	भूजल से लाभान्वित ग्रामों की संख्या	सतही स्रोतों से लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1	अजमेर	721	721	0	0	721
2	ब्यावर	632	632	0	112	520
3	भीलवाड़ा	1746	1746	0	2	1744
4	डीडवाना कुचामन	769	769	0	0	769
5	नागौर	826	826	0	142	684
6	टोंक	1117	1117	0	0	1117
7	अलवर	1081	1081	0	1081	0
8	खैरथल-तिजारा	550	550	0	550	0
9	भरतपुर	753	753	0	675	78
10	डीग	652	652	0	652	0
11	धौलपुर	793	793	0	638	155
12	करोली	846	846	0	846	0
13	सवाई माधोपुर	736	736	0	736	0
14	बीकानेर	854	854	0	316	538
15	हनुमानगढ़	1831	1802	29	267	1535
16	श्री गंगानगर	2853	2853	0	16	2837
17	चुरू	871	871	0	69	802
18	दौसा	1066	1066	0	1066	0
19	कोटपूतली-बहरोड़	627	627	0	627	0
20	जयपुर	1860	1860	0	683	1177
21	झुझनू	934	934	0	714	220
22	सीकर	1177	1177	0	878	299
23	जोधपुर	1182	1182	0	31	1151
24	फलोदी	680	680	0	363	317
25	बालोतरा	805	805	0	270	535
26	बाड़मेर	1639	1639	0	1130	509
27	जैसलमेर	756	756	0	257	499
28	पाली	771	771	0	22	749
29	जालौर	793	793	0	312	481
30	सिरोही	473	473	0	473	0
31	बारां	1097	1097	0	913	184
32	बूंदी	872	872	0	773	99
33	झालावाड़	1488	1488	0	535	953
34	कोटा	801	801	0	583	218
35	चित्तौड़गढ़	1589	1589	0	1586	3
36	राजसमंद	1042	1042	0	725	317
37	सलुम्बर	605	605	0	150	455
38	उदयपुर	1876	1876	0	1793	83
39	बांसवाड़ा	1494	1494	0	1485	9
40	डूंगरपुर	972	972	0	869	103
41	प्रतापगढ़	969	969	0	853	116
कुल		43199	42461	29	23193	19977

विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ढाणियाँ (अन्य हैबीटेशन)

31 दिसम्बर, 2024 तक

क्र. स.	जिला	ढाणियों की संख्या (अन्य हैबीटेशन)	कुल लाभान्वित ढाणियों की संख्या	अलाभान्वित ढाणियों की संख्या	भूजल से लाभान्वित ढाणियों की संख्या	सतही स्रोतों से लाभान्वित ढाणियों की संख्या
1	अजमेर	892	892	0	0	892
2	ब्यावर	1363	1360	3	431	929
3	भीलवाड़ा	1317	1317	0	25	1292
4	डीडवाना कुचामन	2074	1798	276	363	1435
5	नागौर	2015	2015	0	1010	1005
6	टोंक	1983	1983	0	0	1983
7	अलवर	3210	3210	0	3210	0
8	खैरथल-तिजारा	928	928	0	928	0
9	भरतपुर	520	520	0	510	10
10	डीग	182	182	0	172	10
11	धौलपुर	1316	1316	0	1082	234
12	करोली	1735	1735	0	1735	0
13	सवाई माधोपुर	1881	1881	0	1881	0
14	बीकानेर	1035	779	256	565	214
15	हनुमानगढ़	237	237	0	2	235
16	श्री गंगानगर	858	777	81	20	757
17	चुरू	694	694	0	126	568
18	दौसा	3993	1508	2485	1508	0
19	कोटपूतली-बहरोड़	2557	2529	28	2529	0
20	जयपुर ग्रामीण	9222	8376	846	6386	1990
21	झुझनू	1641	1641	0	1210	431
22	सीकर	3105	3105	0	3050	55
23	जोधपुर	6696	6651	45	1778	4873
24	फलोदी	2141	2126	15	1391	735
25	बालोतरा	3816	3731	85	964	2767
26	बाड़मेर	7850	5002	2848	4392	610
27	जैसलमेर	3084	2324	760	1963	361
28	पाली	851	851	0	586	265
29	जालौर	2645	2086	559	1139	947
30	सिरोही	473	473	0	473	0
31	बारां	269	269	0	255	14
32	बूंदी	538	538	0	473	65
33	झालावाड़	141	141	0	36	105
34	कोटा	125	125	0	108	17
35	चित्तौड़गढ़	843	843	0	843	0
36	राजसमंद	2363	2363	0	1770	593
37	सलुम्बर	1878	1878	0	1396	482
38	उदयपुर	3187	3187	0	3187	0
39	बांसवाड़ा	1120	1120	0	1112	8
40	डूंगरपुर	2691	2691	0	2379	312
41	प्रतापगढ़	1068	1068	0	984	84
योग		84537	76250	8287	51972	24278

ग्रीष्म संवर्द्धन 2024-25 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (20.06.2024 को)

क्रम. स.	जिला	विभाग द्वारा				जिला प्रशासन द्वारा				स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा				कुल योग			
		ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप
1	अजमेर	381	121	502	187	0	0	0	0	0	0	0	0	381	121	502	187
2	भीलवाड़ा	62	153	215	85	0	0	0	0	0	0	0	0	62	153	215	85
3	नागौर	34	6	40	32	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6	40	32
4	ब्यावर	188	59	247	83	0	0	0	0	0	0	0	0	188	59	247	83
5	डीडवाना-कुयामन	156	210	366	79	0	0	0	0	0	0	0	0	156	210	366	79
6	टोंक	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
7	बीकानेर	37	6	43	32	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6	43	32
8	श्री गंगानगर	10	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	3
9	हनुमानगढ़	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
10	चुरू	213	64	277	121	0	0	0	0	0	0	0	0	213	64	277	121
11	भरतपुर	45	0	45	14	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	14
12	धौलपुर	50	39	89	32	0	0	0	0	0	0	0	0	50	39	89	32
13	करौली	86	26	112	32	0	0	0	0	0	0	0	0	86	26	112	32
14	सवाई माधोपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	डीग	179	8	187	72	0	0	0	0	0	0	0	0	179	8	187	72
16	अलवर	65	67	132	66	0	0	0	0	0	0	0	0	65	67	132	66
17	खैरथल तिजारा	680	601	1281	19	0	0	0	0	0	0	0	0	680	601	1281	19
18	दौसा	60	36	96	74	0	0	0	0	0	0	0	0	60	36	96	74
19	झुझनू	82	43	125	70	0	0	0	0	0	0	0	0	82	43	125	70
20	सीकर	167	134	301	169	0	0	0	0	0	0	0	0	167	134	301	169
21	जयपुर	270	352	622	290	0	0	0	0	0	0	0	0	270	352	622	290
22	कोटपूतली बहरोड़	208	188	396	174	0	0	0	0	0	0	0	0	208	188	396	174

क्रम. स.	जिला	विभाग द्वारा				जिला प्रशासन द्वारा				स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा				कुल योग										
		ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप	ग्राम	ढाणियां	योग	टैकर ट्रिप							
23	जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	372	1824	2196	174	653	0	0	0	0	372	1824	2196	174	653	
24	फलौदी	0	0	0	0	0	0	0	0	17	155	172	24	148	0	0	0	0	17	155	172	24	148	
25	पाली	28	2	30	13	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30	13	79	
26	बाड़मेर	0	0	0	0	0	203	723	25	53	0	0	0	0	0	0	0	0	203	520	723	25	53	
27	बालोतरा	0	0	0	0	0	393	1498	53	210	0	0	0	0	0	0	0	0	393	1105	1498	53	210	
28	जैसलमेर	0	0	0	0	0	171	2136	147	598	0	0	0	0	0	0	0	0	171	2136	2307	147	598	
29	जालौर	140	139	279	100	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	139	279	100	446	
30	सिरोही	3	2	5	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	4	12	
31	बारों	126	36	162	74	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	36	162	74	353	
32	बूंदी	276	57	333	86	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	57	333	86	659	
33	झालावाड़	185	27	212	96	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	27	212	96	401	
34	कोटा	87	16	103	60	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	16	103	60	432	
35	बांसवाड़ा	61	61	122	34	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	122	34	113	
36	चित्तौड़गढ़	686	126	812	346	1813	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	37	18	65	718	131	849	364	1878
37	झुगरपुर	105	136	241	122	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	136	241	122	324	
38	राजसमन्द	376	231	607	136	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	231	607	136	770	
39	उदयपुर	211	82	293	91	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	82	293	91	429	
40	प्रतापगढ़	407	64	471	164	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	64	471	164	934	
41	सलूमर	87	4	91	34	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	4	91	34	159	
कुल योग		5598	2886	8484	2917	14295	1156	5740	6896	423	1662	32	5	37	18	65	6786	8631	15417	3358	16022			

ग्रीष्म संवर्द्धन 2024-25 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (28.06.2024 को)

क्र. स.	जिले का नाम	शहर का नाम	टैंकर प्रतिदिन	टैंकर ट्रिप प्रतिदिन
1	अजमेर	किशनगढ़	2	13
2		पुष्कर	1	1
3		अजमेर	10	68
4	डीडवाना-कुचामन	लाडनूँ	3	20
5		डीडवाना	3	15
6		कुचामन	4	24
7	नागौर	नागौर	6	26
8	टोंक	देवली	2	4
9		उणियारा	1	2
10	अलवर	अलवर	36	334
11		राजगढ़	18	222
12		रामगढ़	1	5
13		कटूमबर	4	38
14		खेड़ली	3	15
15		थानागाजी	1	8
16		गोविंदगढ़	1	2
17	खैरथल-तिजारा	किशनगढ़बास	5	48
18		खैरथल	15	178
19		बहादुरपुर	3	22
20	भरतपुर	कामाँ	3	18
21		नगर	3	14
22		डीग	3	14
23		नदवई	1	3
24		कुमैर	3	12
25		भरतपुर एवं सेवर	16	88
26		बयाना	3	9
27		सीकरी	2	7
28		रूपवास	1	8
29		उच्चैन	2	9
30	धौलपुर	सरमथुरा	3	27
31	करौली	हिण्डौन	5	45
32		करौली	3	19
33	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	4	25
34		बामनवास	1	3
35	बीकानेर	बीकानेर	22	45
36	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	4	8
37	चुरू	तारानगर	11	44

ग्रीष्म संवर्द्धन 2024-25 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (28.06.2024 को)

क्र. स.	जिले का नाम	शहर का नाम	टैंकर प्रतिदिन	टैंकर ट्रिप प्रतिदिन
38		राजगढ़	3	8
39		सरदार शहर	5	10
40		चुरु	3	8
41		रतनगढ़	14	95
42		राजलदेसर	7	39
43		बीदासर	5	26
44		सुजानगढ़	16	91
45	दौसा	बादीकुई	10	100
46		बसवा	8	75
47		दौसा	24	179
48		लालसौट	8	48
49		मंडावरी	2	20
50	कोटपुतली-बहरोड़	बहरोड़	14	71
51	झुंझनू	पिलानी	8	87
52		चिड़ावा	3	25
53		गोधरा	1	3
54		उदयपुरवाटी	9	86
55	सीकर	सीकर	5	20
56		रींगस	1	4
57		लोसल	1	8
58		नीमकाथाना	2	11
59		श्रीमाधोपुर	3	13
60		पोंख	3	12
61	जयपुर	शाहपुरा	28	200
62		चौमू	12	137
63		बगरू	9	103
64		चाकसू	2	4
65		बस्सी	9	58
66		जयपुर	169	1101
67	जोधपुर	बिलाड़ा	1	3
68		भोपालगढ़	2	8
69	फलोदी	फलोदी	1	12
70	बाड़मेर	बाड़मेर	1	3
71		सिवाना	2	18
72	जैसलमेर	जैसलमेर	23	107
73		पोकरण	11	57
74	जालौर	भीनमाल	2	10

ग्रीष्म संवर्द्धन 2024-25 के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम पेयजल परिवहन की जिलेवार सूचना (28.06.2024 को)

क्र. स.	जिले का नाम	शहर का नाम	टैंकर प्रतिदिन	टैंकर ट्रिप प्रतिदिन
75	बारां	अटरु	3	9
76	बूंदी	नैनवा	1	8
77		लाखेरी	1	4
78		बूंदी	8	43
79	झालावाड़	झालरापाटन	1	6
80		अकलेरा	4	22
81		सुनैल	3	8
82	कोटा	कोटा	47	305
83	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	1	11
84	उदयपुर	बेगू	3	54
85		रावतभाटा	3	30
86		कपासन	7	114
87	डूंगरपुर	डूंगरपुर	2	10
88	राजसमंद	देवगढ़	4	25
89		राजसमंद	4	20
90	उदयपुर	फतेहनगर	3	50
91		भिण्डर	2	12
92		कानौड़	6	80
		कुल योग	739	5114

47वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.24 तक) (ग्रामीण)

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिवर्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिवर्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
1	अजमेर	33456	29588	29600	38	1324	1841	135	1	61	12	15	15346
2	भीलवाड़ा	21746	19211	19205	6	933	1932	0	0	58	0	5	8556
3	नागौर	3953	3484	3483	1	248	414	37	7	10	19	7	1674
4	ब्यावर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	डीडवाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	टोंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	बीकानेर	6660	2894	2894	0	135	0	0	0	0	0	0	0
8	श्री गंगानगर	2684	847	847	0	2	3	0	0	0	0	2	72
9	हनुमानगढ़	2675	908	908	0	176	2	0	0	0	0	2	0
10	चुरू	547	249	249	0	21	215	0	0	0	0	0	0
11	भरतपुर	12576	4125	4116	9	1520	1357	0	0	24	31	7	4881
12	धौलपुर	23708	4650	4634	16	1020	1776	0	0	26	11	6	5371
13	करौली	12430	2789	2778	11	1264	2283	0	1	24	24	6	5407
14	सवाई माधोपुर	10665	4335	4319	16	899	1389	0	0	21	0	1	7331
15	डीग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	अलवर	19213	2439	2431	8	3016	7493	0	2	42	3	7	4238
17	खैरथल तिजारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	दौसा	14769	11620	11572	48	651	2833	0	0	2	0	0	6639
19	झुंझुनू	8431	1686	1684	2	1120	3138	0	2	4	14	5	498
20	सीकर	12902	3784	3774	10	1185	2582	0	0	24	0	3	6286
21	जयपुर	27142	29795	29790	5	634	2072	0	1	134	15	7	16296

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिव्यक्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिव्यक्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
22	कोटपूतली बहरोड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	जोधपुर	17156	8827	8822	5	480	484	2	0	21	57	24	4582
24	फलोदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	बाड़मेर	8465	5344	5326	18	307	142	13	7	10	19	14	8365
27	बालोतरा	5399	7293	7272	21	0	0	0	0	2	2	0	15538
28	जैसलमेर	1962	610	610	0	492	426	4	0	0	17	6	379
29	जालौर	9335	7945	7935	10	80	594	0	0	6	6	2	11360
30	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	बार	12627	4030	4003	27	360	155	0	0	36	0	0	5094
32	बूंदी	11182	3122	3122	0	0	0	0	2	51	10	2	2782
33	झालावाड़	9788	5027	5027	0	505	736	0	0	0	27	5	3739
34	कोटा	8423	3380	3362	18	329	97	142	0	29	3	3	7554
35	बांसवाड़ा	20824	11326	11315	11	770	882	0	1	80	0	1	6583
36	चित्तौड़गढ़	12859	6225	6225	0	418	1762	0	0	67	0	7	7950
37	डूंगरपुर	43544	9573	9573	0	1267	2470	0	0	71	0	2	4308
38	राजसमन्द	14326	8081	8081	0	808	1569	0	0	42	11	1	19243
39	उदयपुर	38344	16203	16203	0	784	3040	0	0	151	0	3	13624
40	प्रतापगढ़	17218	7106	7087	19	138	3106	0	0	41	0	6	6311
41	सलूम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		445009	226546	226247	299	20886	44793	333	24	1037	281	149	200007

47वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (शहरी)

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिवर्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिवर्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
1	अजमेर	5137	4841	4826	15	52	27	0	1	1	2	0	2221
2	भीलवाड़ा	3133	5701	5685	16	25	44	1	1	5	0	0	1372
3	नागौर	62	24	24	0	2	9	0	1	2	4	1	24
4	टोंक	1272	1048	1047	1	69	70	6	1	0	2	4	1128
5	ब्यावर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	डीडवाना कुचामन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	श्री गंगानगर	546	172	172	0	2	0	0	0	0	0	0	15
9	हनुमानगढ़	446	126	126	0	56	0	0	0	0	0	0	0
10	चुरू	47	22	22	0	12	15	0	0	0	0	0	0
11	भरतपुर	1032	755	749	6	286	241	0	2	0	5	0	1700
12	धौलपुर	730	356	355	1	16	21	0	0	0	0	1	438
13	करौली	261	39	39	0	17	67	0	0	0	0	0	150
14	सवाई माधोपुर	744	573	570	3	42	38	0	0	0	0	0	1789
15	डीग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	अलवर	927	155	153	2	203	517	0	0	1	1	0	183
17	खैरथल तिजारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	दौसा	1082	1230	1230	0	83	139	0	0	2	0	0	722
19	झुझनू	399	47	47	0	113	150	0	1	2	6	2	42
20	सीकर	168	0	0	0	93	56	0	0	0	0	0	0
21	जयपुर	2612	4925	4925	0	56	126	0	2	0	4	1	2493
22	कोटपूतली बहरोड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परित्यक्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परित्यक्त हैण्डपम्पों की संख्या			अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
											फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
23	पाली	1821	1418	1418	0	76	75	0	0	0	5	7	2	829	
24	जोधपुर	2973	702	700	2	3	0	2	15	1	1	1	2	0	
25	फलीदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	जालौर	179	152	152	0	30	20	5	0	0	0	0	1	163	
29	सिरोही	1234	832	830	2	9	54	0	0	0	0	2	0	794	
30	बालोतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	बारां	1124	1288	1278	10	40	5	0	0	0	0	0	0	1231	
32	बूंदी	961	1412	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	
33	झालावाड़	917	1137	1137	0	32	24	0	0	0	0	0	0	1103	
34	कोटा	838	925	925	0	13	45	1	0	0	0	0	0	1093	
35	बांसवाड़ा	634	582	580	2	23	14	0	0	0	0	0	1	834	
36	चित्तौड़गढ़	615	444	444	0	32	29	0	0	0	0	0	0	1089	
37	डूंगरपुर	913	1227	1227	0	18	3	0	0	0	0	0	0	1035	
38	राजसमन्द	748	716	716	0	12	22	0	0	0	0	0	0	1874	
39	उदयपुर	13321	2478	2476	2	32	136	0	0	0	0	0	1	1713	
40	प्रतापगढ़	439	409	407	2	2	63	0	0	0	0	0	2	159	
41	सलेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग		45315	33736	33672	64	1449	2010	15	24	19	34	18	24866		

48वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2024-25 (1.4.2024 से 31.12.2024 तक) (ग्रामीण)

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिवर्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिवर्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
1	अजमेर	15920	12639	12629	10	363	916	0	5	9	9	8	6336
2	भीलवाड़ा	21701	15481	15477	4	1108	2034	0	0	43	0	4	9119
3	नागौर	1638	617	617	0	4	30	0	4	4	10	5	312
4	टोंक	14095	6239	6218	21	853	524	193	0	33	0	6	3367
5	ब्यावर	7654	7284	7284	0	234	543	26	0	6	0	3	5783
6	डीडवाना कुचामन	2242	1586	1586	0	154	327	0	3	19	31	5	1009
7	बीकानेर	6683	1441	1441	0	135	182	0	0	0	7	1	0
8	श्री गंगानगर	2726	782	782	0	0	0	0	0	4	4	5	264
9	हनुमानगढ़	2675	341	339	2	185	2	0	0	0	0	5	0
10	चुरू	556	149	149	0	32	274	0	0	0	0	0	0
11	भरतपुर	7342	1379	1379	0	428	313	0	0	17	33	5	2141
12	झालपुर	24322	3245	3213	32	1113	1865	0	0	25	27	5	4324
13	करौली	9043	1860	1858	2	1144	708	0	1	17	13	3	2963
14	सवाई माधोपुर	14664	4598	4570	28	1282	2212	0	0	33	7	7	7652
15	झींग	5453	1852	1852	0	1301	1217	0	0	1	4	0	2426
16	अलवर	11957	1518	1513	5	1994	4422	0	0	28	0	3	1983
17	खैरथल तिजारा	4826	821	821	0	1067	1740	0	1	7	0	4	864
18	दौसा	14998	11938	11866	72	691	3057	0	0	17	8	2	4734
19	झुंझुनू	3952	380	379	1	611	1557	1	0	2	4	2	149
20	सीकर	15148	2682	2665	17	962	3727	58	2	19	11	8	2964
21	जयपुर	23219	8389	8379	10	263	1484	0	5	81	11	7	10375
22	कोटपूतली बहरोड़	5219	1022	1022	0	279	2586	0	0	1	4	1	2200
23	पाली	8384	1696	1680	16	158	152	27	0	14	23	8	938

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिवर्तित पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिवर्तित हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
24	जोधपुर	4945	2044	2044	0	35	82	0	0	3	36	5	1856
25	फरीदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	बाड़मेर	6765	2785	2777	8	226	75	0	6	3	11	15	3897
27	जैसलमेर	5615	5693	5679	14	78	62	0	2	2	2	0	12435
28	जालौर	1521	343	343	0	494	337	15	0	0	19	5	222
29	सिरोही	9368	5108	5106	2	53	11	1	0	6	18	5	4760
30	बालोतरा	3686	1109	1093	16	68	71	0	6	6	10	6	2099
31	बारा	12770	2263	2248	15	400	198	0	0	7	0	0	3999
32	बूंदी	11256	3429	3429	0	0	0	0	2	29	6	2	4440
33	झालावाड़	9708	3881	3850	31	505	736	0	0	42	2	0	2333
34	कोटा	8296	3010	3000	10	278	88	0	0	23	22	8	7434
35	बांसवाड़ा	20098	9267	9256	11	770	991	0	1	63	51	5	8673
36	चित्तौड़गढ़	12744	5305	5295	10	270	1440	0	0	40	0	0	10434
37	झुंझपुर	44294	8750	8750	0	1218	5916	0	1	61	20	5	4758
38	राजसमन्द	14326	8205	8184	21	808	1569	0	0	37	60	11	14268
39	उदयपुर	28479	8496	8473	23	489	2522	0	0	89	0	12	3908
40	प्रतापगढ़	18633	4998	4988	10	198	3682	0	1	37	1	2	5389
41	सलेम्बर	10089	2450	2450	0	303	529	0	0	23	0	3	3498
कुल योग		447010	165075	164684	391	20554	48181	321	40	851	464	181	164306

48वां हैण्डपम्प विशेष मरम्मत अभियान 2024-25 (01.04.2024 से 31.12.2024 तक) (शहरी)

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिव्यक्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटाये गये परिव्यक्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
1	अजमेर	4184	4112	4111	1	39	30	2	1	1	3	0	2342
2	भीलवाड़ा	5104	7115	7115	0	29	52	2	2	34	0	2	1866
3	नागौर	9	2	2	0	0	0	0	2	3	3	2	100
4	टोंक	1193	790	790	0	82	66	0	0	0	0	1	861
5	ब्यावर	1559	583	574	9	44	48	0	0	0	0	0	661
6	डीडवाना कुचामन	55	16	16	0	5	10	0	0	5	8	2	12
7	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	श्री गंगानगर	544	266	266	0	0	0	0	0	3	3	3	83
9	हनुमानगढ़	446	49	49	0	59	0	0	0	0	0	0	0
10	चुरू	47	16	16	0	19	16	0	0	0	0	0	0
11	भरतपुर	390	100	100	0	98	77	0	0	0	0	0	156
12	धौलपुर	763	349	347	2	24	26	0	0	0	2	0	411
13	करौली	249	86	85	1	44	73	0	0	1	0	0	113
14	सवाई माधोपुर	887	683	674	9	81	47	0	0	1	3	2	1602
15	डीग	647	824	824	0	225	196	0	2	0	7	0	1221
16	अलवर	640	132	132	0	168	345	0	0	2	0	0	351
17	खैरथल तिजारा	258	94	94	0	42	135	0	0	0	0	0	181
18	दौसा	1085	1076	1076	0	110	152	0	0	0	0	0	996
19	झुंझुनू	137	46	46	0	60	31	0	0	1	1	1	30
20	सीकर	344	106	106	0	72	160	0	1	1	4	0	0
21	जयपुर	2245	1572	1572	0	21	107	0	1	2	3	0	697
22	कोटपूतली बहरोड़	514	241	241	0	40	127	0	0	0	2	0	738

क्रम. स.	जिले का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	कुल सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत किये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों की संख्या	परिव्यक्त पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे पाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	कुल मौके से हटायें गये परिव्यक्त हैण्डपम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाया गया 32 मि.मी. जी.आई. पाइप (मीटर में)
									फिटर	मिस्त्री	हेल्पर		
23	जोधपुर	2973	795	789	6	23	0	22	15	1	1	2	0
24	पाली	1387	551	548	3	25	38	26	0	5	8	2	322
25	फलीदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	बाड़मेर	55	1	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0
27	जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	जालौर	192	129	129	0	33	21	0	0	0	3	1	75
29	सिरोही	1234	555	554	1	7	8	0	0	0	0	0	735
30	बालोतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	बारा	1124	545	541	4	48	14	0	0	0	0	0	981
32	बूंदी	969	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	660
33	झालावाड़	1172	766	758	8	23	26	0	0	0	0	0	638
34	कोटा	1203	752	752	0	19	2	0	0	0	0	0	1074
35	बासवाड़ा	634	330	330	0	23	14	0	0	0	6	0	537
36	चित्तौड़गढ़	581	362	362	0	17	29	0	0	0	0	0	999
37	झुंझपुर	977	478	478	0	28	68	0	0	0	4	1	960
38	राजसमन्द	748	545	545	0	12	23	0	0	0	0	0	1692
39	उदयपुर	3219	2995	2990	5	29	141	0	0	0	0	2	1347
40	प्रतापगढ़	439	163	163	0	1	72	0	0	0	0	0	157
41	सलूम्बर	102	88	88	0	6	0	0	0	0	0	1	204
कुल योग		38309	28043	27994	49	1606	2154	52	24	60	61	22	22802

वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित नलकूपों/हैण्डपम्पों की संख्या

क्र. स.	जिला	नलकूपों की संख्या				हैण्डपम्पों की संख्या			
		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
		23-24	24-25 (दि. 24 तक)	23-24	24-25 (दि. 24 तक)	23-24	24-25 (दि. 24 तक)	23-24	24-25 (दि. 24 तक)
1	अजमेर	14	11	35	10	107	49	344	79
2	भीलवाड़ा	0	0	28	4	39	0	255	88
3	नागौर	0	2	173	186	0	0	367	45
4	टोंक	8	0	46	12	9	0	294	85
5	ब्यावर	0	0	0	16	0	20	0	38
6	डीडवाना कुचामन	0	0	0	87	0	0	0	34
7	बीकानेर	34	0	76	20	0	0	97	44
8	श्री गंगानगर	4	2	12	19	0	0	44	0
9	हनुमानगढ़	9	0	36	7	12	0	113	0
10	चुरू	65	29	149	40	0	0	72	40
11	भरतपुर	17	11	26	9	4	1	465	34
12	धौलपुर	2	0	6	0	23	0	609	0
13	करौली	3	0	14	1	2	0	109	15
14	सवाई माधोपुर	3	4	0	6	42	0	206	41
15	डीग	0	0	0	1	0	0	0	8
16	अलवर	55	7	45	9	0	0	204	17
17	खैरथल तिजारा	0	0	0	0	0	0	0	14
18	दोसा	17	14	24	30	5	0	379	51
19	झुंझनू	36	7	255	13	3	0	113	0
20	सीकर	69	21	295	23	0	0	234	0
21	जयपुर	181	21	157	17	7	0	416	17
22	कोटपूतली बहरोड़	0	6	0	12	0	0	0	0
23	जोधपुर	58	0	445	0	109	0	310	82
24	पाली	2	0	75	7	10	0	247	11
25	फलौदी	0	1	0	50	0	0	0	0
26	बाड़मेर	0	0	289	35	0	0	384	47
27	जैसलमेर	10	5	138	44	0	0	97	26
28	जालौर	2	0	90	63	6	0	104	0
29	सिरोही	4	0	37	12	0	0	112	0
30	बालोतरा	0	0	44	93	0	0	35	30
31	बारां	0	2	4	1	0	1	143	25
32	बूंदी	0	0	0	0	8	0	74	0
33	झालावाड़	0	0	0	7	20	8	112	45
34	कोटा	0	1	0	5	4	0	114	88
35	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	128	50
36	चित्तौड़गढ़	6	1	2	12	0	0	156	15
37	डूंगरपुर	0	3	0	10	0	0	152	40
38	राजसमंद	0	0	0	4	0	0	0	10
39	उदयपुर	0	11	0	1	0	2	192	62
40	प्रतापगढ़	2	0	0	3	0	0	65	58
41	सलूबर	0	0	0	3	0	0	0	29
कुल योग		601	159	2498	1012	410	81	6746	1268

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
(अ) पूर्ण परियोजनाएँ										
1	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़ क्षेत्र-प्रथम चरण	26/7/1994	44.35	42.73	बीसलपुर बांध	94			94
2	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना नसीराबाद क्षेत्र-प्रथम चरण	7/6/1999	61.03	54.16	बीसलपुर बांध	61			59
3	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना नसीराबाद क्षेत्र-द्वितीय चरण	PPC 160/ 11.01.05	11.53	13.25	बीसलपुर बांध	49	54		54
4	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा (प्रथम चरण)	10/7/1999	53.86	52.02	बीसलपुर बांध	1	13	1	13
5	अजमेर	पाईप लाईन जुनिया से सरवाड़ अजमेर बीसलपुर परियोजना -द्वितीय चरण के अन्तर्गत सरवाड़ नसीराबाद योजना	4/3/2007	99.75	81.24	बीसलपुर बांध				
6	अजमेर	सेप्टी मेजर कार्य अजमेर बीसलपुर परियोजना	PPC 160/ 11.01.05	26.52	21.16	बीसलपुर बांध				
7	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा क्षेत्र द्वितीय चरण	PPC 156/ 23.07.04	91.18	47.08	बीसलपुर बांध	123	29		123
8	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़ द्वितीय चरण	PPC 155/ 12.07.04	32.62	36.97	बीसलपुर बांध	49	69		49
9	भीलवाड़ा	संवर्धन शहरी जल योजना भीलवाड़ा (काकोरलिया घाटी)	1/5/2002	29.13	28.22	काकोरलिया घाटी क्षेत्र नलकूप	7			7
10	अजमेर	शहरी संवर्धन जल परियोजना ब्यावर (यूआईएसएसएमटी)	28/5/2008	49.79	43.29	बीसलपुर बांध				
11	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना अराई-किशनगढ़ परियोजना	13/10/2008	152.49	144.39	बीसलपुर बांध	171	348		171
12	अजमेर	अजमेर-बीसलपुर -द्वितीय चरण	25/5/2005	411.53	346.87	बीसलपुर बांध	7		7	
13	नागौर	मातासुख माईन्स से जायल हेतु डीसेलिनेटेड पेयजल योजना (परियोजना के अन्तर्गत 120 ग्रामों को अब सतही स्रोत इन्दिरा गांधी नहर से नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण के द्वारा मई, 2018 में लाभान्वित कर दिया गया है)	13.07.07 Rev PPC 205/ 18.05.2021	143.49	136.02	मातासुख माईन्स	120			120
14	नागौर	शहरी संवर्धन जल परियोजना मकराना (यूआईएसएसएमटी)	28/5/2008	48.70	43.37	नलकूप				
15	अजमेर	एफ.सी.पी. अजमेर पीसांगन	13-10-2008	221.34	193.80	बीसलपुर बांध	0	113	114	0
16	अजमेर	फ्लोराईड नियन्त्रण परियोजना भिनाय-मसूदा क्षेत्र तृतीय चरण	14/02/2004	74.65	74.65	बीसलपुर बांध		124	93	124
17	अजमेर	अजमेर पुष्कर पेयजल योजना(जे.एन.एन.यू.आर.एम.के अन्तर्गत)	28/12/2007	166.42	153.29	बीसलपुर बांध				
18	भीलवाड़ा	चम्बल भीलवाड़ा परियोजना	"PPC 187/ 27.09.11 Rev PPC 199/28.06.17 FC 736/03.01.18.	913.80	822.13	चम्बल नदी	1	0	0	1
										0

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
19	अजमेर	किशनगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन का कार्य	PPC 196/20.10.15	77.29	60.50	बीसलपुर बांध	1	0.00	0	1
20	बुरु-झुन्धुनू	आपनी योजना-प्रथम चरण	1/11/2005	429.65	414.45	ई.गां.नहर	2	376	40	2
21	बुरु-झुन्धुनू	चुरू-बिसात परियोजना	1/5/1998	119.04	108.57	ई.गां.नहर	3	169		3
22	श्री गंगानगर	दिब्बा क्षेत्र सूतगढ़ की जलप्रदाय योजनाएँ	13/7/2007	31.74	29.25	ई.गां.नहर		46		46
23	बीकानेर	कोलायत जलप्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट)	13/7/2007	96.00	75.28	ई.गां.नहर		45	17	45
24	बीकानेर	कोलायत जलप्रदाय योजना (कोलायत लिफ्ट)	13/7/2007	106.00	102.69	ई.गां.नहर		63	71	63
25	बुरु-झुन्धुनू	बूगी राजगढ़ परियोजना	PPC 188/24.8.12	415.64	284.96	ई.गां.नहर	1	188	60	1
26	सीकर	फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना	PPC 188/24.8.12	832.00	728.50	ई.गां.नहर	3	283	69	3
27	झुन्धुनू	ई.गा.न.प. से एकीकृत तारानगर-झुन्धुनू सीकर खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	954.74	898.60	ई.गां.नहर	5	258	797	5
28	चुरू	आपनी योजना - द्वितीय चरण (रतनगढ़-सुजानगढ़ सेक्शन)	संशोधित PPC 190 / 30.05.13	971.21	866.39	ई.गां.नहर	5	256	325	5
29	कोटा	रामगंज मण्डी-पंचपहाड़ जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC 180 / 13.10.08	196.00	185.19	राणा प्रताप सागर	3	220		3
30	झालावाड़	छापी-झालावाड़-झालरापाटन जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC 186 / 24.12.10	106.23	92.82	छापी बांध	2			2
31	झालावाड़	क्लस्टर वितरण प्रणाली-छापी-झालावाड़-झालरापाटन	PPC 174/01.02.07	91.37	96.64	छापी बांध	0	235		0
32	झालावाड़	गुलण्डी जलप्रदाय योजना	संशोधित PPC 191/19.09.13	53.50	51.28	गुलण्डी बांध		77	8	0
33	झालावाड़	कालीखाड़ जलप्रदाय योजना	13/7/2007	61.61	63.24	कालीखाड़ बांध	0	71	35	0
34	कोटा	कोटा शहर में वितरण प्रणाली पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य (आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा छोड़े गये कार्य)	संशोधित 19/3/2007	48.24	34.21	चम्बल नदी				
35	झालावाड़	ग्रामीण जल प्रदाय योजना रेवा (झालावाड़)	30-12-07Rev 194/09.12.14	66.29	66.27	रेवा बांध		49	5	49
36	झालावाड़	भीमनी पेयजल परियोजना जिला झालावाड़	PPC 187/27.09.11	30.80	26.90	भीमनी बांध		30	14	30
37	झालावाड़	माधवी पेयजल परियोजना जिला झालावाड़	PPC 187/27.09.11	30.87	23.08	माधवी बांध		32	3	32
38	झालावाड़	पीपलाद पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	32.84	29.97	पीपलाद बांध	2	14		2

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज			लाभान्वित कवरेज		
							शहर	ग्राम	ढाणियाँ	शहर	ग्राम	ढाणियाँ
39	बूंदी	चम्बल-बूंदी पेयजल परियोजना	संशोधित PPC188/24.08.12	74.37	51.44	चम्बल नदी	1			1	0	0
	बूंदी	चम्बल-बूंदी कलस्टर पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	15.45	13.25	चम्बल नदी		19	12	0	19	12
40	बारां	नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना जिला बारां	PPC188/24.08.12	78.98	73.76	काली सिन्ध नदी	1	42	8	1	42	8
41	बूंदी	इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना	PPC 199/ 28.06.17.	73.93	60.42	चाकन बांध	2	45	6	2	45	6
42	बूंदी	चम्बल-बूंदी कलस्टर पेयजल परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा परियोजना से)	PPC 199/ 28.06.17.	80.80	74.38	चम्बल नदी		34	25	0	34	25
43	कोटा	बोरवास पदमपुरा पेयजल परियोजना जिला कोटा	PPC 187/ 27.09.11	118.04	81.18	चम्बल नदी	0	60	21	0	60	21
44	बारां	अटारु शेरगढ़ पेयजल परियोजना	PPC 197/25.04.16	89.69	64.96	परवन नदी	3	26	7	3	26	7
45	झालावाड़	राजगढ़ पेयजल परियोजना	PPC 196/20.10.15Revise 06.07.18	149.31	133.10	राजगढ़ बांध		54	15		54	15
46	बारां	बारां कलस्टर परियोजना	Rev PPC 197/ 25.04.16, Rev in 19th SLSC dated 26.12.19	104.57	82.20	पार्वती नदी	0	50	16	0	46	16
47	झालावाड़	गागरीन पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	351.48	324.93	गागरीन बांध		315	36	0	311	36
48	बारां	अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	PPC 199/ 28.06.17, Rev in 19th SLSC dated 26.12.19	126.28	46.67	काली सिन्ध नदी	0	47	7	0	47	7
49	जालौर	नर्मदा F.R. कलस्टर	PPC 191 / 19.09.13	509.20	529.71	नर्मदा नहर		267		0	267	0
50	जालौर	नर्मदा D.R. कलस्टर	PPC 191 / 19.09.13	263.50	262.85	नर्मदा नहर		138			138	0
51	जालौर	नर्मदा F.R. transmission main-I नर्मदा परियोजना	02-01-2007Rev 19/09/12.14	390.17	370.61	नर्मदा नहर						-
52	जोधपुर	बागोर-आहोर-जालौर	PPC 187/ 27.09.11	111.82	107.25	ई.गा.नहर		64			64	
53	जोधपुर	इन्द्रोका-माणकलाव-खांगटा परियोजना	PPC 169/ 29.05.06	64.76	71.30	ई.गा.नहर		69	130		69	130
54	जोधपुर	उमदेसागर-धाहवा-समदडी परियोजना; पार्ट-प्रथम एवं द्वितीय राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय	4/3/2007 संशोधित	137.21	152.51	ई.गा.नहर		34	69		34	69
55	जोधपुर	कुडी-बूणी-सालावास	30/3/2006	30.86	32.64	ई.गा.नहर		22		0	22	0
56	जालौर	नर्मदा वाटर सप्लाई सिल्लु-जैसला- भक्ति योजना	20/05/2006	1.61	1.63	नर्मदा नहर	0					

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
57	जोधपुर	केरू-बेरू-जोलियाली पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय	13/7/2007	32.01	30.65	ई.गा.नहर		32	183	32
58	जैसलमेर	बाडमेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण	संशोधित 1/2/2007	688.66	726.16	ई.गा.नहर	1	0	0	0
59	पाली	जवाई पाइपलाइन परियोजना-द्वितीय चरण (भाग-प्रथम)	PPC 187/27.09.11	199.40	150.46	जवाई हेमावास बांध	1	111	1	111
60	जोधपुर	खुडीयाली-जियाबेरी-आगोलाई परियोजना	1/2/2007	74.38	76.98	ई.गा.नहर		77	0	77
61	जालौर	सुदृढीकरण शहरी पेयजल परियोजना जालौर	संशोधित	62.20	58.92	नर्मदा नहर	1	14	0	14
62	जोधपुर	मल्लार जोड़-हिंडलगोल परियोजना, फलौदी	PPC 190 / 30.05.13							
63	जोधपुर	कानसिंह की सिंद-मण्डोर परियोजना, फलौदी	SLSSC 8th/ 5.9.12	35.97	24.95	ई.गा.नहर		10		10
64	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना आरजीएलसी आरडी-42	SLSSC 8th/ 5.9.12	36.02	28.87	ई.गा.नहर		16		16
		घाटौर-कानासर-बाप	PPC 190 / 30.05.13	88.95	70.60	ई.गा.नहर		25		25
65	जालौर	नर्मदा D.R. Transmission System नर्मदा डी.आर. परियोजना	संशोधित	218.34	137.14	नर्मदा नहर	1		1	0
66	जोधपुर	इन्द्रका-माणकलाव-दातीवाड़ा परियोजना	PPC188/24.08.12							
67	जोधपुर	तिवरी-मथानिया-ऑसिया-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना	17/08/2006	308.00	327.89	ई.गा.नहर	2	119	2	119
68	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स-भौरी-कला-खारा - जालौड़ा	(संशोधित 2@2010)	430.06	362.21	ई.गा.नहर		113	950	113
		आरजीएलसी से पीलवा-सादडी जम्बेश्वर नगर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	PPC 190 / 30.05.13	120.81	117.77	ई.गा.नहर		43		43
69	जोधपुर	देवानिया-नाथरू-शेरगढ़-छाबा-फेज-प्रथम एवं द्वितीय पेयजल परियोजना	PPC 191 / 19.09.13	63.78	44.50	ई.गा.नहर		15		15
70	जोधपुर	जलप्रदाय योजना	11/10/2007	234.46	230.52	ई.गा.नहर		315	139	315
71	जोधपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना पांचला घेवरा चिराई	PPC 190 / 30.05.13	396.63	324.10	ई.गा.नहर		59	892	59
72	बाडमेर	उम्मेदसागर-धाहवा-समदडी-खण्डप परियोजना पार्ट-आ	Rev PPC 187/27.09.11	575.46	422.00	ई.गा.नहर	1	180	1	180
73	जैसलमेर	बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - क्लस्टर पार्ट- D	PPC 191 / 19.09.13	451.27	392.66	ई.गा.नहर	0	177	0	177
74	पाली	जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट- चतुर्थ	PPC 202/26.03.18FC	476.00	317.61	जवाई हेमावास बांध		224	121	224
75	बाडमेर	बाडमेर जिले की शिव एवं रामसर गुजामालानी तहसील की जलप्रदाय योजना	745/16-18.06.18	610.79	610.75	नर्मदा नहर		205		205
76	उदयपुर	मानसी वाकल परियोजना-प्रथम चरण	11/6/2001	42.00	41.59	मानसी वाकल बांध	1		1	
77	उदयपुर	स्ट्रेन्थनिंग ऑफ यू.डब्ल्यू.एस.एस., उदयपुर (यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत)	SLSSC dt. 15.02.07	55.57	47.63					

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
78	राजसमन्द एवं उदयपुर	बघेरी का नाका परियोजना	24/8/2012 संशोधित	204.59	210.34	बनास नदी		206		206
79	डूंगरपुर	क्षेत्रीय योजनाएँ आसपुर-डूंगरपुर-सागवाड़ा	13/10/2008	71.93	64.88	साम कमला अम्बा बांध		61	0	61
80	उदयपुर	देवास परियोजना-द्वितीय चरण	3/12/2007	379.19	358.58	आकोदरा व मादडी बांध			0	0
81	बासवाड़ा	बासवाड़ा पेयजल परियोजना	PPC 190 / 30.05.13	141.00	142.27	सुरवाणिया बांध		82	0	82
82	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन का कार्य	PPC 195/09.07.15	94.07	77.24	जाखम बांध	1	0.00	0	0
83	बासवाड़ा	बासवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना	संशोधित	560.00	530.00	माही बांध		334		334
84	भरतपुर	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना भरतपुर कुम्हरे नगर डीग कामा पहाड़ी की पाइपलाइन परियोजना	PPC 191/19.09.13 PPC 188/ 24.8.12	311.49	246.08	चम्बल नदी		97		89
85	धौलपुर	डोंग एरिया जलप्रदाय परियोजना (भाग-प्रथम)	2/11/2004	19.84	18.27	चम्बल नदी		12		12
	धौलपुर	डोंग एरिया जलप्रदाय परियोजना (भाग-द्वितीय)	संशोधित	103.38	93.15	चम्बल नदी		82		82
86	टोंक	बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली परियोजना	PPC 190 / 30.05.13 PPC 188/ 24.8.12	542.11	468.27	बीसलपुर बांध	3	464	755	3
87	नागौर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील (बीसलपुर-टूडू परियोजना से)	संशोधित	128.72	95.92	बीसलपुर बांध		72	161	
88	जयपुर	200 एम.एल.डी. क्षमता का जलशोधन संयंत्र का सूरजपुरा पर निर्माण	PPC 188/24.08.12	150.53	120.30	बीसलपुर बांध				
89	जयपुर	बीसलपुर टूडू परियोजना (चाकसू परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	254.45	221.47	बीसलपुर बांध	0	276	508	0
90	जयपुर	बीसलपुर टूडू परियोजना (बस्सी परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	299.55	231.64	बीसलपुर बांध	0	210	1473	0
91	टोंक	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना निवाई तथा टोंक तहसील (बीसलपुर-टोंक उनियारा परियोजना से)	संशोधित	112.88	114.62	बीसलपुर बांध	0	212	558	0
92	जयपुर	जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना	PPC 188/24.08.12	580.00	526.72	बीसलपुर बांध	1			
93	जयपुर टोंक	बीसलपुर-टूडू-फुलेरा पेयजल परियोजना	7/10/1999 11/10/2007	678.87	203.87	बीसलपुर बांध	9	718	2017	2
94	जयपुर	बीसलपुर टूडू परियोजना (फागी परियोजना)	PPC 190 / 30.05.13	217.24	196.42	बीसलपुर बांध	0	161	266	0
95	नागौर	नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण	PPC 188/24.08.12	2938.00	3019.32	ई.गा.नहर	7	986	1130	7
96	नागौर	नागौर लिफ्ट योजना चरण- प्रथम	Rev PPC 197/ 25.04.16	1194.26	1179.25	ई.गा.नहर	5	494	0	5
97	जयपुर-टोंक सवाई माधोपुर	ईसरदा बांध परियोजना	3/4/2007	44.51	35.66	ईसरदा बांध				

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							शहर	ग्राम	शहर	ग्राम
98	राजस्थान के सभी जिलें	राजस्थान एकीकृत प्लोइड निवारण परियोजना चरण- प्रथम	6/11/2007	33.80	15.54			0		0
		उप-योग पूर्ण परियोजनाएं		24406.44	21792.74		77	10824	11656	70
		(ब) प्रगतिस्त परियोजनाएं								10095
99	अजमेर	कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर	PPC 190 / 30.05.13 & SISSC 19/26.12.2019	332.77	285.77	बीसलपुर बांध		199	390	0
										193
100	भीलवाड़ा	चम्बल भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना	PPC 190 / 30.05.13Rev	2443.73	2022.02	चम्बल नदी	8	1698	0	8
										1698
101	जोधपुर	जोधपुर शहर संवर्धन योजना	PPC 203/14.02.2021	740.50	667.27	ई.गा.नहर	1			1
			PPC 190 / 30.05.13 (Revised)							
102	जैसलमेर	पोकरण-फलसूण्ड परियोजना	Rev PPC 187/27 .09.11Rev	2034.62	1799.51	ई.गा.नहर	3	563	0	2
	बाड़मेर		PPC 201/05.12.2017							455
			FD 05.12.2021							0
103	पाली	जवाई पाइपलाइन परियोजना प्रथम चरण	10.11.2007 संशोधित	634.79	437.02	जवाई हेमावास बांध	7	235	7	235
104	बाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पार्ट-I	PPC 187/27.09.11	202.36	141.90	ई.गा.नहर	0.00	171	0	0
			संशोधित							155
105	बाड़मेर	नर्मदा H.R. Transmission System		160.00	124.43	नर्मदा नहर			0	0
		नर्मदा-गुडामलानी पेयजल परियोजना	PPC188/24.08.12							0
106	बाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - कलस्टर पार्ट-B	PPC188/24.8.12	125.00	102.46	ई.गा.नहर	0	67	0	67
107	जालौर	नर्मदा नहर में पेयजल की हिस्सा राशि	PPC 190 / 30.05.13	236.65	235.98	नर्मदा नहर				
108	पाली	जवाई पाली योजना, फेज-द्वितीय, पार्ट-द्वितीय	PPC 178/11.10.207 & PPC 190 / 30.05.13	479.25	428.43	जवाई हेमावास बांध	2	241	2	230
			PPC 191 / 19.09.13							
109	जालौर	नर्मदा ई.आर. ज्वांटेउपेपवद लेजमउ भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना		455.16	330.09	नर्मदा नहर	1	255	1	7
										0
110	बाड़मेर	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - कलस्टर पार्ट-C	PPC 191 / 19.09.13	700.00	544.84	ई.गा.नहर	0	286	0	286

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अतिरिक्त)

राशि रूपये करोड़ में

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज			लाभान्वित कवरेज		
							शहर	ग्राम	ढागियां	शहर	ग्राम	ढागियां
111	जोधपुर, पाली, बाडमेर	राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना फेज तृतीय	PPC/200/04.10.17 PPC/207/22.02.22 FC/791/11.01.22 FC/825/29.11.22	1799.00	1059.29	राजीव गांधी लिफ्ट	0	0				
112	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ प.सं. के 399 गाँवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना	PPC 200/04.10.17 FC 736/03.01.18	798.35	521.76	माही बांध	0	399	395	0	399	
113	डूंगरपुर	आसपुर, दोवडा एवं डूंगरपुर पेयजल परियोजना	On file MR/608 /14.05.18FC 745/16-18.06.18	365.00	239.04	सोम कमला बांध	1	151	244	1	30	
114	उदयपुर,	उदयपुर शहर की जयसमन्द झील से सुदृढ़ीकरण जल पेयजल परियोजना	On file Approval 12.10.2020	215.00	60.60	जयसमन्द झील	1	0	0	0	0	
115	धौलपुर-भरतपुर	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना-प्रथम चरण भाग-प्रथम	PPC 189/28.01.13 संशोधित	548.69	408.06	चम्बल नदी	1	199		1	177	
116	सवाईमाधोपुर -करोली	चम्बल-सवाईमाधोपुर नादौती परियोजना -प्रथम चरण	PPC 191 / 19.09.13 संशोधित	567.00	451.27	चम्बल नदी	1	636		2	76	
117	भरतपुर	चम्बल-भरतपुर कलस्टर परियोजना -प्रथम चरण भाग-द्वितीय कलस्टर	PPC 190 / 30.05.13	720.31	604.49	चम्बल नदी	4	755		4	445	
(स)	जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं	उप-योग प्रगतिरत परियोजनाएं		13558.18	10465.03		30	5856	1029	29	4453	
118	दौसा - जयपुर	दौसा के डाउन स्ट्रीम में इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	PPC 191 / 19.09.13Rev PPC 199/28.06.17	1038.66	708.31	बीसलपुर बांध	0	0	0			
119	सिराही	सिराही जिले की पेयजल योजना हेतु बत्तीसा नाला पर जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण परियोजना की हिस्सा राशि	PPC 198/02.11.16	108.20	67.42	बत्तीसा नाला बांध	0	0	0			
120	झालावाड़ -	परवन पेयजल परियोजना - प्रथम चरण बारा - कोटा	PPC 201/05.12.17FC 740/14.03.18, 27th SLSSC 03.09.2021 FC 790/30.12.21	251.17	131.06	परवन बांध						
उप-योग जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित महा-योग				1398.02	878.77		0	0	0			
				39362.64	33164.56		107	16680	12685	99	14548	
											11798	

राशि रुपये करोड़ में

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध	ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध
1	भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा में जेजेएम के तहत आपूर्ति, पाइपलाइन की संयुक्त कमीशनिंग और एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 22 गांवों के लिए ए. एंड. एफ. प्रस्ताव	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	10.98	3.96	चम्बल नदी	22	8506	22	3885
2	भीलवाड़ा	मंडल-करेरा डब्ल्यूएस परियोजना पैकेज - 1,2,3 जिला भीलवाड़ा (430)	20वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 11.02.2021	260.08	102.63	चम्बल नदी	176	31175	176	30877
3	भीलवाड़ा	जेजेएम (28 गांव) के तहत चंबल भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना के पैकेज 1, 2, 5 एवं 6 से जिला भीलवाड़ा के चयनित गांवों के लिए FHTCs के साथ आंतरिक ग्राम वितरण के कार्य से संबंधित	ए एंड एफ प्रस्ताव दि. 02.07.2021	8.77	4.28	चम्बल नदी	26	6857	26	4321
4	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा की मंडलगढ़-बिजोलिया तहसील के चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-8 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	180.57	113.03	चम्बल नदी	309	52125	307	42637
5	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा की बनारा-हुरदा तहसील की चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-3 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	166.68	90.01	चम्बल नदी	163	39004	153	36598
6	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला भीलवाड़ा की आसिद-बदनोर तहसील की चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-1 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	168.36	81.91	चम्बल नदी	177	36025	120	25641
7	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील के चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-6 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	131.9	106.48	चम्बल नदी	144	27000	144	30069
8	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील के चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-7 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02-07-2021	112.47	58.73	चम्बल नदी	143	30575	138	27914
9	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा के जहाजपुर-कोटरी तहसील के चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-7 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	180.54	61.15	चम्बल नदी	205	34343	205	31492
10	भीलवाड़ा	जल जीवन मिशन के तहत जिला भीलवाड़ा की तहसील सहारा-रायपुर-सुहाना के चंबल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना चरण-2 के कलस्टर जलापूर्ति परियोजना पैकेज-4 की रेड्रोफिटिंग का कार्य	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी दिनांक 02.07.2021	277					261	46918
11	भीलवाड़ा एवं राजसमंद	चंबल नदी से भीम विधानसभा क्षेत्र (जिला-राजसमंद) की जलापूर्ति व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं पुनर्वास एवं चम्बल भीलवाड़ा परियोजना की रेड्रोफिटिंग का कार्य	31 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 05.01.2022	1082.07	277.29	चम्बल नदी	197	32494	0	0

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध	ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध
12	अजमेर	पीसांगन एवं अजमेर ग्रामीण ब्लॉक के 112 गांवों एवं 140 ढाणियों की जलापूर्ति योजना	25 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 02.07.2021	257.47	120.03	बीसलपुर बांध	112	44189	48	26769
13	अजमेर	फलोराईड कन्ट्रोल परियोजना ब्यावर- जवाजा	19 वीं एस.एल.एस.सी दि 26.12.2019	62.74	33.16	बीसलपुर बांध	62	16427	62	17313
14	अजमेर	तहसील ब्यावर, जिला अजमेर के 160 गांव एवं उनकी ढाणियों की ब्यावर-जवाजा परियोजना	25 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 02.07.2021	175.82	79.67	बीसलपुर बांध	160	24404	91	13855
15	अजमेर	जेजेएम अंतर्गत अजमेर जिले की जल उत्पादन प्रणाली सहित केकड़ी-सरवर सेक्टर के लिए जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पुनर्वासित करने का प्रस्ताव	26 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 02.07.2021	1041.76	0		157	40549	-	निविदा
16	अजमेर	बीसलपुर बांध से मिनाई एवं मसूदा ब्लॉक जिला-अजमेर के लिए डब्ल्यूएसपी।	32 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 25.02.2022	451.16	0		211	50572	-	निविदा
17	अजमेर	बीसलपुर बांध से जिला अजमेर के अरेन और सिलोरा ब्लॉक के लिए डब्ल्यूएसपी।	30 वीं एस.एल.एस.सी दि 29.11.2021	419.72	0		202	29569	-	निविदा
18	अजमेर	बीसलपुर बांध से अजमेर (भाग), अरेन (भाग) और जिला अजमेर के श्रीनगर ब्लॉक के लिए डब्ल्यूएसपी	30 वीं एस.एल.एस.सी दि 29.11.2021	163.49	0		111	13123	-	निविदा
19	धौलपुर	सरमथुरा परियोजना जिला धौलपुर के डांग क्षेत्र के 94 गांवों में एफटीसीएस के लिए आरडब्ल्यूएस	25 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 02.07.2021	86.82	51.56	पार्वती बांध	75	11533	74	11555
20	धौलपुर-भरतपुर	जिला भरतपुर एवं धौलपुर के लिए चम्बल नदी से जलापूर्ति परियोजना	32 वीं एस.एल.एस.सी दिनांक 25.02.2022	3106.31	25.32	चम्बल नदी	743	162361	0	0
21	धौलपुर	लिफ्ट सिंचाई परियोजना डब्ल्यूआरडी के माध्यम से चम्बल नदी से राजखेड़ा और धौलपुर ब्लॉक जिला धौलपुर के 190 गांवों के लिए जलापूर्ति परियोजना	27 वीं एस.एल.एस.सी दि 03.09.2021	343.39	0	चम्बल नदी	130	26021	0	0
22	बीकानेर	कोलायत लिफ्ट नहर डब्ल्यूएस परियोजना (केएलसी), जिला बीकानेर	20 वीं एस.एल.एस.सी दि 11.02.2021	74.78	54.5	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	63	17254	63	13800
23	बीकानेर	गजनेर लिफ्ट नहर डब्ल्यूएस परियोजना (जीएलसी), जिला बीकानेर	20 वीं एस.एल.एस.सी दि 11.02.2021	81.92	35.96	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	46	18220	46	18180
24	बीकानेर	ब्लॉक श्री डूंगराह एवं लूणकरणसर एवं डूंगराह टाउन, जिला बीकानेर के 108 गांवों के लिए जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी दि 11.02.2021	708.93	0	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	108	31336	0	0

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील फरेलू जल सम्पत्ति	ग्राम	क्रियाशील फरेलू जल सम्पत्ति वर्तमान स्थिति
25	बीकानेर	जिला बीकानेर के खाजूवाला निर्वाचन क्षेत्र के लिए जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	488.89	179.65	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	139	33654	139	12080 कार्य प्रगतिरत
26	चूरू	आपनी योजना चरण का विस्तार सह पुनर्गठन, 60 ग्राम सरदारशहर और चूरू-बिसाऊ परियोजना, जिला चूरू।	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	846.96	10.51	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	553	29437	23	2397 कार्य प्रगतिरत
27	चूरू	रतनगढ़ सुजानगढ़ डब्ल्यूएस परियोजना, जिला चूरू	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	198.8	85.67	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	266	58888	212	45425 कार्य प्रगतिरत
28	चूरू	बुगी राजगढ़ डब्ल्यूएस परियोजना, जिला चूरू	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	173.02	74.33	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	144	36859	144	22706 कार्य प्रगतिरत
29	चूरू	चूरू बिसाऊ परियोजना अलसीसर ब्लॉक के 117 गांव और 2 शहर।	29वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	138.46	133.47	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	117	21494	117	26000 कार्य पूर्ण
30	झुंझून	ITJSK WS परियोजना, जिला चूरू, सीकर, झुंझून	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 26.12.2021	231.33	72.51	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	249	77483	96	33675 कार्य प्रगतिरत
31	झुंझून	फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ जलापूर्ति परियोजना, जिला सीकर	29वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	457.72	181.96	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	298	78702	14	20028 कार्य प्रगतिरत
32	सीकर	जिला चूरू, बीकानेर, झुंझून और सीकर में जेजेएम के तहत आपूर्ति, पाइप लाइन की संयुक्त कमीशनिंग और एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 26 गांवों के लिए ए. एंड. एफ. प्रस्ताव	20वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 09.11.2021	20.85	14.52	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	26	2676	26	8398 कार्य पूर्ण
33	चूरू, बीकानेर, झुंझून, सीकर	नोखा जिला बीकानेर में जेजेएम के तहत आपूर्ति, पाइपलाइन की संयुक्त कमीशनिंग और एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 88 गांवों के लिए ए. एंड. एफ. प्रस्ताव।	24वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 26.05.2021	698.72	249.06	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	154	65160	154	14565 कार्य प्रगतिरत
34	बीकानेर	जेजेएम के तहत इसरदा दौसा जलापूर्ति परियोजना के लिए 4058.12 करोड़ की एंडएफ स्वीकृति का प्रस्ताव	31 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 05.01.2022	3593.07	949.76	इसरदा बांध	1256	165201		कार्य पूर्ण (Physically)
35	दौसा एवं सवाई माधोपुर	बस्ती जलापूर्ति परियोजना, जिला जयपुर (28 गांव)	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	33.46	20.87	बीसलपुर बांध एवं स्थानीय स्रोत	28	9387	28	6450 निरस्त
36	जयपुर	बस्ती जलापूर्ति परियोजना, जिला जयपुर (37 गांव)	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25.03.2021	28.8	16.28	ट्यूबवेल बीसलपुर बांध एवं स्थानीय स्रोत	37	10163	37	5914 कार्य पूर्ण (Physically)
37	जयपुर	बीसलपुर – दूदू जल आपूर्ति परियोजना	19 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 26.12.2019	195.12	162.91	ट्यूबवेल बीसलपुर बांध	108	20000	84	15647 कार्य प्रगतिरत
38	जयपुर	बीसलपुर – फागी जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	135.82	64.59	ट्यूबवेल बीसलपुर बांध	150	14522	148	24980 कार्य पूर्ण
39	जयपुर	बीसलपुर फुलेरा जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	195.43	66.67	ट्यूबवेल बीसलपुर बांध	109	21475	109	22465 कार्य प्रगतिरत
40	जयपुर	बीसलपुर – चाकसू जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	146.93	76.46	ट्यूबवेल बीसलपुर बांध एवं स्थानीय स्रोत	260	33606	259	33032 कार्य पूर्ण

बृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभावधि कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील सरल जल संभव	ग्राम	क्रियाशील सरल जल वर्तमान स्थिति
41	जयपुर	पाइप जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन बगरू के 130 गांव विधानसभा जयपुर	29वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 09.11.2021	279.62	0	बीसलपुर बांध	130	27000	0	0: कार्य प्रगतिरत
42	जयपुर	जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार एफएचटीसी प्रदान करने के लिए बीसलपुर दूध डब्ल्यूएसपी के 539 गांवों की पानी की मांग को पूरा करने के लिए सूरजपुरा से सांभर तक ट्रांसमिशन पाइपलाइन	25वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 02.07.2021	265.96	48.00	बीसलपुर बांध	-	-	-	कार्य प्रगतिरत
43	जयपुर	बीसलपुर- टोक- उनियारा- देवली जलापूर्ति परियोजना पेकज IV	19 वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 26.12.2019	200.29	116.19	बीसलपुर बांध	464	64611	370	49356: कार्य प्रगतिरत
44	टोक	बीसलपुर निवाई जलापूर्ति परियोजना	20 वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 11.02.2021	155.32	50.86	बीसलपुर बांध एवं स्थानीय स्त्रोत	214	41076	133	15834: कार्य प्रगतिरत
45	बाड़मेर	पोकरण फालसूड बालातरा सिवाना डब्ल्यूएस परियोजना पेकज -4बी (जिला बाड़मेर) के अंतर्गत आने वाले 167 गांवों में एफएचटीसी उपलब्ध करने का प्रस्ताव	29वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 09.11.2021	268.83	41.7	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	167	38778	19	969: कार्य प्रगतिरत
46	बाड़मेर	डीपीआर के साथ जिला बाड़मेर के 350 एमएच और 1439 ओएच बीएलडब्ल्यूएसपी चरण-द्वितीय मांग-सी के लिए डब्ल्यूएसपी	29वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 09.11.2021	440		इंदिरा गांधी नहर परियोजना	346	9809	-	कार्य प्रगतिरत
47	बाड़मेर	बीएलडब्ल्यूएसपी फेज-द्वितीय पार्ट-बी जिला बाड़मेर के 99 गांव डीपीआर के साथ	26वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 26.08.2021	155.17	56.26	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	98	10955	2	5510: कार्य प्रगतिरत
48	बाड़मेर	पाइड नर्मदा आधारित शिव-रामसर, जिला बाड़मेर डीपीआर के साथ	29वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 09.11.2021	167.25	56.3	नर्मदा नहर	217	13073	68	16144: कार्य प्रगतिरत
49	बाड़मेर	जिला बाड़मेर के 183 गांवों के लिए डब्ल्यूएसपी	26वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 26.08.2021	212.83	95.98	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	183	26557	35	12156: कार्य प्रगतिरत
50	बाड़मेर	बीएलडब्ल्यूएसपी चरण- 2 भाग-ए जिला बाड़मेर के पोकरण-फलसूड के 181 गांवों के लिए डब्ल्यूएसपी पीकेजी-4-ए	27वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 03.09.2021	239.43	132.84	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	180	28526	52	26760: कार्य प्रगतिरत
51	जैसलमेर	जैसलमेर जिले के पोकरण-फलसूड के 130 गांवों के लिए डब्ल्यूएसपी डीपीआर के साथ डब्ल्यूएसपी पीकेजी-3ए	28वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 08.10.2021	211.86	31.88	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	130	20547	0	1492: कार्य प्रगतिरत
52	जैसलमेर	जिला जैसलमेर के पोकरण-फलसूड के 87 गांवों के लिए WSP& p0&3B	27वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 03.09.2021	189.06	112.12	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	87	16389	71	14830: कार्य प्रगतिरत
53	जैसलमेर	196 गांव और 1055 ओएच बीएलडब्ल्यूएसपी फेज- द्वितीय, पार्ट-डी जिला जैसलमेर के अंतर्गत आते हैं	28वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 08.10.2021	254.63	97.23	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	196	35489	22	12513: कार्य प्रगतिरत
54	जालोर	जल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव जेजेएम के तहत एफएचटीसी प्रदान करने के लिए नर्मदा आधारित डीआर डब्ल्यूएस परियोजना	27वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 03.09.2021	260.91	178.95	नर्मदा नहर आर डी 16	160	57924	145	44235: कार्य प्रगतिरत
55	जालोर	जल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव जेजेएम के तहत एफएचटीसी प्रदान करने के लिए नर्मदा आधारित एफआर डब्ल्यूएस परियोजना	29वीं एस्.एल.एस्.एस्.सी दि 09.11.2021	535.88	46.21	नर्मदा नहर आर डी 44	277	119942	0	18693: कार्य प्रगतिरत

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेंज		लाभान्वित कवरेंज	
							ग्राम	क्रियाशील घरलू जल संभव	ग्राम	क्रियाशील घरलू जल संभव
56	जालोर	जल जीवन मिशन के तहत एफएचटीसी प्रदान करने के लिए नर्मदा नहर आधारित सिलू जैसा बांकार आरडब्ल्यूएसएस परियोजना का प्रस्ताव	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03.09.2021	74.66	52.14	नर्मदा नहर आर डी	28	9094	9	3432
57	जालोर	जेजेएम के तहत एफएचटीसी प्रदान करने के लिए नर्मदा नहर आधारित ईआर जल आपूर्ति परियोजना	28वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 08.10.2021	927.2	438.09	नर्मदा नहर आर डी	306	113206	28	33733
58	जोधपुर	FHTC जिला प्रदान करने के लिए RWSS पांचाला घेवरा चोराई। जोधपुर	31 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25.02.2022	205.15	25.83	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	104	23368	28	3612
59	जोधपुर	FHTC जिला प्रदान करने के लिए RWSS मेर हरियाला जोधपुर(118)	28वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 08.10.2021	443.56	201.58	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	118	21043	0	0
60	जोधपुर	पीलवा-सादरी-जम्बेश्वर नगर की पेयजल परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	68.22	15.82	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	54	7786	0	202
61	जोधपुर	कान सिंह की सिड-खिदरत-मण्डोर की पेयजल आपूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	28.26	23.53	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	29	5206	28	5295
62	जोधपुर	माणकलाव-दईजर-बनार की पेयजल आपूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	69.29	13.66	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	37	9747	0	552
63	जोधपुर	तिवरी-माथानिया-ओसिया-बावडी -मौपालगढ की पेयजल परियोजना	28वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 08.10.2021	224.65	12.93	राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर	130	41028	7	1175

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	ग्रामीय जल सन्कल्प	ग्राम	ग्रामीय जल सन्कल्प
64	जोधपुर	मानकलाव-खांगटा की पेयजल परियोजना	25वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	84.59	67.74	राजीव गांधी लिफ्ट	52	16145	52	17473
65	जोधपुर	मलार-जोड-हिण्डालगोल की पेयजल आपूर्ति परियोजना	26वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 26.08.2021	20.7	16.11	नहर जोधपुर	10	2378	10	2377
66	जोधपुर	बावडी कला-खारा-जालोडा की पेयजल आपूर्ति परियोजना	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 03.09.2021	238.18	29.51	नहर जोधपुर	83	14464	16	2472
67	जोधपुर	घटोर-कानासर-बाप की पेयजल आपूर्ति परियोजना	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 03.09.2021	91.67	88.14	राजीव गांधी लिफ्ट	56	9267	56	9513
68	जोधपुर	87 मुख्य हेबिटेसन एंव 352 अन्य हेबिटेसन मोरिया आउ चम्पासर जिला जोधपुर की इंदिरा गांधी परियोजना	25वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	274.34	44.78	नहर जोधपुर	87	11207	7	323
69	जोधपुर	जिला जोधपुर के 80 गावों जम्बा घण्ट्याली बूंगरी की पेयजल आपूर्ति परियोजना	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 03.09.2021	224.81	7.18	राजीव गांधी लिफ्ट	80	13580	0	0
70	जोधपुर	देवानिया-नथराउ की पेयजल आपूर्ति परियोजना, जिला जोधपुर	25वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 02.07.2021	330.92	135.28	नहर जोधपुर	280	36277	272	24475
71	जोधपुर	जिला जोधपुर इंदिरा गांधी नहर से रानेरी -बारू की पेयजल आपूर्ति परियोजना	32 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि. 25.02.2022	93.99	12.87	नहर जोधपुर	27	4990	0	0

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवररेज		लामाचिव कवररेज	
							ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्पत्ति	ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्पत्ति
72	पाली	पाली जिले की सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायत के 34 गांवों की पेयजल आपूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11.02.2021	146.85	95.74	राजीव गांधी लिफ्ट	34	7176	34	8329
73	पाली	जिला पाली की जवाई कलस्टर-4, परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11.02.2021	230.02	112.92	नहर जोधपुर	224	50228	224	45222
74	पाली	उपखण्ड रोहट के अधीन 71 गांवों की जवाई पाईपलाईन परियोजना	31 वीं एस.एल.एस.सी. दि 05.01.2022	199.02	43.47	जवाई बाघ पाली	71	21083	23	8359
75	पाली	जिला पाली की जवाई कलस्टर परियोजना का विस्तार	28वीं एस.एल.एस.सी. दि 08.10.2021	127.85	8.6	जवाई बाघ पाली	99	24411	0	0
76	सिराही	जिला सिराही की बत्तीसा नाला बाध पर आधारित पेयजल आपूर्ति परियोजना	30 वीं एस.एल.एस.सी. दि 29.11.2021	408.24	26.66	बत्तीसा नाला बाध	36	16888	0	0
77	सिराही	जिला सिराही, तहसील श्यांगज के 70 गांवों की जवाई बाध पर आधारित पेयजल परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11.02.2021	294.09	38.43	जवाई बाघ पाली	68	14560	0	0
78	बाडमेर, झुंझुनू	नर्मदा नहर आधारित एचआर-1 और एचआर-2, छोटान-1, बाडमेर जिले के छोटान-2 और आईजीएमसी आधारित (सीपी-1) सूरजगढ़ के लिए राजस्थान ग्रामीण डब्ल्यूएस एंड फ्लोरसिस माइग्रेशन प्रोजेक्ट (चरण-2) भूजब प्रदान करने के लिए झुंझुनू जिले के और उदयपुरवती		4765.31	0		1173	156897	0	0
79	बारां	30 सिंगल विलेज परियोजनाएं जिला बारां	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11.02.2021	5.25	3.81	परवन एवं कालीसिंध नदी	15	2192	15	2192
80	बारां	जिला बारां की 2 वृहद परियोजनाओं से 2 एकल गांवों की परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11.02.2021	1.27	0	कालीसिंध नदी	2	340	2	59
81	बारां	जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	19 वीं एस.एल.एस.सी. दि 26.12.2019	126.28	37	कालीसिंध नदी	47	12228	25	9550
82	बारां	जिला बारां शायगढ पेयजल परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 26-12-2019	104.57	32.39	पार्वती नदी	46	10897	35	9452
83	बारां	जिला बारां की नागदा, अंता बलदेवपुरा की रेट्रोफिटिंग परियोजना	23 वीं एस.एल.एस.सी. दि 25-03-2021	34.73	26.43	कालीसिंध नदी	38	7547	37	7048
84	बारां	जिला बारां के अटरू-शेरगढ की रेट्रोफिटिंग कार्य की परियोजना	23 वीं एस.एल.एस.सी. दि 25-03-2021	19.92	14.88	परवन नदी	16	4175	16	4070
85	बारां	जिला बारां की सिंगोला एनिकट पर आधारित पेयजल परियोजना	26वीं एस.एल.एस.सी. दि 26-08-2021	34.1	23.92	पार्वती नदी	10	1010	0	0
86	बारां	जिला बारां, झालावाड, कोटा की परवन अकावद पेयजल आपूर्ति परियोजना	27वीं एस.एल.एस.सी. दि 03-09-2021	3523.16	131.06	परवन डेम	1212	171662	0	0
87	बूंदी	चम्बल भीलवाडा (फेज-1) से जिला बूंदी के हिण्डोली-नैन्वा पेयजल आपूर्ति परियोजना	20 वीं एस.एल.एस.सी. दि 11-02-2021	973.84	374.63	आरोली ऑफ टेक चम्बल-भीलवाडा ट्रांसमिशन .मेन	286	61220	0	1038

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्पत्ति	ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्पत्ति
88	बूंदी	इटरगढ़ जल समर्थन के तहत आने वाले 16 गांवों में जेजेएम के तहत आपूर्ति, पाइपलाइन की संयुक्त कमीशनिंग और एफएचटीसी दि 11-02-2021 प्रदान करने के लिए ए.ए.एंड.एफ. का प्रस्ताव	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11-02-2021	2.49	1.5	चाकन बांध	14	2007	14	1699
89	बूंदी	नोनेरा जलापूर्ति परियोजना	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	1661.14	25.65	नोनेरा बैराज	749	114202	0	0
90	बूंदी	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए बूंदी क्लस्टर जल आपूर्ति परियोजना (चंबल भीलवाड़ा डब्ल्यूएसपी का विस्तार) जिला बूंदी की रेड्रोफिटिंग	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	76.69	62.4	ऑफटेक चम्बल-भीलवाड़ा ट्रांसमिशन मेन	35	12460	35	9400
91	बूंदी	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए चंबल बूंदी डब्ल्यूएसपी जिला बूंदी के क्लस्टर वितरण प्रणाली की रेड्रोफिटिंग	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	28.63	25.8	ऑफटेक चम्बल-बूंदी ट्रांसमिशन मेन	19	5291	19	4332
92	बूंदी	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए चाकन बांध जिला बूंदी से इटरगढ़ जलापूर्ति परियोजना की रेड्रोफिटिंग	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	27.26	22.39	चाकन बांध	33	3748	33	3918
93	झालावाड़	गागरनी जलापूर्ति परियोजना जिला झालावाड़	21 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11-02-2021	581.99	142.4	गागरनी डेम	311	49852	241	45848
94	झालावाड़	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए रेड्रोफिटिंग कार्य करने के लिए रेवा जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	41.23	23.67	रेवा डेम	49	9887	49	9887
95	झालावाड़	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए रेड्रोफिटिंग कार्य करने के लिए भीमनी जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	21.66	19.09	भीमनी डेम	30	6284	29	6217
96	झालावाड़	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राजगढ़ जल आपूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	81.41	55.15	राजगढ़ डेम	54	10343	44	9920
97	झालावाड़	झालारापाटन टाउन और राजगढ़ बांध जिले से 104 गांवों की जलापूर्ति परियोजना। झालावाड़	28 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 08-10-2021	205.27	101.15	राजगढ़ डेम	96	12368	8	4538
98	झालावाड़	जावर चांदीपुर जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 02-07-2021	13.07	6.73	कालीखार डेम	18	5013	18	4948
99	झालावाड़	माधवी जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	27 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	14.24	13.45	माधवी डेम	32	4612	32	4687
100	झालावाड़	गुलेंडी जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	27 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	34.21	4.55	छापी डेम	73	16962	0	0
101	झालावाड़	कालीखार जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	27 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	35.42	28.1	कालीखार डेम	68	10894	68	11672

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							ग्राम	क्रियाशील घरलू जल सम्बन्ध	ग्राम	क्रियाशील घरलू जल सम्बन्ध
102	झालावाड़	पिपलाद जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	9.26	7.51	पिपलाद डेम	14	3472	14	3411
103	झालावाड़	छापी झालावाड़ जलापूर्ति परियोजना	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	150.99	69.96	छापी डेम	216	29219	118	24835
104	झालावाड़	रायपुर पिडवा चवली जलापूर्ति परियोजना जिला झालावाड़ चवली नदी पप बांध से	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	27.33	26.99	चवली डेम	26	5167	26	5471
105	कोटा	जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए बोरवास मंडाना जल आपूर्ति परियोजना, जिला कोटा	23 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 25-03-2021	88.43	34.1	चम्बल नदी अकेलगढ़ हेड वर्क्स	51	10511	35	8422
106	कोटा	जिला कोटा हेतु समगंजमंडी पंचपहाड़ डब्ल्यूएसपी	27वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 03-09-2021	169.51	134.64	राणा प्रताप सागर बांध	173	36426	173	35794
107	बूंदी	गरुडदा डब्ल्यूएसपी	29वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 09.11.2021	238.25	30.54	गरुडदा बांध	118	16962	0	0
108	झालावाड़	छापी विस्तार जलापूर्ति परियोजना	29वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 09.11.2021	121.99	56.42	छापी डेम	102	11245	0	0
109	नागौर	जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हाउस होल्ड फव्वानल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जिला नागवार की जयल तहसील के 120 गांवों और ढाणियों के आरडब्ल्यूएसएस का कार्य	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 11.02.2021	159.47	116.47	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	123	43423	81	25895
110	नागौर	नावां जल आपूर्ति परियोजना	19 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 26.12.2019	93.95	30.33	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	97	27806	11	3150
111	नागौर	जिला लाडनू प्रखंड के 102 गांवों व ढाणियों में जलापूर्ति नागौर 10VRS 0&M - के साथ	19 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 12.03.2019	205.97	82.76	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	102	20966	68	21201
112	नागौर	जल जीवन मिशन-हर घर जल (फेज-1, पैकेज-4) के तहत टर्नकी आधार पर 10 साल के संचालन और रखरखाव के साथ जिला नागौर के मेड़ता, डेगाना, रियान और भेरुडा ब्लॉक की 181 मुख्य बस्तियों और 142 अन्य बस्तियों के लिए जलापूर्ति प्रदान करने का कार्य (विरण -1, पैकेज- IV)	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 02.07.2021	161.62	100.39	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	180	53451	40	12560
113	नागौर	कुयामन ब्लॉक नागौर जिला के 115 ग्रामों एवं 542 ढाणियों को जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल सम्बंधों के माध्यम से नागौर लिफ्ट परियोजना का पेयजल उपलब्ध करना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पैकेज 05 सीडीएस 02)	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 02.07.2021	116.85	92.47	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	115	17957	81	21993
114	नागौर	ब्लॉक मुंडवा, डेगाना, मेड़ता और खिनवसर ब्लॉक जिला नागौर के 153 गांवों और 240 औएच के लिए डब्ल्यूएस परियोजना की रेडिफिकिंग	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी दि 02.07.2021	183.74	56.44	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	120	37107	20	16265

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरज		लाभान्वित कवरज	
							ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध	ग्राम	क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्ध
115	नागौर	जिला नागौर चरण -1, पैकेज-2 के नागौर, खिनवसर और मुंडवा ब्लॉक के 181 एमएच और 100 ओएच में एफएचटीसी 10 साल के ओ एंड एम के साथ	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	418.37	0		156	44901	0	0
116	नागौर	डेगाना भेरुडा, रिया और जयल ब्लॉक (नागौर) चरण-2, सीडीएस-04 के 10 गांवों और 323 ओएच की योजना	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	108.31	0		10	57516	10	निविदा
117	नागौर	डीडवाना और बोलासर (नागौर) चरण-2, सीडीएस-03 के 34 गांवों और 240 ओएच की योजना	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	97.7	0		34	57582	34	निविदा
118	नागौर	परवतसर ब्लॉक नागौर जिला के 10 नये राजस्व ग्रामों एवं 624 ढाणीयों को जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल सम्बंधों के माध्यम से नागौर लिफ्ट परियोजना का पेयजल उपलब्ध करना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पैकेज 04 सीडीएस 01)	27वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 03.09.2021	104.09	70.8	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	10	44234	10	21245 कार्य पूर्ण
119	नागौर	मकराना ब्लॉक नागौर जिला के 17 नये राजस्व ग्रामों एवं 542 ढाणीयों को जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल सम्बंधों के माध्यम से नागौर लिफ्ट परियोजना का पेयजल उपलब्ध करना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पैकेज 05 सीडीएस 02)	27वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 03.09.2021	113.38	57.26	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	17	40460	10	13603 कार्य प्रगतिरत
120	बासवाड़ा	सुरवन्धा बांध, जिला बांसवाड़ा से ब्लॉक बगीडोरा, बासवाड़ा और तलवाड़ा के 87 गांवों के लिए डब्ल्यूएस परियोजना की रेड्रोफिटिंग	25वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 02.07.2021	130.04	86.18	सुरवन्धीया बांध	93	29773	90	27876 कार्य प्रगतिरत
121	बासवाड़ा	माही बांध पर आधारित बासवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के 345 गांवों के डब्ल्यूएसपी का विस्तार	28वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 08.10.2021	430.85	31.33	माही बांध	345	57563	30	4435 कार्य प्रगतिरत
122	बासवाड़ा	माही बांध से जिला बांसवाड़ा के 250 गांवों हेतु डब्ल्यूएसपी	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	620.76	0	माही बांध	250	55591	0	0
123	बासवाड़ा	माही और अनस नदी (कड़ाना बैकवाटर) के टर्मिनल बिंदु के पास झेर एनीकट से जिला बांसवाड़ा के 233 गांवों (गंगा तलाई 97 और आनंदपुरी 136) के डब्ल्यूएसपी	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	710.42	0	कड़ाना बैक वाटर एवं अनस नदी	233	52774	0	0
124	बासवाड़ा	माही बांध से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ प्रखंडों के डब्ल्यूएसपी	32वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 25.02.2022	211.6	34.68	माही बांध	399	70749	225	11223 कार्य प्रगतिरत
125	चित्तौड़गढ़	ब्लॉक भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के 38 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 11.02.2021	81.99	14.39	चम्बल नदी	38	4097	0	0
126	चित्तौड़गढ़	चंबल नदी से जिला चित्तौड़गढ़ के 648 गांवों (ब्लॉक बेगुन - 142, भैंसरोडगढ़ - 82, गंगारार - 98, चित्तौड़गढ़ - 215, भादेसर - 45 और निम्बाहेड़ा - 66) के डब्ल्यूएसपी	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	2245.72	227.08	चम्बल नदी	648	108455	0	0

वृहद् पेयजल परियोजनाएँ (जल जीवन मिशन के अन्तर्गत)

राशि रुपये करोड़ में

क्र. स.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृति विवरण	स्वीकृत राशि	दिसम्बर 2024 तक कुल व्यय	स्रोत	स्वीकृत कवरेज		लाभान्वित कवरेज	
							ग्राम	क्रियाशील घरों जल सम्बन्ध	ग्राम	क्रियाशील घरों जल सम्बन्ध
127	डूंगरपुर	असपुर, देवड़ा और डूंगरपुर ब्लॉक, जिला डूंगरपुर के 151 गांवों के लिए डब्ल्यूएस परियोजना	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 02.07.2021	159.79	124.56	सोम कमला आम्बा	151	36374	30	21645
128	डूंगरपुर	सोम कमला अबा दाम से जिला डूंगरपुर के आसपुर प्रखण्ड के 61 गांवों के लिए डब्ल्यूएसपी	25 वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 02.07.2021	104.49	85.13	सोम कमला आम्बा	61	18247	42	15187
129	डूंगरपुर	बनेश्वर एनीकट से जिला डूंगरपुर के 212 गांवों (सबला और सगवाड़ा ब्लॉक) के डब्ल्यूएसपी	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	427.68	0	बेणेश्वर एनिकट	212	45921	0	0
130	डूंगरपुर	कड़ना बेंकवाटर (माही बांध) से जिला डूंगरपुर के 353 गांव (चिखली, सिमलवाड़ा, झोठारी और गलियाकोट ब्लॉक) के डब्ल्यूएसपी	31वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 05.01.2024	885.56	0	कड़ना बेंक वाटर	353	91908	0	0
131	प्रतापगढ़	जिला प्रतापगढ़ के लिए जाखम बांध से डब्ल्यूएसपी—	32वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 25.02.2022	1062.77	0	जाखम बांध	524	66614	0	0
132	उदयपुर	सोम कमला अबा बांध से डब्ल्यूएसपी	32वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 25.02.2022	676.73	0	सोम कमला आम्बा	367	44647	0	0
133	राजसमंद	क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना बगरी का नाका, जिला राजसमंद	20 वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 11.02.2021	133.48	72.85	चिकलवास	44	3630	3	2627
134	करौली	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करौली सवाई माधोपुर जिले के 1426 ग्रामों को हर घर जल के माध्यम से चम्बल नदी का सतही जल उपलब्ध करवाये जाने हेतु पेयजल परियोजना (चम्बल सवाई माधोपुर नदी परियोजना)	37वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 30.05.2023	4060.31		चम्बल नदी	1420	37127		एचएम मॉडल निविदा प्रक्रीयाधीन
135	अलवर, भरतपुर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अलवर तथा भरतपुर जिलों के 1237 गांवों को हर घर जल के माध्यम से चम्बल नदी का सतही जल उपलब्ध करवाने हेतु पेयजल परियोजना (चम्बल, अलवर, भरतपुर पेयजल परियोजना)	37वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 30.05.2023	5432.96		चम्बल नदी	1237	7625		एचएम मॉडल निविदा प्रक्रीयाधीन
136	धौलपुर, भरतपुर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत धौलपुर तथा भरतपुर जिलों के 470 गांवों को हर घर जल के माध्यम से चम्बल नदी का सतही जल उपलब्ध करवाने हेतु पेयजल परियोजना (कालीतर पेयजल परियोजना)	37वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 30.05.2023	720.44		चम्बल नदी	470	3900		एचएम मॉडल निविदा प्रक्रीयाधीन
137	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा उदयपुर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत झांखम बांध से उदयपुर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिलों के 1473 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु	37वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 30.05.2023	3645.56	0	झांखम बांध	1473	211926	0	0
138	सीकर, झुंझुनू	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सीकर तथा झुंझुनू जिलों के शेष गांवों को इन्दिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना	37वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 30.05.2023	7799.23	0	इन्दिरा गांधी नहर	1161	160009	0	0
139		इन्दिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजर्वायर	28वीं एस.एल.एस.एस.सी. दि 08.10.2021	1274.26	272.83	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	0	0	0	0
कुल योग				71557.39	9326.69		28328	4850120	6847	1460826

वर्ष 2023-24 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलेवार विवरण 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक

क्र. स.	जिले का नाम	कुल प्राप्त हुए	कुल निस्तारित	शेष
1	अजमेर	16558	16558	0
2	अलवर	11085	11085	0
3	बालोतरा	2523	2523	0
4	बांसवाड़ा	2276	2276	0
5	बारां	6712	6712	0
6	बाड़मेर	13434	13434	0
7	ब्यावर	1626	1626	0
8	भरतपुर	15038	15038	0
9	भीलवाड़ा	20229	20229	0
10	बीकानेर	11222	11222	0
11	बूंदी	3260	3260	0
12	चित्तौड़गढ़	2813	2813	0
13	चुरू	11400	11400	0
14	दौसा	15274	15274	0
15	डीग	1049	1049	0
16	धौलपुर	4649	4649	0
17	डीडवाना-कुचामन	3205	3205	0
18	डूंगरपुर	2049	2049	0
19	हनुमानगढ़	10511	10511	0
20	जयपुर	35733	35733	0
21	जैसलमेर	6130	6130	0
22	जालौर	7134	7134	0
23	झालावाड़	9440	9440	0
24	झुंझुनू	14019	14019	0
25	जोधपुर	23912	23912	0
26	करौली	7769	7769	0
27	खैरथल-तिजारा	646	646	0
28	कोटा	6094	6094	0
29	कोटपूतली-बहरोड़	804	804	0
30	नागौर	27139	27139	0
31	पाली	12064	12064	0
32	फलौदी	577	577	0
33	प्रतापगढ़	1185	1185	0
34	राजसमंद	4021	4021	0
35	सलूंबर	194	194	0
36	सवाई माधोपुर	11018	11018	0
37	सीकर	10737	10737	0
38	सिरोही	5812	5812	0
39	श्री गंगानगर	10117	10117	0
40	टोंक	14745	14745	0
41	उदयपुर	8555	8555	0
कुल		372758	372758	0

वर्ष 2024-25 में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व निवारण का जिलेवार विवरण 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक

क्र. स.	जिले का नाम	कुल प्राप्त हुए	कुल निस्तारित	शेष
1	अजमेर	11754	11727	27
2	अलवर	9066	8941	125
3	बालोतरा	7964	7710	254
4	बांसवाड़ा	1761	1707	54
5	बारां	5779	5660	119
6	बाड़मेर	6941	6897	44
7	ब्यावर	6050	6029	21
8	भरतपुर	11726	11580	146
9	भीलवाड़ा	21231	21009	222
10	बीकानेर	11063	11003	60
11	बूंदी	4092	4084	8
12	चित्तौड़गढ़	3158	3123	35
13	चुरू	11683	11630	53
14	दौसा	14203	13874	329
15	डीग	4965	4719	246
16	धौलपुर	5165	5143	22
17	डीडवाना-कुचामन	13254	13225	29
18	डूंगरपुर	2192	2121	71
19	हनुमानगढ़	11206	11047	159
20	जयपुर	36644	36106	538
21	जैसलमेर	7200	7114	86
22	जालौर	7177	7146	31
23	झालावाड़	8977	8896	81
24	झुंझुनू	14775	14610	165
25	जोधपुर	24187	23661	526
26	करोली	5097	4942	155
27	खैरथल-तिजारा	2997	2984	13
28	कोटा	5870	5834	36
29	कोटपूतली-बहरोड़	3704	3474	230
30	नागौर	13548	13523	25
31	पाली	10666	10580	86
32	फलौदी	3656	3615	41
33	प्रतापगढ़	1126	1072	54
34	राजसमंद	4277	4228	49
35	सलूबर	1223	1221	2
36	सवाई माधोपुर	13652	13372	280
37	सीकर	14332	14113	219
38	सिरोही	5618	5583	35
39	श्री गंगानगर	10152	10092	60
40	टोंक	14165	14129	36
41	उदयपुर	7252	7075	177
कुल		379548	374599	4949

जल जीवन मिशन के तहत जारी घरेलु जल सम्बंधों का जिलेवार विवरण (31.12.2024 तक)

क्र. स.	जिला	कुल घरों की संख्या (IMIS अनुसार 01.04.2024 तक)	जारी जल सम्बंधों की संख्या (31.03.2024 तक)	शेष घरों की संख्या (31.03.2024 तक)	वर्ष 24-25 में जारी जल सम्बंधों की संख्या (31.12.2024 तक)	कुल जारी जल सम्बंधों की संख्या (31.12.2024 तक)
1	अजमेर	263144	131823	131321	16508	148331
2	अलवर	251877	93013	158864	56276	149289
3	बालोतरा	213127	109469	103658	18164	127633
4	बांसवाड़ा	387876	81729	306147	47289	129018
5	बारा	237642	77935	159707	5217	83152
6	बाड़मेर	272698	27426	245272	20159	47585
7	ब्यावर	197221	109985	87236	15274	125259
8	भरतपुर	215058	97813	117245	27947	125760
9	भीलवाड़ा	429472	335120	94352	36320	895264
10	बीकानेर	309188	159236	149952	14473	173709
11	बूंदी	192477	68684	123793	1234	69918
12	चित्तौड़गढ़	293992	81921	212071	2148	84069
13	चुरू	300702	197464	103238	5026	202490
14	दौसा	256772	101362	155410	5616	106978
15	डीग	176382	33848	142534	9266	43114
16	धौलपुर	181980	62616	119364	18706	81322
17	डीडवाना-कुचामन	288568	223621	64947	18584	242205
18	डूंगरपुर	307166	69389	237777	18345	87734
19	श्री गंगानगर	310997	228048	82949	36304	264352
20	हनुमानगढ़	292924	215635	77289	31505	247140
21	जयपुर	512692	313681	199011	17738	330845
22	जैसलमेर	122949	37589	85360	12437	50026
23	जालौर	385138	157364	227774	49543	206907
24	झालावाड़	260368	171979	88389	10188	182167
25	झुझुनू	272581	129308	143273	10362	139670
26	जोधपुर	334261	171615	162646	20247	191862
27	करौली	167877	79195	88682	24776	103971
28	खैरथल-तिजारा	146391	72206	74185	16844	89050
29	कोटा	161896	70626	91270	4896	75522
30	कोटपूतली-बहरोड़	205754	98948	106806	17467	116415
31	नागौर	305772	167824	137948	19855	187679
32	पाली	305204	205502	99702	33135	238637
33	फलोदी	112461	33844	78617	5063	38907
34	प्रतापगढ़	170006	43312	126694	10226	53538
35	राजसमंद	203337	124908	78429	7049	131957
36	सलूबर	132940	43357	89583	12223	55580
37	सवाई माधोपुर	295058	139893	155165	35826	175719
38	सीकर	458533	222795	235738	43191	265986
39	सिरोही	187106	91551	95555	15339	106890
40	टोंक	220777	105715	115062	32211	137926
41	उदयपुर	434917	114198	320719	30009	144207
कुल		10775281	5101547	5673734	832986	5934533

वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) में नगरीय एवं ग्रामीण जल योजनाओं से राजस्व प्राप्तियां एवं प्रतिबद्ध राज्य निधि व्यय

(राशि रु. करोड़ों में)

क्र. स.	वर्ष	सीवरज योजनाओं से प्राप्तियां		नगरीय जल प्रदाय योजनाओं से प्राप्तियां			ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं			कुल ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं से प्राप्तियां
		3	4	जल संबंध से प्राप्तियां	सार्वजनिक नलों से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	जल संबंध से प्राप्तियां	सार्वजनिक नलों से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2023-24	0.25	50.10	0.00	50.10	7.61	0.00	7.61	57.96	
2	2024-25 (दिसम्बर 24 तक)	0.51	140.38	0.00	140.38	21.41	0.00	21.41	162.30	

क. स.	वर्ष	अन्य प्राप्तियां	कुल योग प्राप्तियां	नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय				ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय	कुल ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं पर व्यय
				प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय	बीमा ऋण पर ब्याज	कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2023-24	109.53	167.49	1856.85	0.00	0.00	1856.85	2451.34	4308.19
2	2024-25 (दिसम्बर 24 तक)	50.21	212.51	1446.47	0.00	0.00	1446.47	1925.49	3371.96

जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग के आदेश क्रमांक F&1(8)/RWSSC/LIC/2021-22/6091-6101 दिनांक 12.12.2022 के अनुसार जल राजस्व एवं अन्य राजस्व को Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation (RWSSC) के पी.डी.खाते में हस्तांतरित किया जाने का निर्णय हुआ है।

जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग की आज्ञा एफ.1 (8) PHED/RWSSC/2023-24 दिनांक 31.08.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य के सभी श्रेणियों के जल उपभोक्ताओं से प्राप्त जल उपभोग शुल्क की समस्त राशि दिनांक 01.09.2023 से RWSSC के पी.डी. खाता संख्या 561 में सीधी प्राप्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

इस प्रकार RWSSC के पीडी खाते में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रु. 544.06 करोड़ प्राप्त हुये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में (माह दिसम्बर, 2024 तक) आरआईएसएल के माध्यम से राशि रु. 231.99 करोड़ प्राप्त हुये हैं तथा इस जल राजस्व के अतिरिक्त RWSSC के पीडी खाते में दिनांक 31.12.2024 तक टैरिफ कम्पनसेशन ग्रांट के रूप में राज्य सरकार से रु. 367.00 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों मदों से कुल राशि रु. 598.99 करोड़ प्राप्त हुए।

विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	चयन का आधार
1.	मुख्य अभियंता	11	2	100 प्रतिशत पदोन्नति से
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	32	7	100 प्रतिशत पदोन्नति से
3.	अधीक्षण अभियंता	124	25	100 प्रतिशत पदोन्नति से
4.	अधिशाली अभियंता	437	19	100 प्रतिशत पदोन्नति से
5.	सहायक अभियंता	1478	712	50 प्रतिशत पदोन्नति से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से
6.	कनिष्ठ अभियंता	1217	358	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से
7.	मुख्य रसायनज्ञ	02	00	100 प्रतिशत पदोन्नति से
8.	अधीक्षण रसायनज्ञ	08	01	100 प्रतिशत पदोन्नति से
9.	वरिष्ठ रसायनज्ञ	14	01	100 प्रतिशत पदोन्नति से
10.	कनिष्ठ रसायनज्ञ	37	18	50 प्रतिशत सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से
11.	जीव विज्ञानी	01	01	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से

(दिनांक 13.1.2024 को)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-23 से मार्च-24 तक)

अनु. लागत लाख रु. में

क्रम. सं.	जिला	शहरी योजनाएं		ग्रामीण योजनाएं										कुल ग्रामीण		कुल शहरी व ग्रामीण	
		स्टेट प्लान अरबन/ कन्टीजेंसी/ जेडीए डिपोजिट	स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान	पब्लिक शेयर	क्वालिटी/ डीडीपी	जेजेएम	सपोर्ट फण्ड	जायका	संख्या	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	संख्या				
														संख्या	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत
1	अजमेर	2	3122.39	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	3122.39	
2	अलवर	3	247.63	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3	247.63	
3	बाड़मेर	0	0.00	1	31197.00	0.00	0.00	0.00	26845.00	0.00	0.00	0.00	1	58042.00	1	58042.00	
4	बालोतरा	2	253.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	253.20	
5	बांसवाड़ा	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	बारां	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
7	भरतपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
8	भीलवाड़ा	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	बीकानेर	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
10	बूंदी	1	7.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1	7.06	
11	चित्तौड़गढ़	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
12	चूरू	0	0.00	1	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	44.10	1	44.10	
13	दौसा	2	477.85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	477.85	
14	धौलपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
15	झुगरपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
16	हनुमानगढ़	1	4584.82	1	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	289.39	2	4874.21	
17	जयपुर	5	3105.31	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5	3105.31	
18	जैसलमेर	0	0.00	1	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	49.52	1	49.52	
19	जालोर	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
20	झालावाड़	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
21	झुंझुनू	1	35.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1	35.79	

क्रम. सं.	जिला	ग्रामीण योजनाएं																कुल शहरी व ग्रामीण				
		शहरी योजनाएं		स्टेट प्लान		स्टेट प्लान रूरल / ट्राइबल एरिया सब प्लान		पब्लिक शेयर		क्वालिटी / डीडीपी		जेजेएम		सपोर्ट फण्ड		जायका			कुल ग्रामीण			
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत		अनुमानित लागत	अनुमानित लागत		
22	जोधपुर	0	0.00	5	21894.73			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	21894.73	5	21894.73	
23	करौली	3	31.83	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3	31.83
24	कोटा	1	33.46	1	7.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7.25	2	40.71
25	नागौर	0	0.00	1	158.84			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	158.84	1	158.84
26	पाली	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
27	प्रतापगढ़	1	11.67	1	11.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11.67	2	23.34
28	राजसमंद	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
29	सवाई माधोपुर	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
30	सीकर	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
31	सिरोही	0	0.00	1	199.83			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	199.83	1	199.83
32	श्री गंगानगर	0	0.00	1	185.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	185.16	1	185.16
33	टोंक	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
34	उदयपुर	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
35	पाली / सिरोही	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	अन्य योजनाएं	1	3976.04	226	34334.76			4854.00	0.00	0.00	0.00	24574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226	63762.76	227	67738.80
योग		23	15887.05	240	88372.25			4854.00	0.00	0.00	0.00	51419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240	144645.25	263	160532.30
																			Rs. in Cr		1605.20	

* A&F sanction of 31 nos. OTMP schemes costing more than Rs. 5.00 Cr. approved (sanctioned) in 35th meeting of SLSSC held on 27.12.2022 under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 303.54 Cr.)

* Confirmation of 'on file' A&F sanction for TOW during summer -2023 from April 2023 to August 2023 in 22689 nos. habitations (8249 nos. MH and 14440 nos. OH) of Rural Sector in all 33 nos. districts under State Plan (EC Rs. 8237.00 lac)

* Confirmation of 'on file' A&F sanction for TOW from April 2023 to August 2023 during summer -2023 in 172 nos. town of 3 Inos. districts in urban sector under State Plan (EC Rs. 3976.04 lac)

* A&F sanction of 18 nos. OTMP schemes costing more than Rs. 1.00 Cr. and less than or equal to Rs. 5.00 Cr. approved (Sanctioned) in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023 under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 50.61 Cr.)

* Revised A&F sanction of 200 nos. OTMP schemes having revised cost more than Rs. 1.00 Cr., but less than or equal to Rs. 5.00 Cr., which were revised and sanctioned in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023 under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 50.33 Cr.)

* De-sanction of 26 nos. OTMP schemes costing more than Rs. 1.00 Cr. but less than or equal to Rs. 5.00 Cr. de-sanctioned in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023 under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 50.33 Cr.)

* A&F sanction for transportation of water from September, 2023 to March, 2024 of Rural Sector of 15 Districts of Rajasthan (EC Rs. 493.00 lac)

* A&F sanction for procurement of field testing kits-(FTKs/reagents), under "Water Quality Monitoring & Surveillance activities" for the Year 2023-24 costing more than Rs. 1.00 Cr up to Rs. 5.00 Cr. approved in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023, under Jal Jeevan Mission (EC Rs. 232.78 Lacs)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त समिति व नीति निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत कुल योजनाएं (अप्रैल-24 से दिसम्बर-24 तक)

अनु. लागत लाख रु. में

क्र.सं.	जिला	शहरी योजनाएं				ग्रामीण योजनाएं						कुल शहरी व ग्रामीण			
		स्टेट प्लान अरबन / कन्टीजेंन्सी / जेडीए डिपोजिट		प्रशासनिक स्वीकृति संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृति संख्या	स्टेट प्लान रूरल अनुमानित लागत	पब्लिक शेयर अनुमानित लागत	जेजेएम अनुमानित लागत	कुल ग्रामीण अनुमानित लागत	कुल	अनुमानित लागत			
		लागत	स्वीकृति										लागत	स्वीकृति	
		लागत	स्वीकृति	लागत	स्वीकृति										
1	अजमेर	0	0	0	0	3	6536.03	0	0	0	0	3	6536.03	3	6536.03
2	अलवर	1	219.76	1	2326	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2545.76
3	बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बालोतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बासवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	भरतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बीकानेर	0	0	1	2499.95	2	2099.17	0	0	0	0	2	2099.17	3	4599.12
10	बूंदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	चित्तौड़गढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	चुरू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	दौसा	3	497.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	497.87
14	धौलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झुंझपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	हनुमानगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	जयपुर	0	0	1	208.45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	208.45
18	जैसलमेर	0	0	1	3746	0	0	2	424.88	0	0	2	424.88	3	4170.88
19	जालोर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	झालावाड़	1	24.69	1	2291	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2315.69
21	झुंझुनू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	जोधपुर	0	0	1	169.89	1	182.92	0	0	0	0	1	182.92	2	352.81
23	करौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	जिला	शहरी योजनाएं						ग्रामीण योजनाएं						कुल शहरी व ग्रामीण	
		स्टेट प्लान अरबन / कन्टीजेंन्सी / जेडीए डिपोजिट			प्रशासनिक अनुमानित			स्वीकृति			स्टेट प्लान			कुल ग्रामीण	
		अनुमानित प्रशासनिक अनुमानित			स्वीकृति संख्या			स्वीकृति संख्या			रूरल			अनुमानित	
		लागत	स्वीकृति	लागत	लागत	स्वीकृति	संख्या	लागत	स्वीकृति	संख्या	अनुमानित	लागत	लागत	अनुमानित	लागत
24	कोटा	2	357.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	नागौर	2	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26	पाली	1	115.68	0	0	4	6518	0	0	0	0	0	0	4	6518
27	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	राजसमंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	सवाई माधोपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सीकर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	श्री गंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	टोंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पाली / सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य योजनाएं	1	4335.75	0	0	67	2216435.46	1	8237	0	0	0	0	68	2224672.46
	स्वीकृति निरस्त	0	0	0	0	0	0	4	-127829	-15877	-122729	4	-266435	4	-266435
योग		11	5521.47	7	12041.25	77	2231771.58	7	-119167.12	-15877	-122729	84	1973998.46	102	1991561.18
														Rs. in Cr	
														19925.61	

* Confirmation of 'on file' A&F sanction for TOW from April 2024 to August 2024 during summer -2024 in 201 town of 46 districts in urban sector, under State Plan for an estimated cost of Rs. 4335.75 lac

* Confirmation of 'on file' A&F sanction for TOW during summer-2024 from April, 2024 to August, 2024 in 23604 habitations (8609 MH and 14995 OH) of Rural Sector in 48 nos. districts out of then 50 districts of State, under State Plan (EC Rs. 8237.00 lac)

* De-sanction of 4 nos. OTMP schemes costing more than Rs. 5.00 Cr. de-sanctioned in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023, under JJM (E.C. Rs. 26.64 Cr.)

* Administrative sanction of 08 OTMP schemes costing more than Rs. 5.00 Cr. approved (sanctioned) in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023, under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 75.454 Cr.)

* Revised administrative sanction of 54 nos. OTMP schemes having revised cost more than Rs. 5.00 Cr., which were revised and approved (A&F sanctioned) in 37th meeting of SLSSC held on 30.05.2023 under JJM (E.C. Rs. 430.90 Cr.)

* Confirmation of 'on file' administrative sanction for 05 major projects costing more than Rs. 5.00 Cr. approved (sanctioned) in 37th meetings of the SLSSC held on 30.05.2023, under Jal Jeevan Mission (Total EC Rs. 21658.50 Cr.)

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी.सी.डी. में)	सर्वाई अनाराल (घण्टे में) 120, 86, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत			कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या	
			2011 (As per Census)	वर्तमान				सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)	कार्यरत नलकूपों की संख्या				कार्यरत खुले कुओं/डीसीबी की संख्या
1	अजमेर	अजमेर	795175	926676	163	155	48-72	Bisalpur Dam	124	20	0	2598	5	166307
2		पुष्कर	21621	25617	3	155	48-72	Bisalpur Dam	1.85	15	0	26	3	5139
3		बिजयनगर	32124	45000	4.2	100	48-72	Bisalpur Dam	4.2	0	0	283	0	12150
4		व्यावर	151152	200000	26	130	48-72	Bisalpur Dam	26	0	0	890	0	47352
5		किशनगढ़	154886	183407	21.5	95	48-72	Bisalpur Dam	26	2	0	687	4	41467
6		केकड़ी शहर	41890	51944	7.01	135	48	Bisalpur Dam	7.01	0	0	218	0	10825
7		सरवाड़ शहर	20372	25261	2.53	100	48	Bisalpur Dam	2.53	0	0	165	0	3766
8	नागौर	नावां शहर	22088	27996	3.00	100	48-72	IGNP Canal Water	3.00	0	1	0	0	4839
9		कुचामन शहर	61969	78544	8.05	100	48-72	IGNP Canal Water	7.85	4	3	0	10	14100
10		नागौर	124618	154347	18	125	48	नहरी पानी	18	0	0	10	0	23294
11		मण्डवा	16871	20331	2.1	85	48	नहरी पानी	2.04	3	0	0	0	3150
12		कुचरा	23468	32218	3.1	86	48	नहरी पानी	3.05	4	0	0	0	3561
13		परबतसर	16565	20996	1.4	70	48	IGNP Canal Water	1.4	1	1	0	0	4091
14		लाडनू शहर	65575	83114	9.14	135	72-96	IGNP Canal Water	8.5	0	0	0	0	12745
15	भीलवाड़ा	डेगाना	10655	23000	2.2	100	48	नहरी पानी	2.2	0	0	0	0	4419
16		मेडता	46070	55000	5.5	100	48-72	नहरी पानी	5.5	0	0	0	0	12048
17		मकरानाशहर	94487	119759	11	78	96	IGNP Canal Water	11	0	0	0	0	13789
18		जायल	14299	17874	1.79	100	48	नहरी पानी	1.7	11	0	0	0	3119
19		बासनी	29187	36367	3.5	100	72	नहरी पानी	3.5	0	0	0	0	4965
20		डीडवाना शहर	53749	66807	8.16	135	72-96	IGNP Canal Water	8.1	0	0	0	0	10782
21		बोरावड़	24975	32468	1.78	55	72-96	IGNP Canal Water	1.78	0	0	0	0	3958
22	भीलवाड़ा	359483	450000	80	180	48	(Meja + Chambal + Kakraoliya Ghati)	70	-	0	1986	-	69247	
23	भीलवाड़ा	आसींद	16611	24536	1.8	70	48	Chambal	1.2	-	5	117	-	3474
24		माण्डल	17361	24969	1.8	70	48		1	-	3	118	-	5740
25		गगापुर	18777	25873	1.04	48	72	Chamble	1.04	1	9	151	1	4912
26		माण्डलगढ़	13844	23352	1.63	70	24	Chambal	1	7	2	129	7	2865
27		बिजौलिया	14140	22372	1.58	70	24	Mandol Dam + Chambal	1.9	-	-	79	-	3252

28	शाहपुरा	30320	39873	2.79	70	48	Banas + Chambal	2.9	-	-	283	7	6191
29	जहाजपुर	20586	28872	1.65	57	48	Chambal	1.11	-	-	95	9	3503
30	गुलाबपुरा	27215	36875	2.5	65	48	Chambal	2.58	-	-	177	-	5488
31	हमीरगढ़	12713	15764	1.11	70	72	Chambal + OW in	1	-	2	173	3	1682
32	टोक	165294	200006	25.60	128	48	Banas River Bisalpur Dam- 22.0 MLD	22.00	85	11	561	50	18324
33	देवली	22065	26699	3.00	112	24	& Rest from TWs Bisalpur Dam-3 MLD	3.00	0	1	99	0	6162
34	उनियारा	12551	15187	1.67	110	24	Bisalpur Dam- 1 MLD &	1.00	29	1	83	0	2178
35	निवाई	37765	45696	3.90	85	24	Rest from TWs Intke Well Upstream of	2.80	45	0	278	25	8033
36	मालपुरा	36028	47540	4.23	89	48	Bidoli Dam TWs & Bisalpur Dam 2.8 MLD	3.90	7	0	128	0	8129
37	टोडारायसिंह	23559	28506	1.90	66	24	Bisalpur Dam 3.9 MLD	1.90	0	0	118	0	5382
38	अलवर	322568	386707	2.50	60	48-72	Bisalpur Dam	-	340	0	27	0	47458
39	कठूमर	9480	11755	0.58	50	48	-	-	7	0	17	0	988
40	खेरली	17634	21866	0.95	44	72	-	-	7	0	12	0	2896
41	राजगढ़	26631	33299	1.66	50	48	-	-	12	0	60	0	3878
42	गोविन्दगढ़	11552	13631	0.78	57	48	-	-	8	0	5	0	2050
43	थानागाजी	20645	26708	1.47	55	48	-	-	16	0	22	0	1968
44	लक्ष्मणगढ़	26103	31585	1.38	44	48	-	-	11	0	2	0	2819
45	रामगढ़	13529	16641	1.13	98	48	-	-	7	0	4	1	2125
46	बरोदा	11893	14390	0.63	43	48	-	-	5	0	0	0	1750
47	मालाखेड़ा	11529	13604	0.65	48	48	-	-	13	0	0	0	2764
48	खैरथल	38298	48255	2.99	65	48	-	-	42	0	2	18	6144
49	किशनगढ़ बास	20814	24977	3.05	122	24-48	-	-	15	0	0	4	5203
50	तिजारा	24747	31924	2.20	70	12	-	-	20	0	20	1	3028
51	भिवाडी	104921	135348	19.22	142	12	-	-	120	0	21	7	7687
52	कोटकासिम	8538	10930	0.48	43.9	24	-	-	8	0	9	4	1796
53	टपकड़ा	9471	13793	0.7	50	24	-	-	7	0	16	0	1317
54	मुण्डावर	15739	20145	0.77	38	48	-	-	13	0	8	0	991
55	बहादुरपुर	21112	26179	0.44	17	72	-	-	10	0	2	6	1200
56	डूंगरपुर	47706	58685	4.20	72	48	som kamla amba dam 2.0MLD,Adwardsmand 1.0 MLD , Vijaychakra sagar Dam 1.00MLD	3	5	544	0	10949	

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. (एल.पी. में))	वर्तमान सविस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सलाह अंतराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या	
			2011 (As per Census)	वर्तमान					वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)	कार्यरत खुले कुओं/ डीसीबी की संख्या				
57		सांगवाड़ा	31659	37621	2.85	76	24	and 0.2 MLD from local source	7	3	303	0	6555	
58		गलियाकोट	4707	6050	0.31	51	48			2	2	34	0	805
59	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	101017	130300	15.08	116	24	Kagdi Pickup Weir 15.08 MLD and 1.0 MLD from TWs	11	7	281	0	16528	
60		कुशलगढ़	10666	12355	1.25	70	24	Kalinjara Dam, 1.94 MLD		0	2	123	0	3118
61		परतापुर	21025	25861	1.25	50	24	Bhagora Dam , 1.0 MLD		0	5	130	0	5015
62	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	42079	56552	7.50	133	48	Jakham Dam	7.5	0	0	379	0	12824
63		छोटीसादडी	18360	24675	1.60	65	48	Bari Mansarovar Dam	1.6	0	0	60	0	3294
64		धरियावद	11368	15403	1.09	70	48	-		10	1	134	0	1625
65		दलोत	5647	7373	0.31	42	72	-		3	2	18	9	935
66	भरतपुर	भरतपुर	252838	325000	53	135	24	Chambal River- Bundh Baretha Dam	52	18	0	16	0	38614
67		बयाना	38502	76706	2.3	49	24	-	-	14	0	25	0	4147
68		वैर	19385	22809	1.5	68	24	-	-	13	0	48	0	1925
69		भुसावर	19946	23000	1.5	65	24	-	-	11	0	24		2220
70		नदबई	26411	32221	2.16	67	24	-	-	15	0	68	10	2789
71		रूपवास	14217	19064	1.2	55	24	Chambal River	1.2	0	0	23	0	1506
72		उच्चैन	8718	10549	0.65	55	24	Chambal River	0.5	4	0	14	0	996
73	धौलपुर	बाडी	62721	84937	5.4	75	12	Tws		19	1	96	0	4973
74		बसेडी	22872	30104	1.3	43	24	नलकूप		9	0	165	0	965
75		सरमथूरा	17988	31027	1.15	37	24-48	Parvati Dam Angai		0	0	7	0	3090
76		धौलपुर	133075	175826	22	95	24	Chambal River	21	7	3	395	0	13205
77		राजाखड़ा	33666	38500	2.11	50	24	uydwi		12	0	211	0	2902
78	डीग	कुम्हेर	23540	28954	2.1	76	24-48	Chambal River	2.1	0	0	59	0	2689

79	जीगा	44999	55349	3	64	48	Chambal River	3	0	0	55	0	6048
80	नगर	25572	31454	1.6	58	48	Chambal River	1	8	0	25	0	2476
81	कामा	38040	46789	2.1	53	48	Chambal River	1	18	0	150	0	4785
82	सीकर	17148	21092	0.7	52	48	Chambal River	0.4	9	0	24	0	1888
83	बीकानेर	644406	800000	145.00	135	24	IGNP & 102 TWS	125	102	0	0	0	132933
84	नोखा	62699	67000	7.00	120	24	-	-	72	0	0	0	10779
85	देशनोक	18470	19000	1.81	100	24	IGNP	-	4	0	0	0	3800
86	नापासर	22893	26000	1.52	65	48	IGNP	-	6	0	0	0	4810
87	श्री डूंगरगढ़	53294	57000	5.46	75	48	-	-	23	0	0	0	11938
88	खाजवाला	11831	15380	1.07	70	48	IGNP	-	5	0	0	2	2910
89	हनुमानगढ़	150968	174000	14.70	66	24	Bhakra Canal	12	54	1	283	0	32753
90	सांगरिया	36619	42000	4.00	74	24	Bhakra Canal	4	3	0	3	0	9646
91	पीलीबंगा	37288	43000	4.20	76	24	Bhakra Canal	2.9	5	0	36	0	5762
92	नोहर	49835	57000	7.90	108	24	IGNP	12.5	5	0	33	0	15129
93	भादरा	40662	46000	3.80	64	48	Bhakra Canal	2.5	8	0	12	0	10225
94	रावतसर	35102	40000	4.00	78	48	IGNP	4.49	7	0	20	0	7629
95	टिब्बी	13387	16198	0.91	56	24	--	nil	4	0	0	0	2400
96	सुजानगढ़	101523	115736	12.00	50	48	IGNP	12.00	0	0	0	0	20935
97	छापर	19744	24335	2.50	56	48	IGNP	2.50	0	0	4	0	4407
98	बिदासर	35683	45674	4.30	90	24	IGNP & TW-1.6MLD	2.70	20	0	0	0	7752
99	रतनगढ़	71124	83926	11.70	120	24	IGNP & TWS/DCBs	6.00	82	3	0	3	19416
100	राजलदेसर	27419	32354	4.00	100	24	IGNP & TWS/DCBs	2.50	32	0	0	7	5567
101	तारानगर	32640	37209	3.45	92	24	IGNP	3.45	0	0	0	0	11173
102	राजगढ़	59193	67480	7.50	100	24	IGNP	7.50	0	0	19	0	14003
103	चूरू	120157	145750	17.60	120	24	IGNP & TWS-13.60 MLD	4.00	182	0	0	0	25381
104	रतननगर	12841	15810	1.42	90	24	IGNP & TWS-1.12 MLD	0.30	19	0	0	0	3228
105	सरदारशहर	95911	115653	15.60	130	24	IGNP & TWS-4.20 MLD	11.40	113	0	0	0	21963
106	बहरोड	49202	59534	4.76	80	24	-	-	35	0	211	8	6936
107	विराटनगर	20568	24887	1.02	41	72	-	-	15	0	10	2	3229
108	बहरोड	29531	35437.2	2.78	78	48	0	0	41	0	0	0	4299
109	बानसर	27354	32824.8	0.12	40	24	0	0	14	0	15	0	1827
110	बरदौद	16434	19885	0.5	32	24	0	0	6	0	0	0	1279
111	नीमराणा	17609	21131	0.442	52.62	24	0	0	14	0	0	0	1282
112	बांदीकुई	44664	62000	1.67	27	120	-	-	37	0	55	13	6610
113	बसवा	15532	19980	0.40	16	72-96	-	-	2	0	76	15	1744
114	दौसा	85960	110030	3.60	36	96-144	बीसलपुर-बुगा-दौसा	-	33	2	450	46	13134

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सलाई अन्तराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	जल स्रोत		कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत हेण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान					वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)	कार्यरत खुले कुओं/ डीसों की संख्या				
								पाईप लाईन से 2.2 एम.एल.डी. पानी प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है।						
115	जयपुर	लालसोट	34363	43985	3.00	70	24	-		25	0	85	24	5856
116		मण्डावरी	10798	13175	0.27	20	48	-		10	0	54	6	1038
117		महवा	24846	30138	1.80	60	72	-		18	0	9	25	3608
118		मंडावर	16635	20500	0.77	30	72	-		10	1	7	5	1600
119		जयपुर शहर	3073350	4201922	668.09	135	24	Bisalpur Dam-492.08 MLD & TWs-176.01		3633	0	1153	0	519165
120		बगरू	31229	35452	1.7	48	48	Bisalpur Dam-1.2 MLD & TW at begas roadd Gochar		11	0	193	52	2734
121		चाकसू	33432	36819	3.30	61	24	Bisalpur Dam-1.4 MLD & Rest from TWs/Ows		14	2	408	19	6395
122		सांभर	22327	27735	1.70	61	60-72	Bisalpur Dam-1.60MLD & Rest from Ows		0	9	0	0	5550
123		फुलेरा	26091	32410	1.75	54	72	Bisalpur Dam-1.4 MLD & Rest fromOWs.		0	11	45	0	6355
124		जोबनेर	11354	14694	0.93	64.65	48	Bisalpur Dam-0.45MLD & Rest from Tws.		10	0	42	14	3430
125		के.रेनवाल	29201	36274	1.60	44.11	72	Bisalpur Dam-1.6MLD & Rest from Tws.		5	0	6	0	4983
126		बस्ती	26029	28632	1.60	56	24	0.6 MLD Bisalpur Dam		29	0	128	0	3380
127		चौमू	64417	80075	3.24	40	48	-		125	0	0	15	11200
128		मनोहरपुर	20287	23600	1.66	70	48	-		16	0	11	18	3214
129		शाहपुरा	33895	41012	3.69	90	24	-		37	0	7	13	6823
130		दूदू नरैना	13275	16195	13	80	24	Bisalpur	1.3	3	4	115		2190
131	जोधपुर	जोधपुर	1056191	1318410	360	150	48	RGLC	RGLC	293	26	1819	786	213906

132	बिलाड़ा	39590	47903	4.8	80-85	24-48	Canal Water	4.1	9	0	0	0	6172
133	पीपाड	36810	44100	4.5	80-85	48-72	Canal Water	4	4	0	3	0	8102
134	भोपालगढ़	21895	28018	1.81	40-55	96-120	Canal Water	1.2	8	0	0	0	2966
135	फलोदी	49914	62198	14	130	24	RGLC-9.0 MLD		13	0	0	0	7107
136	जैसलमेर	65471	86422	13.40	15524,48,72-96		IGNP Mohangarh	10	21	0	0	0	12032
137	पोकरण	23554	31091	4.20	135	48	IGNP Main canal -12 MLD	4.2	2	0	0	0	3624
138	बाड़मेर	96225	117975	11.80	100	72	Barmer Lift Canal-17 MLD		0	0	55	0	33326
139	बालोतरा	74496	100300	12.00	80	144	Pokaran Falsoond Project-14 MLD	20	0	0	0	20587	
140	सिवाना	24387	29874	1.20	35	120	TW Goliya & TOW by Tankers	9	0	0	0	0	4600
141	समदड़ी	17590	21548	1.19	55	72	IGNP (USDSK Project) 0.90 MLD	0	1	0	0	0	3870
142	बारा	117992	151636	24.00	145	24	Hiker Deh (21 MLD) & Majrawta Deh (3MLD)	24.00	9	0	506	15	15673
143	अता	32377	40895	4.10	100	24	KALISNDH RIVER Badal Deh 7.5 MLD	7.50	4	0	250	5	2820
144	मांगरोल	25073	31670	3.20	100	24	PARVATI RIVER Singola	2.40	4	0	125	5	2240
145	छबड़ा	32285	40052	3.90	100	24	LAHSI DAM (3.5 MLD) Deh (3.0 MLD)	3.50	12	0	85	0	5191
146	छीपाबड़ोद	18837	23369	2.30	100	24	LAHSI DAM (3.5 MLD)	3.50	6	0	63	8	4065
147	बूंदी	104919	132620	22.00	135	24	Chambal River	20.00	52	1	327	20	22623
148	नैनवा	19485	24630	1.57	60	48	Nil	Nil	18	2	132	18	4174
149	लाखेरी	29572	37380	3.75	87	24	Anicut on Meji River	3.24	4	2	267	11	5443
150	के.पाटन	24627	31130	2.00	75	12	Nil	Nil	22	0	83	2	4591
151	कापरेन	20748	26225	1.68	78	12	Nil	Nil	18	0	99	5	2942
152	इन्द्रगढ़	7444	9410	1.00	70	24	Chakan Dam	0.77	12	0	61	5	1344
153	हिण्डोली	9601	12010	0.70	40	48	Nil	Nil	15	0	50	6	1860
154	देई	12884	14907	0.80	40	48	Nil	Nil	15	0	49	12	2557
155	झालावाड़	66919	80303	12.00	149	24	Kali Sindh River, Pipaji Ka Deh, Chaapi Dam	12	2	0	282	3	12638
156	जे.पाटन	37506	45007	4.50	100	24	Kali Sindh River, Bhanwrasa Deh, Mundiya Kheri Talab, Chaapi Dam	4.5	0	0	128	5	6061

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सविस् लेवल (एल.पी. सी.डी. में)	सलाई अन्तराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	जल स्रोत		कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान					वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)	कार्यरत नलकूपों की संख्या			
157	कोटा	चौमेला	8584	10301	1.00	97	48	Choti Kali Sindh River	1	0	0	0	2234
158		खानपुर	13848	16618	2.20	132	24	Bheemsagar Dam	2.25	0	0	10	3542
159		मनोहरस्थाना	11292	13550	1.80	133	12	Kalikhari Dam	1.85	0	0	0	1779
160		अकलेरा	26240	31488	2.00	64	24	Gulendi Dam	2.01	0	0	3	2773
161		सुनेल	14896	17635	1.50	85	24	Piplad Dam	1.5	0	0	0	2564
162		भवानीमण्डी	42283	50740	5.00	99	24	Piplad Dam	5	0	0	0	5418
163		गिड़ावा	12807	15368	1.50	98	24	Chanwi Dam	2	0	0	0	2152
164		बकनी	9812	11774	1.50	127	48	Kali Sindh River (Motipura Deh), Chhapi Dam	1.55	0	0	15	3204
165	पाली	कोटा	1001365	150710	430.00	290	12	Kota Barrage on Chambal River	430	80	0	4	174980
166		रामगंज मण्डी	41328	46111	4.50	100	48	Rana Pratap Sagar Dam on Chambal River	4.5	0	0	0	7073
167		सुकेत	22319	25124	1.90	80	48	Anicut on Ahu River	1.9	0	2	0	2992
168		साथलखेड़ी	15617	17700	1.20	70	48	Rana Pratap Sagar Dam on Chambal River	1.2	0	1	0	1769
169		उदपुरा	10051	12180	0.60	52	24	Rana Pratap Sagar Dam on Chambal River	0.6	0	0	0	1447
170		सांगोद	21840	25220	3.20	100	24	Kali Sindh & T/W	3.1	3	0	15	3551
171		कैथून	26537	31100	2.00	70	12	nil	0	24	0	24	2714
172		सुलतानपुर	24273	29125	1.15	40	24	Nil	0	14	1	0	2942
173	पाली	पाली	230075	300719	45.00	135	48	Jawai Dam / Hemawas Dam	45	5	0	0	52307
174		मारवाड़ जवस्थान	15110	16200	1.20	70	48	Jawai Dam - local source	1.2	6	0	0	4291
175		सोजतसिटी	43023	47600	5.50	70	48	Jawai, local	6	10	0	22	11819
176		सोजतरोड	12472	14300	1.20	50	48	Kantaliya Dam	1.5	8	3	9	3800
177		सुमेरपुर	37093	43636	7.78	100	48	Jawai Dam and	0.58	0	4	0	11419

178	बाली	19880	23387	1.87	80	48	Ground water Jawai Dam and	1.7	6	2	180	0	6083
179	रानी	13880	17145	1.90	100	48	Ground water Jawai Dam and	1.5	2	1	96	0	5155
180	फालना	24839	29221	2.91	100	48	Ground water Jawai Dam and	2.8	8	2	140	3	7453
181	सादड़ी	27390	32222	3.00	80	72	Ground water PHED Dam and	2.9	1	4	128	0	7034
182	तख्तगढ़	16729	18300	1.49	80	48	Ground water Jawai Dam	0.8	2	4	65	0	5302
183	जालौर	54081	67940	8.10	120	72	Narmda Project-4.00 MLD.	6.0	27	0	31	0	14813
184	भीनमाल	47932	57000	5.70	100	96	Narmda Project-3.0 MLD.	2.5	16	0	61	0	13536
185	साचौर	32875	40536	5.20	110	72	Narmda Project-5.20 MLD.	5.2	6	0	0	0	8122
186	सिरोही	39229	48251	3.60	74	48	TW's, Ow's	0	29	11	316	11	11064
187	जावाल	10293	12558	0.51	40	48	TW's	0	8	0	18	0	2220
188	शिवगंज	28053	32000	3.10	97	48	Jawai Dam -& TWs, Ows	2.6	2	8	140	25	8239
189	पिण्डवाड़ा	24487	27671	1.94	70	48	16 TW's, 4 Ow's	0	16	4	152	0	9138
190	आबूरोड	55599	67000	6.43	96	48	TW's, Ow's	0	15	11	341	0	12242
191	माउण्ट आबू	22943	44583	3.57	80	48	Lower & Upper Kodra Dam- 3.00 MLD, 1 Nakki Lake	3	0	0	100	0	5136
192	भावरी	15312	17303	1.04	60	48	TW's, Ow's	0	11	3	32	0	3921
193	सवाई माधोपुर गंगपुर सिटी	119090	140547	6	43	48	Chambal River 3.0 MLD	3	41	0	102	0	18883
194	बामनवास	13397	16478	0.58	35	48	-	0	7	0	58	4	1740
195	सवाई माधोपुर	121106	140000	13.5	96	24	नलकूप एवं खुला कुआं (बनास)	0	110	4	442	150	21311
196	बौली	15300	18000	1	55	48	बीसलपुर	1	0	0	130	0	2773
197	टोडरा	5490	5819	0.55	95	24	नलकूप	0.55	4	0	55	2	1006
198	करौली	82960	90000	9.2	85	24	नलकूप	-	42	0	136	0	9136
199	हिण्डौन	105452	125000	95	76	24	नलकूप	-	48	0	50	28	11209
200	टोडाभीम	22977	28000	2.4	84	24	नलकूप	-	23	0	42	0	2389
201	सपोटरा	6776	8126	0.81	55	24	नलकूप	-	9	0	16	0	1111
202	सीकर	244497	322736	44.90	139	24	-	0	378	0	0	3	41660

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या		वर्तमान कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. (एल.पी. में) एवं इससे कम)	सलाह अंतराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन		जल स्रोत		कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संवर्धो की संख्या
			2011 (As per Census)	वर्तमान					वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)	कार्यरत नलकूपों की संख्या			
203		लक्ष्मणगढ़	53392	64070	9.00	140	24	IGNP(4-4.5 MLD)	128	0	0	0	9875
204		फतेहपुर	92595	111114	13.30	120	24	IGNP(4.5 MLD)	128	2	0	9	13324
205		लोसल	28504	35418	3.18	90	24	-	0	42	0	2	4347
206		रामगढ़ शेखावाटी	33024	39628	3.95	100	24	IGNP(1.5 MLD)	46	0	0	1	6344
207		खण्डेला	29044	35230	1.76	50	96	-	0	28	0	7	5099
208		रीगस	26139	31680	2.82	89	48	-	0	38	0	5	4088
209		खाटश्यामजी	13374	15781	2.80	177	24	-	0	18	0	2	1724
210		गुढागोजी	20185	21915	1.35	61	24	-	0	26	0	0	2810
211		नीमकाथाना	36231	43477	4.40	101	24	-	0	23	0	2	10274
212		श्रीमाधोपुर	31366	38267	1.30	34	96 or more	-	0	20	0	2	5790
213		पौख	13694	14867	0.54	37	24	-	0	20	0	2	840
214	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	29236	34791	2.70	78	48	-	0	35	0	3	4443
215		गोठडा	16933	18457	1.20	65	4	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 1-2 MLD	0	0	27	0	1706
216		खेतड़ी	18209	19848	1.60	81	48	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 1-0 MLD	8	0	42	0	4328
217		चिड़ावा	43953	52304	3.88	74	24	-	0	102	0	0	10835
218		बगड	14238	16943	1.40	83	24	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 0.5 MLD	28	0	0	0	3475
219		मणड़ावा	23335	27769	2.60	94	24	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 0.5 MLD	40	0	0	0	6007
220		बिसाऊ	23227	27640	2.30	83	24	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 0.5 MLD	24	0	19	0	4278
221		झुन्झुनू	118473	145721	13.50	92	48	कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना 12 MLD	12	30	0	0	29000
222		नवलगढ़	63948	76098	9.00	118	24	-	0	96	0	25	12500
223		मुकन्दगढ़	18469	21978	1.90	86	24	-	0	33	0	11	4500
224		सूरजगढ़	21666	23616	2.20	93	24	-	0	39	0	0	4200

225	पिलानी	29741	36051	2.00	55	48	-	0	87	0	0	0	7939	
226	विद्या विहार	15644	18463	0.8	43	48	-	0	21	0	0	0	883	
227	सिधाना	11372	14786	0.9	61	48	-	0	18	0	5	0	4203	
228	श्री गंगानगर	287201	347513	62.00	135	24	Gang Canal42.00 MLD	47	14	2	212	0	54558	
229		सादुलशहर	36341	43973	4.20	100	24	Bhakra Canal3.00 MLD	4.2	5	0	9	0	5730
230		श्रीकरणपुर	21297	25769	3.00	100	24	Gang Canal2.45 MLD	2.57	2	0	31	0	5707
231		कैसरीसिंहपुर	14010	16952	1.70	100	24	Gang Canal1.50 MLD	1.7	2	0	33	0	2822
232		पदमपुर	18420	22288	2.10	100	24	Gang Canal2.00 MLD	2.1	3	0	27	0	3957
233		गजसिंहपुर	9995	12094	1.20	100	24	Gang Canal1.15 MLD	1.2	2	0	12	0	2466
234		सूरतगढ़	70536	85349	15.50	100	24/48	IGNP 15.50 MLD	15.5	10	0	72	0	12930
235		लालगढ़	13657	16525	1.80	70	24	Bhakra Canal	1.8	2	0	0	0	2542
236		विजयनगर	18425	22294	1.50	62	48	Gang Canal1.50 MLD	1.5	5	0	31	0	3256
237		अनूपगढ़	30877	37361	3.80	90	48	IGNP3.20 MLD	3.2	5	0	33	0	5474
238	रायसिंहनगर	28330	34279	4.00	90	48	Gang Canal3.00 MLD & 1 MLD	4	5	0	24	0	7115	
239	उदयपुर	493088	660000	105.00	110	48	Pichola 28.5 MLD, Fatehsagar15 MLD, Jaisamand 20.5 MLD & Mansiwakal 31 MLD U/G- 10 MLD	84	27	2518	218	101992		
240	भिण्डर	17878	19665	0.80	40	72	1. Anicut Jadu (0.00), 2. Ratavela (0.20 MLD), 3. Kadecha (0.00) Other sources TW/OW 0.60MLD	9	2	126	5	3101		
241	कानौड़	13239	14563	0.60	40	72	Anicut peepalwas (0.00) U/G TW 0.60 MLD	6	1	124	2	2172		
242	फतेहनगर	22812	26995	1.20	42	48	NIL	17	5	167	15	3836		
243	सलूम्बर	16425	19710	1.33	67	48	Jaisamand Lake-1.13 MLD & TWs/Ows-0.20 MLD	4	2	96	0	4248		
244	खेरवाड़ा	7581	11851	0.68	45	48	Godawari Dam 0.52 MLD& TWs/Ows 0.16 MLD	4	2	48	0	2259		
245	ऋषभदेव	9171	11700	0.82	50	48	Som Kagdar 0.52 MLD & TWs/Ows 0.3 MLD	1	3	66	0	1923		
246	नाथद्वारा	42016	62500	8	135	24	Nandsamand Dam 5.33 mld & Local Soures 3.00 mld	12	5	60	10231			

राजस्थान राज्य की विभिन्न शहरी जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति

Status as on : 31.12.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर/कस्बे का नाम	जनसंख्या	वर्तमान		सलाई अन्तराल (घण्टे में) 120, 96, 72, 48, 24 घण्टे एवं इससे कम	जल स्रोत		कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत सिंगल फेज नलकूपों की संख्या	जल संबंधी संख्या			
				कुल जल उत्पादन (एम.एल.डी. में)	वर्तमान सर्विस लेवल (एल.पी.सी.डी. में)		सतही जल स्रोत का नाम एवं उससे उत्पादन	वर्तमान सतही जल स्रोत से उत्पादन (MLD में)				कार्यरत नलकूपों की संख्या	कार्यरत खुले कुओं/ डीसीबी की संख्या	
247	राजसमंद	कांकोली	67798	102000	15.05	148	48	Rajsamand Lake 15.0 mld mld & Local Soures 0.10	1	1	406	55	16622	
248		आमेट	17335	20802	1.40	7	72	(Manoharsagar Dam) TWs / OWS 1.00 MLD & BKN - 0.4 MLD	5	6	126	10	4240	
249		देवगढ़	17604	21365	1.30	61	72	(Sopari Dam) OW and TW 1.00mld	9	1	126	12	4434	
250	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	116406	140850	20.00	135	24	Bherda Mines-7 MLD, Ghosunda dam-11 MLD Local TW 2.0 MLD	100	2	322	317	17191	
251		निम्बाहेड़ा	61949	74950	5.50	70	48	-	38	4	51	22	7310	
252		कपासन	20869	25250	1.80	70	48	-	22	4	105	29	4010	
253		बडीसादडी	15723	19050	1.35	70	48	-	9	4	69	55	2591	
254		बैगू	20705	25050	1.80	70	24	-	23	0	74	20	4610	
255		रावतभाटा	37699	45650	4.60	100	24	RanaPratap Sagar Dam 4.60 MLD	0	0	23	8	4559	
कुल योग			17265226	20674037	3254.964	3453.4	773		1084.91	9005	273	31431	2567	3238393

NOTE-1: Five Towns not maintained by PHED since long- (1) Nasirabad (Ajmer)- By Defence (2) Vidhya Vihar (Jhunjhunu)-40% By Bits Pilani & Remaining by PHED (3) Bhaleria (Udaipur) - By HZL (4) Newa Talai(Udaipur) - By HZL (5) Takatgarh (Pali)- By Nagar Palika

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण (31.12.2024 तक)

क्र. स.	जिला	कुल योजनाएं	कुल ग्राम	स्वीकृत जल संबंधों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (करोड़ों में)
1.	अजमेर	200	1,098	291,182	2946.36
2.	अलवर	1,529	1,718	441,520	1843.38
3.	बांसवाड़ा	282	1,614	359,248	2688.45
4.	बारां	149	1,549	262,126	4075.6
5.	बाड़मेर	232	2,741	351,175	5986.09
6.	भरतपुर	693	788	264,614	6305.19
7.	भीलवाड़ा	170	2,082	391,583	2673.86
8.	बीकानेर	176	858	263,248	2609.36
9.	बूंदी	67	1,240	242,809	3114.29
10.	चित्तौड़गढ़	88	857	148,909	2509.22
11.	चूरु	116	1,252	264,581	1547.03
12.	दौसा	307	1,294	283,625	3932.26
13.	धौलपुर	348	1,501	346,955	4891.55
14.	डूंगरपुर	216	1,057	294,831	2244.05
15.	श्री गंगानगर	702	2,541	220,938	1081.95
16.	हनुमानगढ़	414	1,447	214,002	919.69
17.	जयपुर	957	2,118	462,836	3087.39
18.	जैसलमेर	75	664	116,312	1443.36
19.	जालौर	19	793	313,849	1827.15
20.	झालावाड़	128	1,233	201,195	1439.22
21.	झुन्झुनू	162	509	174,206	4315.88
22.	जोधपुर	381	1,834	441,245	3625.27
23.	करौली	501	1,090	247,369	5248.22
24.	कोटा	48	313	76,432	373.17
25.	नागौर	115	1,046	499,571	1985.37
26.	पाली	325	961	277,784	1389.42
27.	प्रतापगढ़	226	2,267	340,054	5117.77
28.	राजसमन्द	212	471	67,335	537.17
29.	सवाई माधोपुर	366	451	148,832	668.98
30.	सीकर	473	1,351	394,604	6010.84
31.	सिरोही	322	437	132,709	1266.54
32.	टोंक	87	1,114	227,849	1016.35
33.	उदयपुर	1,212	2,042	447,457	3432.57
आईजीएनपी पर एस्कैप रिजर्वॉयर					1274.00
योग		11,298	42,331	9,210,985	93427.00

हर घर जल का विवरण (100 % FHTC कवरेज) (31.12.2024 तक)

क्र. स.	जिला	हर घर जल ब्लॉक की संख्या		हर घर जल पंचायत की संख्या		हर घर जल ग्रामों की संख्या	
		सूचित	प्रमाणित	सूचित	प्रमाणित	सूचित	प्रमाणित
1	अजमेर	0	0	29	19	245	190
2	अलवर	0	0	22	1	240	38
3	बालोतरा	0	0	6	3	107	22
4	बांसवाड़ा	0	0	12	10	101	73
5	बारां	0	0	11	4	107	64
6	बाड़मेर	0	0	1	1	46	41
7	ब्यावर	0	0	17	5	176	99
8	भरतपुर	0	0	21	10	265	113
9	भीलवाड़ा	5	1	154	100	1083	829
10	बीकानेर	0	0	29	16	144	81
11	बूंदी	0	0	14	11	115	90
12	चित्तौड़गढ़	0	0	2	1	59	55
13	चुरू	0	0	56	26	234	121
14	दौसा	0	0	6	1	104	38
15	डीग	0	0	6	2	45	21
16	धौलपुर	0	0	2	2	58	34
17	डीडवाना—कुचामन	1	0	73	5	412	112
18	डूंगरपुर	0	0	8	4	48	35
19	श्री गंगानगर	0	0	61	17	1271	490
20	हनुमानगढ़	0	0	27	17	394	226
21	जयपुर	0	0	30	13	301	133
22	जैसलमेर	0	0	1	0	29	12
23	जालौर	0	0	4	3	35	34
24	झालावाड़	0	0	32	20	468	357
25	झुंझुनू	0	0	37	11	193	45
26	जोधपुर	0	0	12	3	114	22
27	करौली	0	0	6	1	81	6
28	खैरथल—तिजारा	0	0	10	1	213	53
29	कोटा	0	0	4	4	59	45
30	कोटपूतली—बहरोड़	0	0	1	0	35	0
31	नागौर	0	0	7	5	90	81
32	पाली	1	0	76	32	349	174
33	फलोदी	0	0	12	6	84	39
34	प्रतापगढ़	0	0	0	0	58	39
35	राजसमंद	0	0	13	9	216	109
36	सलूबर	0	0	3	3	50	44
37	सवाई माधोपुर	0	0	20	6	215	47
38	सीकर	0	0	16	6	113	42
39	सिरोही	0	0	9	2	42	10
40	टोंक	0	0	20	7	222	81
41	उदयपुर	0	0	15	4	117	55
कुल		7	1	917	400	8507	4254

स्थापित आर.ओ. एवं सोलर डी.एफ.यू. संयंत्र व सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग संयंत्र

(दिसम्बर 24 तक)

क्र. स.	जिला	स्थापित आर.ओ. संयंत्र	स्थापित सोलर डी.एफ.यू. संयंत्र	स्थापित सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग संयंत्र
1	अजमेर	0	0	0
2	ब्यावर	0	0	0
3	भीलवाड़ा	33	32	66
4	नागौर	517	222	110
5	डीडवाना कुचामन	0	0	0
6	टोंक	1	0	4
7	भरतपुर	991	0	173
8	डीग	0	0	0
9	धौलपुर	0	0	63
10	करीली	55	10	48
11	सवाई माधोपुर	123	166	110
12	बीकानेर	31	0	0
13	श्री गंगानगर	0	0	0
14	हनुमानगढ़	0	0	0
15	चुरू	105	0	0
16	अलवर	147	66	212
17	खैरथल तिजारा	0	0	0
18	दौसा	107	56	105
19	कोटपूतली बहरोड	1	16	53
20	सीकर	87	11	140
21	झुझुनू	87	33	98
22	जयपुर	89	169	161
23	जोधपुर	273	74	111
24	फलौदी	0	0	0
25	बाड़मेर	242	0	126
26	बालोतरा	0	0	0
27	जैसलमेर	151	140	26
28	पाली	163	89	120
29	जालौर	244	146	90
30	सिरोही	193	788	77
31	बारां	16	1	63
32	बूंदी	107	41	82
33	झालावाड़	16	5	62
34	कोटा	81	4	102
35	चित्तौड़गढ़	101	33	54
36	सलूम्बर	0	0	0
37	राजसमंद	33	405	79
38	उदयपुर	24	131	410
39	बांसवाड़ा	15	397	76
40	डूंगरपुर	30	420	103
41	प्रतापगढ़	0	16	37
योग		4063	3471	2961

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या

क्र. सं.	जिला	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या			
		ग्रामीण		शहरी	
		वर्ष 2023-24 में	वर्ष 2024-25 में 31.12.2024 तक	वर्ष 2023-24 में	वर्ष 2024-25 में 31.12.2024 तक
1	अजमेर	186	8	10	6
2	ब्यावर	55	34	34	65
3	भीलवाड़ा	38	41	0	0
4	डीडवाना कुचामन	125	87	0	0
5	नागौर	389	270	4	1
6	टोंक	58	16	8	2
7	अलवर	106	13	10	0
8	खैरथल-तिजारा	3	3	3	3
9	भरतपुर	188	70	4	0
10	डींग	147	22	2	0
11	धौलपुर	87	85	2	2
12	करोली	69	41	1	0
13	सवाई माधोपुर	17	18	1	3
14	बीकानेर	89	43	13	6
15	हनुमानगढ़	5	3	14	6
16	श्री गंगानगर	111	65	12	11
17	चुरू	199	44	65	13
18	दौसा	16	6	16	6
19	कोटपूतली-बहरोड़	11	17	2	2
20	जयपुर	551	122	30	14
21	झुंझुनूं	256	21	45	15
22	सीकर	437	97	55	9
23	जोधपुर	282	154	10	3
24	फलौदी	277	19	3	0
25	बालोतरा	492	18	1	0
26	बाड़मेर	320	45	2	1
27	जैसलमेर	79	26	3	3
28	पाली	46	23	6	0
29	जालौर	98	85	4	0
30	सिरोही	60	37	2	0
31	बारां	94	48	6	11
32	बूंदी	7	7	4	6
33	झालावाड़	8	8	25	13
34	कोटा	57	71	7	7
35	चित्तौड़गढ़	19	56	8	0
36	राजसमंद	36	22	4	0
37	सलूम्बर	12	8	1	2
38	उदयपुर	37	3	9	6
39	बांसवाड़ा	197	127	3	0
40	डूंगरपुर	199	65	2	0
41	प्रतापगढ़	68	65	4	0
कुल योग		5531	2013	435	216



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission



जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

2 सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान

phedwater.rajasthan.gov.in
